

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2020.

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DE MEDIÇÃO COM RESSALVAS

1ª MEDIÇÃO – 1ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

PERÍODO DE 28/04/2020 ATÉ 13/05/2020

A:

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

Subsecretaria de Conservação e Técnico-operacional - SUBCTO

Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

Ref.: “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”.

Processo Nº 06/300.120/2020 – Contrato Nº 024/2020.

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF** sob o nº **00.299.904/0001-60**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os **“Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P. 4 – Programa Pavimenta Rio”**, vem, por meio da presente, encaminhar em ANEXO 1, a **Nota Fiscal nº 007003/2020**, no valor de **R\$ 1.015.972,01 (um milhão, quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo)**, assim como toda documentação contratualmente exigível da empresa, referente aos serviços prestados no mencionado Contrato relativos à **1ª Medição de Serviços - 1ª Etapa Intermediária, executados no período de 28/04/2020 à 13/05/2020**, para pagamento, no máximo, no prazo disposto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta.

Insta salientar que os valores ora faturados baseiam-se exclusivamente nos levantamentos, nas memórias de cálculos e boletim de medição elaboradas pela Comissão de Fiscalização, nomeada através da PORTARIA “P” N.º 034 DE 08 DE MAIO DE 2020, publicada no DORIO de 12 de maio de 20.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção



DS
BM

DS
M

DS
CA

Nesse tocante, a empresa está procedendo ao faturamento dos quantitativos e valores apurados unilateralmente pela comissão, após diversas manifestações de solicitações de documentações de suporte que permitissem a adequada compreensão e análise da medição, bem como da consignação de discordância de quantitativos e critérios adotados, sendo inclusive objeto de diversos e-mails encaminhados pelo Departamento Jurídico e Corpo Técnico da Dimensional, única e exclusivamente devido ao cenário de total insustentabilidade financeira da empresa e do contrato, ressaltando expressamente o seu direito ao recebimento dos quantitativos reais executados e reiterando a sua discordância com alguns critérios adotados, dentre eles a distribuição da apropriação dos serviços executados nos períodos medidos, bem como itens não medidos e outros medidos aquém do executado ou apurados de divergente da unidade contratual e das diretrizes normativas. Segue em ANEXO 2, demonstrativo das diferenças de apuração entre a medição elaborada pela Comissão e pela Dimensional e, exemplificativamente, algumas observações abaixo:

1. Não conseguimos entender as quantidades medidas dos equipamentos e mão de obra remunerados por disponibilidade, não sendo as quantidades medidas compatíveis com nossas apropriações. Salientamos que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional, que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
2. Na memória de cálculo, constam itens de equipamentos com medição de horas produtivas e improdutivas por estimativa percentual explícita, sendo tal prática, não aderente às diretrizes dos órgãos de controle. Salientamos mais uma vez, que todas as frentes de serviços são acompanhadas por apropriadores da Dimensional que equiparam todas as informações presentes nas memórias de cálculos enviadas pela empresa;
3. A memória de cálculo da medição enviada pela Comissão não apresenta a área topográfica medida de fresagem e CBUQ. Uma vez, que a memória da Comissão apresentou informações distintas das enviadas pela Dimensional, baseadas apenas em uma planilha de áreas e num diagrama unifilar, faz-se necessário o encaminhamento do croqui



topográfico com as áreas consideradas, de forma a trazer confiabilidade nos valores medidos. Segue abaixo, quadro comparativo das áreas apropriadas de pavimentação e volumes de fresagem pela Comissão e pela Dimensional:

LOGRADOURO	1ª MEDIÇÃO							
	FRESAGEM (M³)		BINDER (M³)		CAPA (M³)		CAPA C/ POLIMERO (M³)	
	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO	DIMENSIONAL	FISCALIZAÇÃO
ESTRADA DO RIO GRANDE	490,20	787,72	10.134,38	10.134,38	-	-	-	-
AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	193,90	-	-	-	3.995,87	-	-	-
AV. JOÃO CABRAL DE MELLO NETO	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA TIROL	-	-	-	-	-	-	-	-
RUA CMDT. RUBENS SILVA	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTRADA DO GABINAL	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL	684,10	787,72	10.134,38	10.134,38	3.995,87	-	-	-
ACUMULADO	684,10	787,72	10.134,38	10.134,38	3.995,87	-	-	-

- O item de fresagem, cuja unidade do catálogo SCO e da planilha orçamentária é em metros cúbicos, está sendo aferido pela Comissão, por tonelada e transformado em metros cúbicos por um peso específico. Desta forma, destacamos que a forma de aferição deste item, devido à sua unidade de medida e conforme orientações técnicas consolidadas, bem como nenhum estabelecimento diverso no TR, Edital ou Contrato, deve se dar pela área efetivamente executada multiplicada pela espessura de projeto. Igualmente, não se possui informação de suporte do peso aferido.
- Não identificamos o item de recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão, uma vez que o item de transporte *TC 04.05.0700 (I) - Transporte de carga de qualquer natureza, **exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar(...)***, não remuneram esse custo. Solicitamos a inclusão do item de remuneração das despesas de recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão (código EMOP 05.100.0000) na lista de itens propostos em RERRA.
- Foi identificado um equívoco na memória de cálculos, no item AD39.05.0212 – Topógrafo A, em que a quantidade multiplicadora pelo preço unitário (185,00h) não condiz com o produto dos cálculos apresentados (277,50h). A Comissão encaminhou uma revisão do Boletim de Medição, corrigindo este equívoco, porém não encaminhou a memória de cálculos devidamente revisada.



7. Foi identificado um equívoco na memória de cálculos, no item AD39.05.0092 – Auxiliar de Topografia, em que o produto dos cálculos não considera a quantidade de horas/mês. A Comissão encaminhou uma revisão do Boletim de Medição, corrigindo este equívoco, porém não encaminhou a memória de cálculos devidamente revisada.
8. Não foram considerados, assim como, outros reduzidos, diversos itens indiscutivelmente necessários e de custos diretos já efetivamente alocados, relativos a administração local da obra, tais como barraco de obras, mão de obra de auxiliar administrativo, engenheiro de obras, técnico de nível médio (segurança do trabalho) e vigia.
9. Foram desconsiderados pela Comissão nesta medição e nas subsequentes que a empresa já recebeu, os serviços executados de remendo profundo na Av. José Silva de Azevedo Neto, nos trechos apontados abaixo.

AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO (AV. JUAN MANUEL FANGIO -> AV. LUIZ CARLOS PRESTES)				
0,24 km -> 0,29 km	52,00	4,25	221,00	13,95
0,32 km -> 0,33 km	12,00	4,40	52,80	13,95
0,38 km -> 0,42 km	41,00	2,10	86,10	13,95
SUBTOTAL	105,00		359,90	13,95

Por fim, encaminhamos em ANEXO 3, cópia da medição de serviços elaborada pela empresa, a qual julga a mais aderente à realidade contratual, com a documentação de suporte que julga pertinente para possibilitar a análise e aferição daquilo que está sendo apurado, da Medição 1 - Etapa 1 Intermediária, enviada por e-mail do dia 28/05/2020 à Comissão, bem como todas as informações comprobatórias dos serviços executados conforme relação abaixo:

- E-mail de encaminhamento da medição
- Boletim de Medição
- Relatório Fotográfico
- Diário de Obras
- Memória de Cálculo
- Projetos de Apropriação de Execução de Obras baseados no Projeto Topográfico (com demarcação das áreas e respectivos volumes dos serviços executados)



- Mapas de Distância Média de Transporte
- Projeto Executivo

Ademais, convidamos a todos a visitarem o site de transparência da obra, desenvolvido e mantido pela Dimensional: www.pavimentarioap4.com.br.

No mais, aguarda-se o pagamento imediato desta Nota Fiscal, considerando que esse faturamento deveria ter ocorrido no dia 14 de maio de 2020, mas somente está sendo protocolado agora por motivos alheios à vontade da contratada.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

C5C76A237ABE472...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção



DS


DS





Memorando nº 024 / 2020 – IHC/SUBCTO/CGEC/CTPI

Rio de Janeiro, 13 de Julho de 2020

À: IHC/SUBCTO/CGEC

Encaminhamos a documentação para abertura de processo de faturamento da 01ª medição, 01ª etapa, intermediária, da DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., no período de 28/04/2020 a 13/05/2020, referente ao processo 06/300.120/2020, contrato nº 024/2020.

Atenciosamente,


Sergio José Varanda Costa
IHC/SUBCTO/CGEC/CTPI
Coordenador – Matr: 11/156.510-0



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

À Firma: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**
 Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO N.º 98 SALA 605**
 Reg. CNPJ /M.F.: **00.299.904/0001-60**
 Banco Nº: **033** Agência: **3003** Conta: **130802510** F.R.R.I nº

Telefone: **(21) 2252-1341**
 Insc. Munic.: **0.177.998-2**

Referente aos serviços abaixo especificados a importância de:

RS 1.015.972,01	UM MILHÃO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CÉNTAVO
------------------------	---

FATURA Nº.	COPIADOR Nº.	DATA	VALOR
0007003/2020		08/06/2020	RS 1.015.972,01

EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR
2020/000449	15.15.15.452.0071.2778 F.R.341 D.V. 0	3.3.90.39.24 RS 1.015.972,01

ESPECIFICAÇÃO

Fatura de SERVIÇOS referente a **01ª Medição, 01ª Etapa Intermediária**, para execução de "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO", conforme Contrato nº. 024/2020, Processo nº. 06/300.120/2020, Período de Execução: 28/04/2020 a 13/05/2020.

Data: 08/06/2020

Confere e importa a presente fatura em **RS 1.015.972,01**
UM MILHÃO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CÉNTAVO

Em, ____ / ____ / ____

 Confere

Atesto que os elementos especificados na presente Fatura se referem aos serviços executados e aceitos.

Em, ____ / ____ / ____

 Diretor Geral

Eng. Susana de Almeida
 Matr. 112413/RS
 CREA-RJ 2009140887

Eng. Edson Augusto
 Matr. 112413/RS
 CREA-RJ 2009140887



00.299.904/0001-60

85.438.735

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

RUA SETE DE SETEMBRO, 98 - SALA 605
CENTRO - CEP: 20050-002

Rua. Sete de Setembro, 98 - Sala 605
Centro - Rio de Janeiro-RJ

RIO DE JANEIRO - RJ

IRF 64.10

CNAE 4.30.93-03-0

01/01/84

D.ISS	IRLF	INSCRIÇÃO	ATIVIDADE:
2	02	01.779.982	261289

Firma: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
Local: Rua 7 de Setembro, 98 - Sala 605
Centro

IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: **6.150** Contrato: **24/2020** Processo: **0006/300120/2020**

Obra/Serviço: **Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.**

Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **180** dias corridos Prorrogações: **0** dias corridos Total: **180** dias corridos Fator K: **0,9018**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **28/04/2020** Data de Término: **24/10/2020** (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: **1a** Etapa: **1a - INTERMEDIARIA** Serviços Executados de **28/04/2020** Até **13/05/2020**

Sistema: **SISTEMA UNICO**
Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**
Planilha: **1**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	231,0000	28,77	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 14.05.0300()	m3	132,0000	106,89	0,0000	0,0000	0,00
3	TC 04.05.0700()	t.Km	2.965.061,2500	0,49	12.019,4448	12.019,4448	5.889,52
4	TC 09.05.0150()	t	2.033,2500	19,28	94,0200	94,0200	1.812,70
5	TC 09.05.0700()	t	2.033,2500	15,96	470,1250	470,1250	7.503,19
6	SC 04.05.0850()	m3	33,0000	198,35	0,0000	0,0000	0,00
7	SC 04.10.0050()	un	80,0000	46,37	0,0000	0,0000	0,00
8	SC 04.10.0300()	m3	862,5000	215,50	0,0000	0,0000	0,00
9	SC 09.05.0900()	h	4.440,0000	19,86	277,5000	277,5000	5.511,15
10	SC 09.05.1100()	h	4.440,0000	22,32	555,0000	555,0000	12.387,60
11	SC 09.05.1200()	h	8.880,0000	21,38	0,0000	0,0000	0,00
12	SC 09.05.1450()	h	26.640,0000	14,38	2.775,0000	2.775,0000	39.904,50
13	SC 09.10.0100()	h	17.760,0000	14,69	0,0000	0,0000	0,00
14	SC 09.10.0150()	h	2.220,0000	17,87	277,5000	277,5000	4.958,92
15	SC 14.05.0400()	m3	3.588,7500	59,90	135,3960	135,3960	8.110,22
16	SC 14.05.0425()	m3	2.093,8500	104,50	135,3960	135,3960	14.148,88
17	SC 14.10.0050()	m2	800,0000	755,29	84,0000	84,0000	63.444,36
18	SC 34.05.0040()	un	1.700,0000	160,84	0,0000	0,0000	0,00
19	SC 34.05.0050()	un	800,0000	220,04	0,0000	0,0000	0,00
20	DR 34.05.0250()	un	340,0000	416,22	0,0000	0,0000	0,00
21	BP 09.05.0050()	t	25.803,0000	279,99	1.517,3200	1.517,3200	424.834,42
22	BP 09.05.0100()	t	15.510,0000	374,18	0,0000	0,0000	0,00
23	BP 09.05.0300()	t	41.313,0000	3,46	1.517,3200	1.517,3200	5.249,92
24	BP 09.05.0400()	m2	544.500,0000	2,31	10.886,5800	10.886,5800	25.147,99
25	BP 09.05.0600()	m2	60.000,0000	9,65	0,0000	0,0000	0,00
26	BP 09.05.0700()	m2	132.000,0000	53,64	0,0000	0,0000	0,00
27	BP 14.05.0060()	m3	27.150,0000	137,11	727,1434	727,1434	99.698,63
28	BP 19.30.0050()	m	1.650,0000	48,28	0,0000	0,0000	0,00
29	ET 04.05.0400()	m3	99,0000	239,04	0,0000	0,0000	0,00
30	ET 04.20.0050()	m3	25,0000	102,83	0,0000	0,0000	0,00
31	ET 04.20.0200()	m3	74,0000	52,55	0,0000	0,0000	0,00
32	ET 04.25.0403()	m3	99,0000	41,69	0,0000	0,0000	0,00

Confere

SUB
Fiscal
Eng. Susana Viana Bittencourt
Matricula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

João Dolino da Silva Júnior
Engenheiro Civil Fiscal
CREA-RJ 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GONCALVES
SC/SUBSECTO/CH/2º-GI-GERENTE
Matr. 11/119129-5
CREA 88-1-09229

Visto

OK

IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: **6.150** Contrato: **24/2020** Processo: **0006/300120/2020**

Obra/Serviço: **Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.**

Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **180** dias corridos Promoções: **0** dias corridos Total: **180** dias corridos Fator K: **0,9018**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **28/04/2020** Data de Término: **24/10/2020** (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: **1a** Etapa: **1a - INTERMEDIARIA** Serviços Executados de **28/04/2020** Até **13/05/2020**

Sistema: **SISTEMA UNICO**
Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**
Planilha: **1**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
33	EQ 04.05.0062()	un.mes	24,0000	8.744,69	1,5000	1,5000	13.117,03
34	EQ 04.05.0312()	un.mes	24,0000	8.784,89	1,5000	1,5000	13.177,33
35	EQ 14.05.0380()	h	3.108,0000	84,64	388,5000	388,5000	32.882,64
36	EQ 14.05.0386()	h	1.332,0000	32,87	166,5000	166,5000	5.472,85
37	EQ 44.05.0059()	h.dam	4.440,0000	0,09	555,0000	555,0000	49,95
38	EQ 44.05.0100()	h	3.108,0000	64,07	388,5000	388,5000	24.891,19
39	EQ 44.05.0106()	h	1.332,0000	5,65	166,5000	166,5000	940,72
40	EQ 44.05.0600()	h	3.108,0000	1,79	194,2500	194,2500	347,70
41	EQ 44.05.0606()	h	1.332,0000	1,19	83,2500	83,2500	99,06
42	ST 74.05.0300()	m2	22.275,0000	34,42	1,2990	1,2990	44,71
43	ST 74.05.0450()	m2	3.174,3100	63,77	0,0000	0,0000	0,00
44	AD 14.10.0050()	t	1.898,4000	38,86	162,1410	162,1410	6.300,79
45	AD 14.10.0300()	t.Km	21.696,0000	1,62	5.366,8671	5.366,8671	8.694,32
46	AD 14.15.0401()	un.mes	24,0000	5.396,73	4,5000	4,5000	24.285,28
47	AD 14.15.0750()	un.mes	12,0000	4.248,99	0,0000	0,0000	0,00
48	AD 19.25.0210()	un	200,0000	612,93	35,0000	35,0000	21.452,55
49	AD 19.25.0310()	m2	16,8000	415,07	8,4000	8,4000	3.486,58
50	AD 24.05.0200()	un.mes	600,0000	55,33	67,5000	67,5000	3.734,77
51	AD 24.05.0250()	un.mes	2.400,0000	51,07	52,5000	52,5000	2.681,17
52	AD 24.05.0300()	un.mes	1.200,0000	38,99	0,0000	0,0000	0,00
53	AD 24.05.0450()	m	2.399,9900	0,73	0,0000	0,0000	0,00
54	AD 39.05.0086()	h	4.440,0000	17,53	555,0000	555,0000	9.729,15
55	AD 39.05.0116()	h	4.440,0000	27,49	832,5000	832,5000	22.885,42
56	AD 39.05.0134()	h	1.110,0000	185,76	555,0000	555,0000	103.096,80
57	IE 00.02.7107()	t	6.010,1300	59,61	0,0000	0,0000	0,00
58	IE 00.02.7108()	t	969,3800	59,27	0,0000	0,0000	0,00
59	IE 00.02.7109()	t	6.979,5000	72,15	0,0000	0,0000	0,00
60	IE 00.02.7110()	t	572,9000	3.273,93	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **1.015.972,01**

Confere

Eng. Susana Viana Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

Eng. Dolpho da Silva Junior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Fiscal

Matr. 11/119129-5
CREA RR-1-06229-7

Visto

IHC/SUBCTO/CGEC - COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDIÇÃO

Código: **6.150** Contrato: **24/2020** Processo: **0006/300120/2020**

Obra/Serviço: **Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO.**

Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **180** dias corridos Prorrogações: **0** dias corridos Total: **180** dias corridos Fator K: **0,9018**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **28/04/2020** Data de Término: **24/10/2020** (inclusive prorrogações autorizadas)

Medição: **1a** Etapa: **1a - INTERMEDIARIA** Serviços Executados de **28/04/2020** Até **13/05/2020**

INTERMEDIARIA Valor global previsto incluindo esta etapa Total: **R\$1.015.972,01**

R\$1.015.972,01 Valor global medido incluindo esta medição

Importa a presente Folha de Medição em: **R\$ 1.015.972,01 (UM MILHÃO E QUINZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO)**

Confere


SJB
Fiscal
Eng. Susana Viana Bittencourt
Matricula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

João Roberto da Silva
Fiscal
Engenheiro Civil
CREA-RJ 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Visto

Fiscal
MAURICIO A. DE ALENCASTRO GRACA
CC/SUREC/CEC/CP/DAGI-GERENTE II
Matr. 11/119129-5
CREA 03-1-08229-7

06

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - <small>20200709100299040001601200 201.189.182</small>	Número da Nota 00007003				
	Data e Hora de Emissão 08/07/2020 17:15:09				
	Código de Verificação E5DV-XS6L				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsedimensional@dimensionalengenharia.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 42.498.733/0001-48 Inscrição Municipal: 9.999.902-0 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO - CEP: 22260-006 Tel: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Fatura de SERVIÇOS referente à 01ª Medição, 01ª Etapa Intermediária, para execução de "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP. 4. ; PROGRAMA PAVIMENTA RIO", conforme Contrato n°. 024/2020, Processo n°. 06/300.120/2020, Período de Execução: 28/04/2020 a 13/05/2020.					
Mão de Obra..... R\$ 355.590,20 Valor dos materiais incorporados a obra R\$ 159.198,65 Custos Materiais não incorporados, equipamentos Impostos e taxas, não tem mão de obra R\$ 501.183,16					
Isenta de retenção de INSS, conforme Art, 149, II, da instrução Normativa RFB n.º 971 de 13/11/2009. Matrícula CEI n.º 90.003.50761/79					
Valor Total da Nota R\$ 1.015.972,01 (um milhão, quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo).					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.015.972,01					
Serviço Prestado 07.02.98 - execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
159.198,65	0,00	856.773,36	3,00%	25.703,20	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - CEI / Código da Obra: C000.211 - Valor Líquido a Pagar: R\$ 990.268,81					



00.299.904/0001-60 85.438.735

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

RUA SETE DE SETEMBRO, 98 - SALA 605
CENTRO - CEP: 20050-002

Rua. Sete de Setembro, 98 - Sala 605
Centro - Rio de Janeiro-RJ

RIO DE JANEIRO - RJ



IRF 64.10
CNAE 4.30.99.99-0 Mun 64

DISS	IRLF	INSCRIÇÃO	ATIVIDADE
2	02	01.779.982	261289
Nome: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.			
Local: Rua 7 de Setembro, 98 - Sala 605 Centro			

Adolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Susana Viana Bittencourt
Eng. Susana Viana Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

Maurício G. de Alencastro Graca
SUBEC/CCC/CFI/2º GI-GERENTE T
Matr. 11/119129-5
09.11.2009.27

RIO PREFEITURA		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação Subsecretaria de Conservação Técnico-Operacional Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação DECRETO N.º 14.574 DE 07 DE FEVEREIRO DE 1996 - ANEXO I					
BOLETIM DE DESEMPENHO (PARTE A)							
ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO		N.º DO PROCESSO : 06/300.120/2020					
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		N.º DO CONTRATO : 24/2020					
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO							
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior		MATRÍCULA: 11/241.313-6		MEDIÇÃO : 1ª			
Maurício Gonçalves de A. Graça		11/119.129-5		ETAPA : 1ª - Interm.			
Susana Viana Bittencourt		11/268.112-0		N.º BOLETIM : 1			
ITENS							CONCEITO
1 EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E EPI							MÉDIA DO ITEM
							2,88
Estado de conservação e adequação							3,0
Disponibilidade de equipamentos e ferramentas p/ atender aos serviços							3,0
Utilização de EPI							3,0
Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis							2,5
2 PESSOAL							MÉDIA DO ITEM
							3,00
Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados							3,0
Experiência e desempenho dos profissionais envolvidos							3,0
Respeito às normas de segurança no trabalho							3,0
Desempenho de engenheiro residente							3,0
Outros itens aplicáveis							n/a
3 INSTALAÇÕES E SINALIZAÇÃO							MÉDIA DO ITEM
							3,00
Adequação, padronização e conservação das instalações de apoio técnico e administrativo							n/a
Organização da obra							3,0
Higiene e adequação das instalações							n/a
Placas de identificação e sinalização preventiva da obra e outros itens aplicáveis							3,0
4 CRONOGRAMA FÍSICO - DESENVOLVIMENTO DA OBRA							MÉDIA DO ITEM
							2,83
Andamento da etapa do cronograma							3,0
Atendimento aos prazos para medições e/ou medições							2,5
Cumprimento do prazo contratual							3,0
Outros itens aplicáveis							n/a
5 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS							MÉDIA DO ITEM
							2,75
Atendimento às especificações dos projetos							2,5
Respeito às normas técnicas vigentes							3,0
Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato							2,5
Qualidade e armazenamento dos materiais							3,0
Implantação de sistema de Gestão de Qualidade / Outros itens aplicáveis							n/a
6 ATENDIMENTO A FISCALIZAÇÃO							MÉDIA DO ITEM
							2,63
Atendimento às melhorias e modificações solicitadas							2,5
Preenchimento correto do diário de obras							2,5
Qualidade dos relatórios fotográficos e/ou cadastro de obras							3,0
Presteza no atendimento às solicitações da fiscalização e outros itens aplicáveis							2,5
ÍNDICE DE DESEMPENHO DE ETAPA (IDE)							2,85
CONCEITO EXCELENTE =3 BOM =2 FRACO =1 PÉSSIMO = 0							
OBSERVAÇÃO : OUTROS ITENS APLICÁVEIS (FOI UTILIZADO O VERSO DA FOLHA? Sim. []) Todos os funcionários se apresentam uniformizados corretamente, utilizando equipamentos de segurança. Os materiais e equipamentos utilizados, na maioria das vezes, estão disponíveis para pronta utilização e apresentam bom estado de conservação. Os casos em que tal situação não ocorre não comprometem o resultado final. O engenheiro responsável e o grupo de profissionais alocados para execução dos serviços está qualificado para executá-los nos padrões exigidos. Os dispositivos de sinalização são utilizados corretamente. Os serviços estão rigorosamente alinhados ao cronograma definido no contrato. Os serviços estão sendo executados em acordo às normas vigentes, sendo na maioria das vezes, compatíveis com as definições do edital e nos casos em que isso não ocorre o resultado final é obtido satisfatoriamente. Finalmente, no aspecto do atendimento às solicitações decorrentes de modificações no planejamento original a empresa atendeu, porém não imediatamente.							
DATA :		ASSINATURA DA FISCALIZAÇÃO :			EMPRESA :		
		 João Adolpho da Silva Júnior Engenheiro Civil CREA RJ 0001240/D			 Edson Neres Administrativo 02570276 ALER		
RESUMO DO BOLETIM DE DESEMPENHO (PARTE B)							
ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO		N.º DO PROCESSO : 06/300.120/2020					
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		N.º DO CONTRATO : 24/2020					
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO							
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior		MATRÍCULA: 11/241.313-6		MEDIÇÃO : 1ª			
Maurício Gonçalves de A. Graça		11/119.129-5		ETAPA : 1ª - Interm.			
Susana Viana Bittencourt		11/268.112-0		N.º BOLETIM : 1			
EQUIPAM. FERR. EPI	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRONOGRAMA FÍSICO	QUAL. SERV. MATERIAIS	ATENDIMENTO A FISCALIZ.	IDE - ÍNDICE DE DESEMPENHO	
2,88	3,00	3,00	2,83	2,75	2,63	2,85	
DATA :		ASSINATURA DO SUPERIOR IMEDIATO :					

08



DIM 00.211.006/2020

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2020.

**À
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO - SMIHC**

Att: Sr. João Adolpho da Silva Júnior
Sra. Susana Viana Bittencourt
Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça
Comissão de Fiscalização

C/c: Sr. Sebastião Bruno
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. Carlos Alberto Siqueira da Silva
Subsecretário de Conservação

C/c: Sr. Ney Correa Medina Junior
Coordenador Geral de Engenharia e Conservação

Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo Nº 06/300.120/2020.

Assunto: Boletins de Desempenho das Etapas 1, 2, 3 e 4

Ilmos. Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “ **RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA A.P.4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, vem, à presença de V.Sas., em atenção ao *e-mail* encaminhado pela Fiscalização no dia 09/07/2020, apresentar nossa discordância quanto a algumas notas subavaliadas dos Boletins de Desempenho das etapas 01, 02, 03 e 04, para, ao final, solicitar o que adiante segue:

No dia 09.07.2020, esta Comissão de Fiscalização encaminhou, através de *e-mail*, os Boletins de Desempenho das Etapas 01, 02, 03 e 04, cumprindo ressaltar que algumas pontuações e a nota final dos boletins demonstram um distanciamento da realidade da consecução deste contrato e não condizem com o nível de colaboração da empresa e com sua performance, que sempre se posicionou de forma pró-ativa na resolução de todas as solicitações desta comissão e dos problemas apresentados ao longo das obras.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção



81

DS
M
BM

DS
CP



Diante desse fato, apresentamos abaixo nossas ponderações quanto aos itens subavaliados:

1. Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis. Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00

Após diversas reuniões presenciais, oficializadas através das atas de reunião em anexo, nunca houve nenhuma reclamação e/ou solicitação por parte desta Comissão ou de outro representante da Prefeitura quanto a padronização dos uniformes ou outros itens aplicáveis a este contrato.

Todos os funcionários da empresa sempre estão uniformizados e com todos os EPIS exigidos por norma.

A nota subavaliada é contraditória com a própria observação desta Comissão constante em todos os Boletins, os quais citam que: *“Todos os funcionários se apresentam uniformizados corretamente, utilizando equipamentos de segurança”*.

E ainda de forma a comprovar a veracidade dos fatos, segue abaixo um comparativo do padrão dos uniformes apresentados no Termo de Referência e das fotos de alguns colaboradores da obra, em que podemos constatar inclusive, é acréscimo dos logos *PAVIMENTA-RIO* e *#ASFALTO LEGAL*, solicitados pela Comissão e que não estavam previstos no T.R.:


Padrão do uniforme do T. R.



ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



Padrão dos Uniformes Utilizados

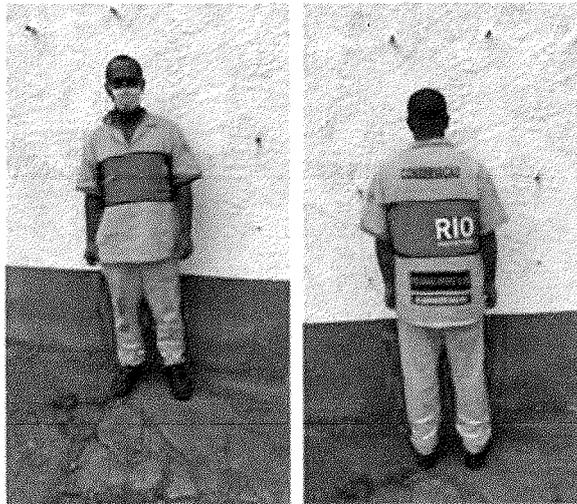

Exemplo de uma Frente de Serviço



Importante destacar que a empresa, inclusive, colaborou com a SMHIC para desenvolver o logo e a marca registrada do programa Pavimenta RIO, sem cobrar nada por isso.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

2. Atendimento aos prazos para medições e/ou medições. Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00

A empresa vem entregando pontualmente todas as aferições e controles de execução para a Fiscalização, tendo, inclusive, encaminhado por e-mail pacotes

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção





completos de medição, inclusive com memória de cálculo detalhadas, usualmente 1 ou 2 dias após o término de cada período.

Ademais, a empresa como sempre, pró-ativa, encaminhou antes mesmo de findar o período da primeira etapa, um esboço da memória de cálculo de forma a alinhar todos os parâmetros e agilizar o processo de medição.

Contudo, a Fiscalização modificou por diversas vezes vários parâmetros, conceitos e critérios de medição, sem justificado embasamento técnico-contratual, ensejando um retrocesso no procedimento de faturamento dos serviços efetivamente executados por motivos alheios à vontade da contratada e sem guarida contratual. Isso impõem um severo ônus financeiro não previsto à empresa e tem gerado um desequilíbrio econômico-financeiro.

Cabe ressaltar que a empresa está procedendo ao faturamento dos quantitativos e valores apurados unilateralmente pela comissão, após diversas manifestações de solicitações de documentações de suporte que permitissem a adequada compreensão e análise da medição, bem como da consignação de discordância de quantitativos e critérios adotados, sendo inclusive objeto de diversos e-mails encaminhados pelo Departamento Jurídico e Corpo Técnico da Dimensional, única e exclusivamente devido ao cenário de total insustentabilidade financeira da empresa e do contrato, ressaltando expressamente o seu direito ao recebimento dos quantitativos reais executados e reiterando a sua discordância com alguns critérios adotados, dentre eles a distribuição da apropriação dos serviços executados nos períodos medidos, bem como itens não medidos e outros medidos aquém do executado ou apurados de divergente da unidade contratual e das diretrizes normativas.

Importante destacar que a empresa sugeriu e alocou AO SEU CRITÉRIO E SEM OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, eis que não previstos em contrato, equipe de topografia para apurar com maior acurácia os quantitativos previstos em projeto para cada logradouro e aferir de forma mais precisa os quantitativos efetivamente executados, ao revés de utilizar simples estimativas. Este custo, a ser ressarcido através de uma modificação de quantidades contratual, possibilitou a economia de quase R\$ 1 milhão de reais no contrato, caso os quantitativos fossem meramente estimados, como previsto.

Desta forma, a incumbência da empresa de envio de medições e apropriações pontuais e tempestivas está sendo rigorosamente cumprida e a empresa está inclusive excedendo as suas obrigações contratuais.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

3. Atendimento às especificações dos projetos. Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00

INEXISTE QUALQUER RECLAMAÇÃO, FORMALIZADA OU VERBAL, QUANTO À QUALQUER NÃO ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS
M

DS
BM

DS
CA



Muito pelo contrário, a Dimensional não somente executou todos os serviços em completa aderência aos projetos encaminhados, como contribui sobremaneira em sua análise e melhorias, tendo inclusive sugerido e incorporado à execução algumas melhorias não previstas em contrato.

Ademais, antes mesmo do início dos serviços, a Dimensional encaminhou a esta Comissão, Carta de Análise Crítica do Projeto, no dia 11/03/2020, em que alertava quanto a várias divergências nos projetos enviados até aquele momento e solicitava diversas outras informações de suporte. Cabe salientar que a maioria dessas divergências e falta de informações, que são obrigações da SMIHC por ser esta a responsável pelos projetos, conforme o contrato assinado e seu Termo de Referência, foram sendo solucionadas ao longo da obra com o apoio da colaboração do corpo técnico da própria Dimensional, o que ensejou inclusive a majoração dos seus custos administrativos previstos.

Não obstante, podemos mencionar algumas soluções de melhoria dos projetos que foram sugeridas pela corpo Técnico da empresa que conseqüentemente buscaram a qualidade dos serviços e otimização da produção, todas elas registradas nas atas de reunião e que foram acatadas por esta comissão:

- Colocação de geogrelha para reforço estrutural de diversos trechos que apresentavam fissuramentos severos;
- Execução de remendo profundo para melhoria da base de suporte do pavimento em diversos trechos que apresentavam alto grau de afundamentos plásticos e trincamentos.
- Colaboração na definição do número de carga (N) da Estrada do Rio Grande, onde no projeto executivo havia diversos coeficientes para o mesmo trecho.
- Apontamento de diversas incompatibilidades entre o projeto executivo e a realidade dos trechos, como por exemplo redefinição de espessuras de fresagem e pavimentação devido a interferências de paralelos e de base aflorando a espessura de revestimento.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

4. Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato. Nota 2,50 - NOTA Máxima 3,00

Mais uma vez, não conseguimos entender que condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato não foram atendidas, uma vez, que em todas as reuniões nunca foram informadas pela comissão, quaisquer tipos de desconformidade que levasse a redução dessa nota, conforme podemos observar nas atas em anexos.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



Nível A

DS
/m

DS
BM

DS
QA



5. Atendimento às melhorias e modificações solicitadas. Nota 2,50 para os B.Ds 1, 2 e 3 - NOTA Máxima 3,00

Mais uma vez, não conseguimos entender melhorias e modificações solicitadas não foram atendidas, uma vez, que em todas as reuniões nunca foram informadas pela comissão, quaisquer tipos de desconformidade que levasse a redução dessa nota, conforme podemos observar nas atas de reuniões. E cabe salientar novamente o exposto no item 3 acima, em que podemos constatar o espírito colaborativo e proativo da empresa no tocante as soluções de projeto.

Ademais, antes mesmo do início dos serviços, a Dimensional encaminhou a esta Comissão, Carta de Análise Crítica do Projeto, no dia 11/03/2020, em que alertava quanto a várias divergências nos projetos enviados até aquele momento e solicitava diversas outras informações de suporte. Cabe salientar que a maioria dessas divergências e falta de informações, que são obrigações da SMIHC por ser esta a responsável pelos projetos, conforme o contrato assinado e seu Termo de Referência, foram sendo solucionadas ao longo da obra com o apoio da colaboração do corpo técnico da própria Dimensional, o que ensejou inclusive a majoração dos seus custos administrativos previstos.

Não obstante, podemos mencionar algumas soluções de melhoria dos projetos que foram sugeridas pela corpo Técnico da empresa que conseqüentemente buscaram a qualidade dos serviços e otimização da produção, todas elas registradas nas atas de reunião e que foram acatadas por esta comissão:

- Colocação de geogrelha para reforço estrutural de diversos trechos que apresentavam fissuramentos severos;
- Execução de remendo profundo para melhoria da base de suporte do pavimento em diversos trechos que apresentavam alto grau de afundamentos plásticos e trincamentos.
- Colaboração na definição do número de carga (N) da Estrada do Rio Grande, onde no projeto executivo havia diversos coeficientes para o mesmo trecho.
- Apontamento de diversas incompatibilidades entre o projeto executivo e a realidade dos trechos, como por exemplo redefinição de espessuras de fresagem e pavimentação devido a interferências de paralelos e de base aflorando a espessura de revestimento.

Assim, a Dimensional não somente atendeu às solicitações de melhorias como SUGERIU diversas.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

6. Preenchimento correto do diário de obras. Nota 2,00 - NOTA Máxima 3,00

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



DS
/n
BM

DS
QA

86



Todos os diários de obras estão sendo elaborados cotidianamente e entregues juntamente com as medições e mais uma vez, nunca foi solicitado pela Comissão, qualquer tipo de alteração nos mesmos ou apontamento de qualquer tipo de desconformidade que levasse a redução da nota desse item.

Pelo contrário, a Fiscalização até a presente data ainda não devolveu nenhum dos diários preenchidos e encaminhados pela empresa devidamente assinados.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.


7. Presteza no atendimento às solicitações da fiscalização e outros itens aplicáveis. Nota 2,50 para o B.D 1 - NOTA Máxima 3,00

Novamente, não se vislumbra o que - CONTRATUALMENTE EXIGÍVEL E DE ACORDO COM AS BOAS PRÁTICAS e com os programas de integridade - foi solicitado mas não foi atendido pela empresa. Caso tenha sido o carro e a contratação de um técnico solicitados informalmente, a empresa volta a informar que não se opõe a disponibilização dos mesmos, desde que seja feita uma solicitação formal por e-mail ou carta, mencionando a obrigação contratual desse fornecimento pela empresa, o que será objeto de análise pelo setor de compliance. Caso haja a previsão contratual e a anuência do compliance, qualquer solicitação poderá ser atendida.

Desta forma, não se vislumbra nenhuma justificativa para a concessão de nota inferior à máxima neste tópico.

Por fim, a Dimensional aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração, colocando-se à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 C5C78A237ABE472...

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 78F62B812DA942B68BAF9EDFFB30F313

Status: Concluído

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA CARTA 00.211.006.2020 - Boletins de Desempenho das Etapas 1, 2, 3 e 4

Obra: Jurídico

Origem do Envelope:

Qtde Págs Documento: 7

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Qtde Págs Certificado: 5

Rubrica: 20

Paulo Oliveira

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com ID do Envelope: Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 20050-002

pauloo@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Paulo Oliveira

Local: DocuSign

15/07/2020 14:46:00

pauloo@dimensionalengenharia.com

Eventos de Signatários

Assinatura

Data/Hora

Bruno Mendes

Brunom@dimensionalengenharia.com

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Enviado: 15/07/2020 14:50:47

Visualizado: 15/07/2020 14:51:14

Assinado: 15/07/2020 14:51:25

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47


ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Vinicius Benevides

viniciusb@dimensionalengenharia.com

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Enviado: 15/07/2020 14:51:27

Visualizado: 15/07/2020 15:05:55

Assinado: 15/07/2020 15:06:14

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 200.179.23.39


Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através do DocuSign

OSVALDO PEÇANHA

osvaldop@dimensionalengenharia.com

Nível de Segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

C5C76A237ABE472...

Enviado: 15/07/2020 15:06:17

Visualizado: 15/07/2020 15:08:44

Assinado: 15/07/2020 15:09:08

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: DS Electronic

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura

carregada

Usando endereço IP: 179.168.41.182

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20/04/2020 11:47:35

ID: 8d16e474-5099-4a9e-93e4-6718a6c35484

Eventos de Signatários Presenciais

Assinatura

Data/Hora

Eventos de Editores

Status

Data/Hora

Eventos de Agentes

Status

Data/Hora

98

Eventos de Destinatários Intermediários	Status	Data/Hora
--	---------------	------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Data/Hora
--	---------------	------------------

Eventos de cópia	Status	Data/Hora
-------------------------	---------------	------------------

Eventos com testemunhas	Assinatura	Data/Hora
--------------------------------	-------------------	------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Data/Hora
----------------------------	-------------------	------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	15/07/2020 15:06:17
Entrega certificada	Segurança verificada	15/07/2020 15:08:44
Assinatura concluída	Segurança verificada	15/07/2020 15:09:08
Concluído	Segurança verificada	15/07/2020 15:09:08

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

59

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

90

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

91

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****NOTA DE EMPENHO Nº 2020/000449**PROCESSO Nº
0006/300120/2020

DATA FL.

RUBRICA

ESPÉCIE DE EMPENHO	DATA PUBLICAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	F.R.	D.V.
Global	13/04/2020	15.15.15.452.0071.2778	3.3.90.39.24	341	0

ÓRGÃO MUNICIPAL	CNPJ
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação	042.498.733/0001-48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

NOME DO FAVORECIDO	CNPJ/CPF/MATRÍCULA
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	000.299.904/0001-60

ENDEREÇO	INSCR. ESTADUAL	INSCR. MUNICIPAL
RUA SETE DE SETEMBRO 98 GRUPO 605 CENTRO	0...	1779982

CIDADE	U.F.	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
RIO DE JANEIRO	RJ	20.050-002	353	3003	130802510

TIPO DE LICITAÇÃO
PREGÃO - CONFORME LEI 10520 ARTIGO 1 INCISO CAPUT

VALOR DESTA EMPENHO
R\$ 7.611.054,46 SETE MILHOES E SEISCENTOS E ONZE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

OBSERVAÇÕES:
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP-4 - PROGRAMA PAVIMENTA RIO.

Rio de Janeiro, 08 de Abril de 2020.

CONFERE

José Luiz Diniz dos Santos
Mat. 118.366-4

VISTO

Sônia Regina Ferreira
Matr. 11/244.121-0

09

Processo nº: 06/300.120/2020	
Data da autuação:	fls.:
Rubrica	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
 Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional
 Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação



COMUNICADO DE INÍCIO IHC/SUBCTO/CGEC/CPI/Fiscalização N.º 009

Rio de Janeiro, 28 de Abril de 2020.


DOS FISCAIS: JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR, matrícula n.º 11/241.313-6, CREA-RJ n.º 181591/D, SUSANA VIANA BITTENCOURT, matrícula n.º 11/268.112-0, CREA-RJ 2009110807 e MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA, matrícula: n.º 11/119.129-5, CREA-RJ 881062287/D.

À EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.


Prezados Senhores:

Levamos ao conhecimento de V. S.^a, que essa Empresa está autorizada a dar o início dos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, a partir de **28/04/2020**, nas condições do projeto básico aprovado, objeto do processo n.º **06/300.120/2020**, referente ao Contrato n.º **024/2020**.

Atenciosamente,


 JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR
 matrícula n.º 11/241.313-6
 CREA-RJ n.º 181591/D


 SUSANA VIANA BITTENCOURT
 matrícula n.º 11/268.112-0
 CREA-RJ 2009110807


 MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA
 matrícula n.º 11/119.129-5
 CREA-RJ 881062287/D

RECEBIDO



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
Subsecretaria de Conservação e Técnico-Operacional
Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação



Contrato 024/2020 de 28/04/2020	Processo 0006/300.120/2020	Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
------------------------------------	-------------------------------	---

Obra "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTA RIO"

VALORES RELATIVOS À ADJUDICAÇÃO (R\$)

CONTRATO SERVIÇO R\$ 36.091.144,98	EMPENHADO SERVIÇO R\$ 10.826.778,73	A EMPENHAR SERVIÇO R\$ 25.264.366,25	BDI (%) = 18,00	lo = 2019/12
--	---	--	-----------------	--------------

ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	DURAÇÃO (DIAS)	DURAÇÃO ACUMULADO	PERCENTAGENS		FATURAMENTO		OBSERVAÇÕES
				SIMPLES	ACUMULADA	SIMPLES	ACUMULADO	
1a	28/04/2020 a 27/05/2020	30	30	5,000000	5,000000	1.804.557,25	1.804.557,25	
2a	28/05/2020 a 26/06/2020	30	60	15,000000	20,000000	5.413.671,75	7.218.229,00	
3a	27/06/2020 a 26/07/2020	30	90	20,000000	40,000000	7.218.229,00	14.436.458,00	
4a	27/07/2020 a 25/08/2020	30	120	20,000000	60,000000	7.218.229,00	21.654.687,00	
5a	26/08/2020 a 24/09/2020	30	150	20,000000	80,000000	7.218.229,00	28.872.916,00	
6a	25/09/2020 a 24/10/2020	30	180	20,000000	100,000000	7.218.228,98	36.091.144,98	

C R O N O G R A M A

Processo.	Fls..
Data de Autuação:	Rubrica:

JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR
 matrícula n.º 11/241.313-6
 CREA-RJ n.º 181591/D

SUSANA VIANA BITTENCOURT
 matrícula n.º 11/268.112-0
 CREA-RJ 2009110807

MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA
 matrícula: n.º 11/119.129-5
 CREA-RJ/881062287/D

RECEBIDO



PREFEITURA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional
 Coordenadoria Geral de Engenharia e Conservação

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª

CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interm.

Nº BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Resolução nº 169 de 20/03/1980

ITEM	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
LOGRADOURO	MT04050050	MT14050300	TC04050700	TC09050150	TC09050700	SC04050850	SC04100050	SC04100300	SC09050900	SC09051100
UNIDADE	m3	m3	t.km	t	t	m3	un	m3	h	h
	-	-	12.019,4448	94,0200	470,1250	-	-	-	277,5000	555,0000
TOTAL	-	-	12.019,4448	94,0200	470,1250	-	-	-	277,5000	555,0000

01 Estrada do Rio Grande
 99 Geral

Maurício de Almeida Castro Graça
 Subsecretaria de Conservação Técnico-operacional
 Matr. 117119129-5
 CREA RJ 117119129-5

Eng. Susana Viana Bittencourt
 Matr. 11268.112-0
 CREA RJ 11268.112-0

João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 181.591/D
 Matr. 11/241.313-6



PREFEITURA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Infraestr.
 Subsecretaria de Conservação Tr
 Coordenadoria Geral de Engenharia

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
 Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª
CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interim.
N.º BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Res:

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
LOGRADOURO	SC09051200	h	-	2.775,0000	-	-	-	-	-	-	-	-
01 Estrada do Rio Grande	SC09100150	h	-	-	277,5000	-	-	-	-	-	-	-
99 Geral	SC14050400	m3	-	-	-	135,3960	-	-	-	-	-	-
	SC14050425	m2	-	-	-	-	84,0000	-	-	-	-	-
	SC34050050	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SC34050050	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DR34050250	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				2.775,0000		277,5000	135,3960	135,3960	84,0000			

João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 181.591/D
 Matr. 11241.313-6

Eng. Susana Viana Bittencourt
 Matr. 11119129-5
 CREA-RJ: 2009110807

Maurício Gonçalves de A. Graça
 Engenheiro Civil
 Matr. 11119129-5
 CREA-RJ: 181.591/D



PREFEITURA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Infraestrut.
 Subsecretaria de Conservação e
 Coordenadoria Geral de Engenharia

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
 Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-6
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª
CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interm.
N.º BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Res:

ITEM	LOGRADOURO	CÓDIGO	UNIDADE	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
01	Estrada do Rio Grande	BP09050050	t	1.517,3200	t	1.517,3200	m2	m2	m2	m3	m	m3	m3
99	99 Geral						10.886,5800			727,1434			
TOTAL				1.517,3200		1.517,3200	10.886,5800			727,1434			

João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA/RJ-181.591/D
 Matr. 11/241.313-6

[Handwritten Signature]
 Eng. Susana Viana Bittencourt
 Matr. 11/268.112-0
 CREA-RJ 20091108/7

[Handwritten Signature]
 Eng. João Adolpho da Silva Júnior
 CREA/RJ-181.591/D
 Matr. 11/241.313-6



PREFEITURA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretaria Municipal de Infraestrut.
 Subsecretaria de Conservação e
 Coordenadoria Geral de Engenharia

ORÇÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª
CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interm.
Nº BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Res:

ITEM	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
LOGRADOURO	ET04200200	ET04250403	EQ04050062	EQ04050312	EQ14050380	EQ14050386	EQ44050059	EQ44050100	EQ44050106	EQ44050600
UNIDADE	m3	m3	un_mes	un_mes	h	h	h,dam	h	h	h
	-	-	1,5000	1,5000	388,5000	166,5000	555,0000	388,5000	166,5000	194,2500
TOTAL	-	-	1,5000	1,5000	388,5000	166,5000	555,0000	388,5000	166,5000	194,2500

01 Estrada do Rio Grande
 99 Geral

(Handwritten signature)
 Eng. Siguemir de Aguiar Bittencourt
 Matrícula 11268-112-0
 CREA-RJ 2009110807

João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 181.591/D
 Matr. 11/241.313-6

(Handwritten signature)
 MAURICIO G. DE A. GRAÇA
 Engenheiro Civil - Geralista
 Matr. 11/119.129-5



PREFEITURA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretária Municipal de Infraestrut.
 Subsecretaria de Conservação Trf
 Coordenadoria Geral de Engenharia

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª
CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interim.
N.º BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Res:

ITEM	CÓDIGO	UNIDADE	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	TOTAL
LOGRADOURO	EQ44050606	h	83,2500										
	ST74050300	m2		1,2990									
	AD14100050	t			54,0470								
	AD14100300	t.Km				167,5457							
	AD14150401	un.mes					4,5000						
	AD14150750	un.mes											
	AD19250210	un								35,0000			35,0000
	AD19250310	m2									8,4000		8,4000
	AD24050200	un.mes										67,5000	67,5000
TOTAL			83,2500	1,2990		162,1410	5.366,8671	4,5000		35,0000	8,4000		67,5000

01 Estrada do Rio Grande
 99 Geral

João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ181.591/D
 Matr: 11/241.313-6

Eng. Susana Viana Bittencourt
 CREA-RJ 2009110807
 Matrícula 117268-112-0

MARCO ANTONIO DE ALENCASTRO BRAGA
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ 11110130-5
 Matr: 11/110130-5



PREFEITURA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 Secretária Municipal de Infraestrut.
 Subsecretaria de Conservação e
 Coordenadoria Geral de Engenharia

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
 Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª
CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interm.
N.º BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Res:

ITEM	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
CÓDIGO	AD24050250	AD24050300	AD24050450	AD39050086	AD39050116	AD39050134	IE00027107	IE00027108	IE00027109	IE00027110
UNIDADE	un_mes	un_mes	m	h	h	h	t	t	t	t
01 Estrada do Rio Grande					277,5000					
99 Geral	52,5000	-	-	555,0000	555,0000	555,0000	-	-	-	-
TOTAL	52,5000	-	-	555,0000	832,5000	555,0000	-	-	-	-

João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 181.594/D
 Matr. 11/241.313-6


Eng. Sérgio Viana Bittencourt
 Matr. 11/268.112-0
 CREA-RJ: 200911080/1

Maurício Gonçalves de A. Graça
 Engenheiro Civil - Gerente
 CREA-RJ: 11/119.129-5
 Matr. 11/119.129-5


AP

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Intern.
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

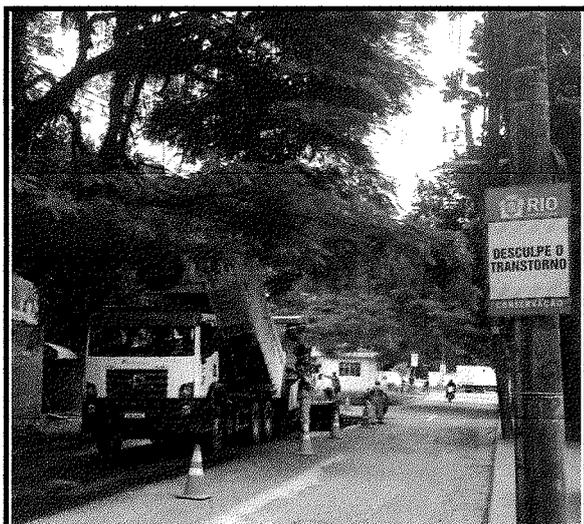

Estrada do Rio Grande
 Recapeamento com CBUQ

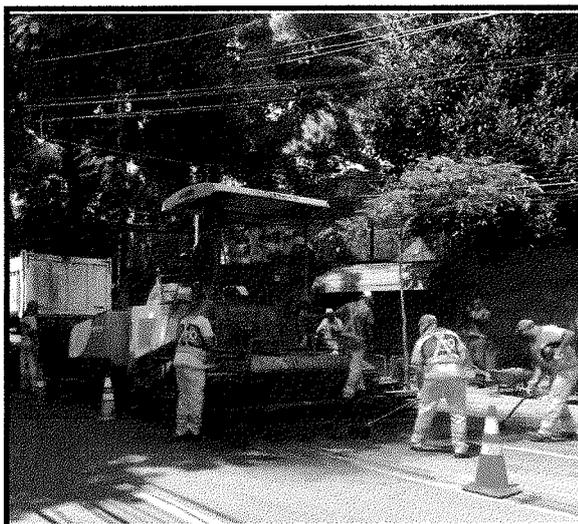

Estrada do Rio Grande
 Espalhamento de CBUQ com vibro acabadora



Estrada do Rio Grande
 Acabamento com rastilheiro



Estrada do Rio Grande
 Compactação com rolo de pneus


João Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 181.591/D
 Matr. 11/241.313-6

Susana Viana Bittencourt
 Matrícula 11/268.112-0
 CREA-RJ 2009110807


Maurício G. de Azevedo Graça
 Engenheiro Civil
 Matr. 11/119129-5
 CREA 88-1-06228-7

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

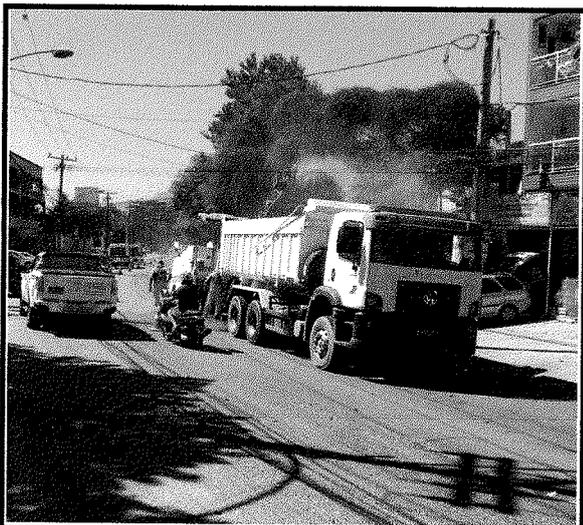


Estrada do Rio Grande
Corte mecânico com fresadora

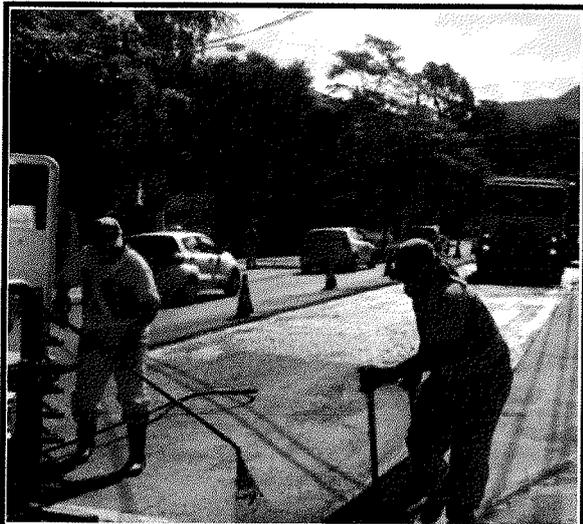

Estrada do Rio Grande
Pintura de Ligação

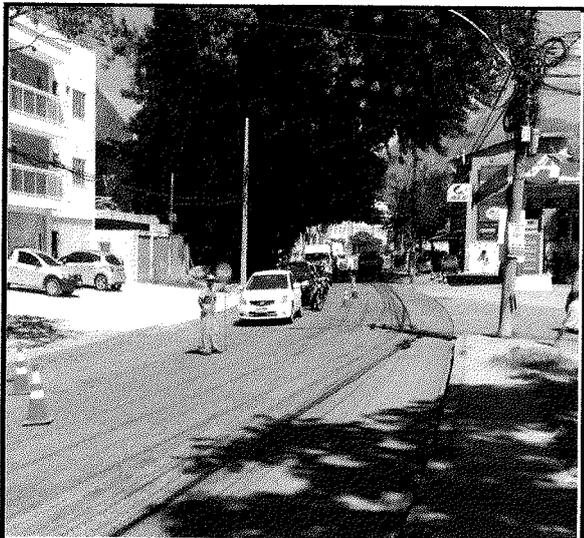

Estrada do Rio Grande
Operação de tráfego

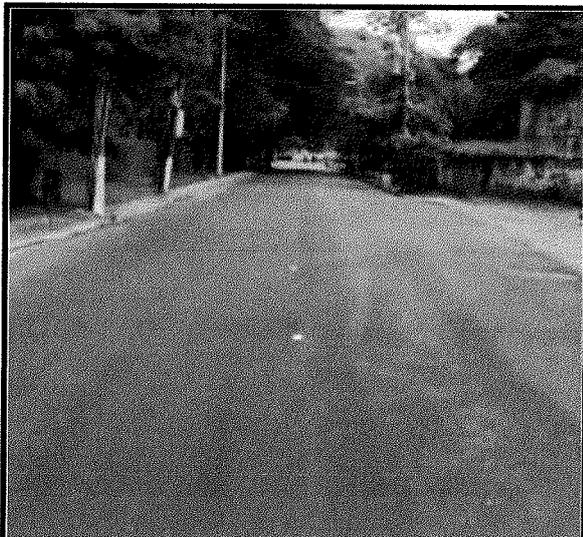

Estrada do Rio Grande
Pré-marcação da sinalização horizontal


João Adolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Susana Viana Bittencourt
Engª Susana Viana Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807


MAURICIO G. DE ALEMEIDA CASTRO GRACIA
SC/SUBSEC/CCC/C/2ª-GI-GERENTE
Matr. 11/119129-5
CREA 88-1-80228-7

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO

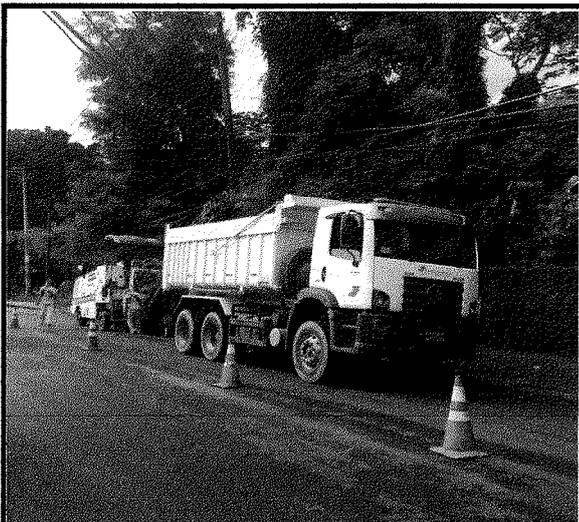


Estrada do Rio Grande
Corte mecânico com fresadora

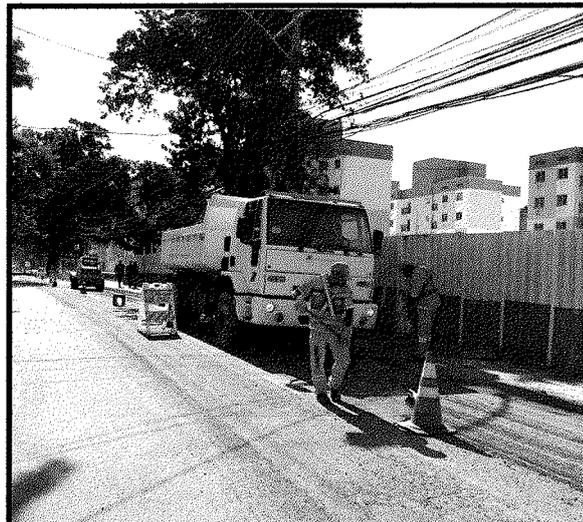

Estrada do Rio Grande
Limpeza com equipe de apoio



Estrada do Rio Grande
Limpeza com minicarregadeira

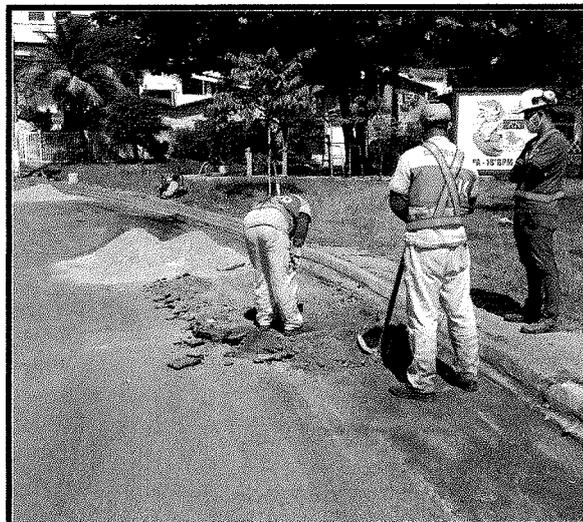

Estrada do Rio Grande
Substituição de Base _ Remendo profundo

João Adolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Susana Viana Bittencourt
Engenheira Civil
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807


Maurício G. de Alencastro
Engenheiro Civil
CREA-RJ 000/000/000/000-0
Matr. 11/119129-5
CREA-RJ 0000000-7

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 - Programa PAVIMENTARIO
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO




Estrada do Rio Grande
Abertura de juntas _ Remendo profundo

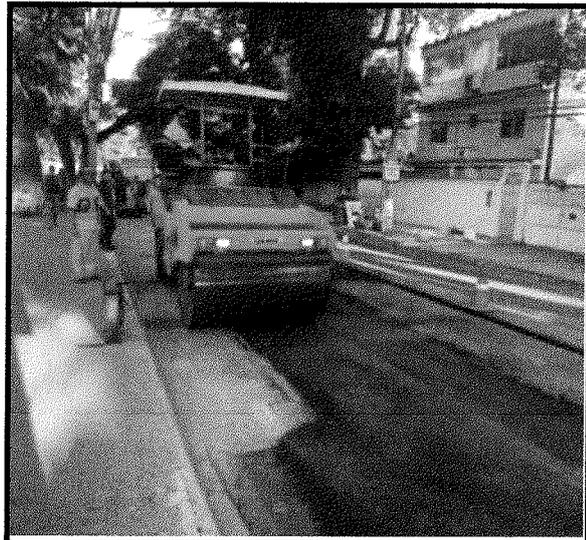

Estrada do Rio Grande
Compactação com rolo de chapa _ Remendo profundo



Estrada do Rio Grande
Chapa de Aço

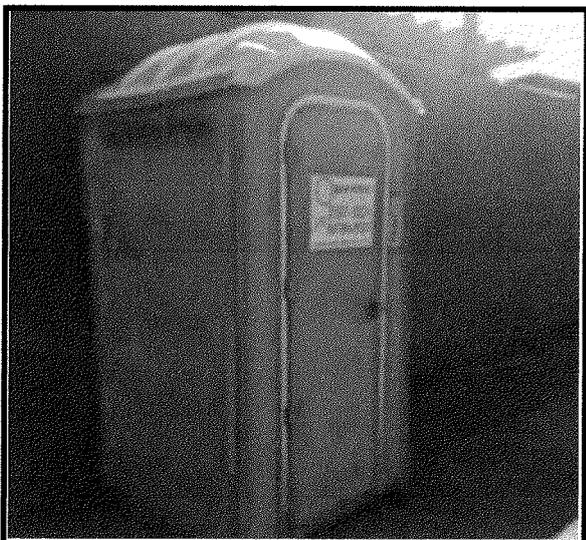

Estrada do Rio Grande
Banheiro químico

João Adolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Susana Viana Bittencourt
Engenheira Civil
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

Maurício G. de Azevedo Graça
CREA-RJ: 11/119.129-5
Matr. 11/119.129-5
CREA-RJ: 00-1-00213-7



Sr. Coordenador Geral da IH/SUBCONSERV/CGEC,

A Comissão de fiscalização do contrato nº 024/2020, objeto do processo 06/300.120/2020 – “Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 – Programa PAVIMENTARIO”, referente à 01ª medição, 01ª etapa (intermediária), no período de 28/04/2020 a 13/05/2020, informa que o valor desta medição foi utilizado integralmente na área da AP4.

- **AP4** – R\$ 1.015.972,01 (Um milhão, quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo).

Valor total dos serviços nesta etapa: R\$ 1.015.972,01 (Um milhão, quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo).


Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2020



JOÃO ADOLPHO DA SILVA JUNIOR
Mat. 11/241.313-6



MAURÍCIO G. DE ALENCASTRO GRAÇA
Mat. 11/119.129-5



SUSANA VIANA BETTENCOURT
Mat. 11/268.112-0



DIM.FAT 00.211.001/2020. (01ª MED 01ª INT.)

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2020.

À
PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO – SMIHC

Att.: Sr. Sebastião Bruno
Secretário Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação

C/c: Sr. João Adolpho da Silva Júnior
Sra. Susana Viana Bittencourt
Sr. Maurício Gonçalves de Alencastro Graça
Comissão de Fiscalização

Ref.: Contrato nº 024/2020 – Processo Administrativo nº 06/300.120/2020

Ass.: 01ª Medição – 01ª Etapa Intermediária - Período de 28/04/2020 a 13/05/2020
Envio da totalidade dos documentos contratualmente exigíveis para fins de Pagamento

Ilmo. Sr. Secretário,

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de executora e detentora do contrato que tem como objeto a “**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO**”, vem, respeitosamente, à presença de V.Sa., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:

Ao passo que o cumprimos, a Dimensional, através da presente missiva, encaminha a totalidade da documentação judicial, legal e contratualmente exigida para fins aceitação e atestação das medições de serviços, bem como, o conseqüente pagamento dos valores discriminados na 1ª Medição de Serviços – 1ª Etapa Intermediária, ora acostada.

Ademais, apenas para fins de registro, informa-se que não há que se cogitar acerca da exigência, no presente Contrato, como documentação integrante das medições de serviços, àqueles listados no artigo 1º do Decreto Municipal nº 43.189/2017, referentes às “*notas fiscais relativas ao material de construção utilizado e as ferramentas e equipamentos alugados*”.

Isso, devido à falta de expressa previsão contratual e editalícia, o que impede a Contratante e o Corpo Fiscal da obra de condicionar a aceitação e atestação das Medições de Serviços, ou a liquidação e o pagamento dos valores devidos, ao fornecimento destes documentos, em estrita conformidade aos princípios norteadores

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção



13

DS
BM

DS
M

DS
OK



das contratações administrativas, v.g., legalidade, vinculação ao instrumento convocatório, pacta sunt servanda, segurança jurídica, moralidade, dentre outros.

Compete ainda aduzir que, no âmbito do Contrato nº 024/2020, tal exigência somente tornar-se-ia legítima, válida e obrigatória de cumprimento e atendimento, na hipótese de ambas as Partes (Contratante e Contratada) consentirem e formalizarem esta alteração contratual através de um Termo Aditivo, uma vez que o artigo 65, inciso II, alínea "c", da Lei nº 8.666/93, veda a alteração unilateral de cláusula relacionada a condições de pagamento.

Inclusive, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conforme decisões proferidas, em Segundo Grau de Jurisdição, no âmbito de um processo judicial que trata, especificamente, sobre a validade da exigência contida no Decreto nº 43.189/2017. As decisões não apenas determinaram a suspensão dos efeitos do Decreto nº 43.189/2017, mas também fizeram constar importantes registros acerca da impossibilidade de sua observância e aplicação em contratos cujas cláusulas verificam-se silentes e/ou omissas quanto à exigência de apresentação das referidas Notas Fiscais. Como se evidencia abaixo:

- Decisão Monocrática, proferida em 12.12.2017, em sede de Agravo de Instrumento (Proc. 0071286-43.2017.8.19.0000), concedendo a Liminar para a suspensão dos efeitos do Decreto nº 43.189/2017:

Pelo que consta dos autos, o decreto impugnado impôs obrigações às empresas contratadas pela administração, que não foram previstas no contrato celebrado, alterando-o unilateralmente.

À luz do art. 65 da Lei 8.666/63, inciso I, a alteração unilateral do contrato pela administração é possível em duas hipóteses:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção





No caso em tela, as obrigações impostas no decreto mencionado não se enquadram em nenhuma dessas hipóteses, que autorizam a alteração unilateral do contrato, visto que dispõe sobre a medição de obras e serviços, exigindo como requisito para liquidação das despesas a apresentação de notas fiscais relativas ao material de construção utilizado e as ferramentas e equipamentos alugados, de tal forma que comprovem as especificações.

Segundo consta do contrato (cláusula quarta) o pagamento dos serviços prestados ocorrerá conforme o cronograma físico-financeiro, e obedecido o sistema de medição previsto no item 14 do Edital.

Desta forma, pela leitura do contrato firmado entre as partes, não se vislumbra, como condição para pagamento da etapa

concluída, a apresentação de notas fiscais dos materiais e equipamentos²⁹ utilizados na execução do serviço, mas tão somente da medição.

- Decisão Colegiada, proferida em 31.07.2018, mantendo a decisão em sede de liminar e dando provimento ao Agravo de Instrumento (Proc. 0071286-43.2017.8.19.0000):

A redação do Decreto Municipal em tela, embora possa ser negada, tem a finalidade de contrariar o edital relativo às obras ou serviços ou mesmo alterar o contrato que o compõe. A prova disso, dentre as demais disposições, está no artigo 3º que condiciona o pagamento das faturas (liquidação das despesas) ao cumprimento do dito decreto, cuja redação é:

"Art. 3º - A Controladoria do Município deverá adotar providências para condicionar a liquidação das despesas ao cumprimento deste Decreto."

Implica esta condição em indistigável modificação do contrato e respectivo edital, em face da referida condicionante, que altera, no mínimo, o prazo contratual de pagamento da fatura, que, conforme documento do arquivo 74, do Anexo, na cláusula quatro, §1º, será no prazo de "até 30 dias, a contar da data da apresentação da fatura devidamente formalizada" que é produzida mediante etapas, fiscalizadas e controladas pelo contratante segundo o cronograma físico-financeiro.

Demais, o mesmo artigo 65, da Lei nº 8.666/93, no inciso II, ao dizer que os contratos podem ser alterados, estabelece condições bem claras a respeito. E o que interessa ao caso é a relativa ao pagamento, que DEVE SER FORMALIZADO POR ACORDO DAS PARTES.

(...)

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela
Integridade e Contra a Corrupção





Com efeito, se não há obrigação contratual de apresentar nota fiscal para verificação de adequada aplicação dos materiais informados, (artigo 2º, do Decreto nº 43.189/17), inexistente qualquer possibilidade da obra ou serviço não serem aceitos pela Administração, mesmo porque o controle e fiscalização, como dito antes, é realizado por etapas segundo o cronograma físico e financeiro.

- Decisão Monocrática, proferida em 24.10.2019, que concedeu efeito suspensivo à Apelação interposta pela AEERJ (Proc. 0068485-86.2019.8.19.0000):

Como ficou consignado no agravo de instrumento acima citado, as obrigações impostas pelo ato normativo impugnado não se alinham com os casos previstos no inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993.

Por outro lado, o pagamento da obra/serviço licitado deve ocorrer conforme o programa de pagamento, obedecido o sistema de medição previsto no instrumento convocatório e no contrato administrativo.


Fica evidente que o decreto impugnado alterou unilateralmente a forma de pagamento prevista no contrato e no edital, sem que fossem demonstradas as hipóteses do inciso I do art. 65 da Lei 8.666/93.

Assim, vislumbro na hipótese a probabilidade de provimento do apelo, motivo pelo qual atribuo ao recurso o efeito suspensivo pretendido.

Diante do exposto, a Dimensional encaminha à Pasta Secretarial a totalidade dos documentos exigíveis para fins de pagamento da 01ª Medição – 01ª Etapa Intermediária, ressaltando que não há que se cogitar sobre à obrigatória apresentação dos documentos previstos no artigo 1º, do Decreto nº 43.189/2017, haja vista que o Contrato e Edital são silente e omissos quanto a esta obrigação.

Por fim, a Dimensional aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

 C5C76A237ABE472...

DIMENSIONAL ENGENHARIA

ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção



Rio de Janeiro, 08 de JUNHO de 2020.

PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO DECRETO N.º 43.189 DE 18/05/2017
REF.: 01ª MEDICÃO – 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERÍODO DE 28/04/2020 a 13/05/2020

Prezado Senhor,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60**, na qualidade de executora da “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO” **PROCESSO INSTRUTIVO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020**, vem, através desta, declarar que diversos equipamentos, de pequeno, médio e grande porte, utilizados no contrato em epígrafe são próprios, bem como materiais não incorporados à obra. Importa informar, adicionalmente, que foram aplicados na obra, eventualmente, materiais incorporados que faziam parte do estoque da empresa.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo, desde já, no aguardo das vossas providências.

Atenciosamente,


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Edeor Macedo
Administrativo
07570270-4 IFF





DECLARAÇÃO

Declaramos a adequada aplicação das ferramentas, equipamentos próprios e materiais de construção, nos termos do art. 2º, do Decreto Rio nº 43.189/2017, na presente medição (01ª etapa intermediária, 01ª medição), do contrato 024/2020, processo instrutivo 06/300.120/2020 da empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Rio de Janeiro,


08 de *Setembro*

de 2020



JOÃO ADOLPHO DA SILVA JUNIOR

Mat. 11/241.313-6



MAURÍCIO G. DE ALENCASTRO GRAÇA

Mat. 11/119.129-5



SUSANA VIANA BITTENCOURT

Mat. 11/268.112-0

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

**PORTARIA TR/CRV Nº 4.181
EM 11 DE MAIO DE 2020.**

AUTORIZA A INTERDIÇÃO AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM VIAS DO BAIRRO SÃO CONRADO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE DRENAGEM.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/CRV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º c/c o Art. 24, inciso II e no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro,

CONSIDERANDO a solicitação encaminhada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE), de 8 de maio de 2020,

CONSIDERANDO o pedido da CET-Rio, constante do Ofício da CETRIO/ PRE/CGO/CTAE/2ª CRAE Sul nº 009/2020, de 11 de maio de 2020,

CONSIDERANDO o parecer técnico da CET/DOP/CRAE,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a interdição ao trânsito de veículos, em uma faixa de rolamento, na saída do Túnel Zuzu Angel, sentido Barra da Tijuca, junto ao bordo direito da via.

Art. 2º A realização das interdições poderá ser suspensa pelas equipes operacionais da CET-Rio, caso seja identificada a necessidade de utilização integral das vias envolvidas em função das condições do trânsito ou climáticas.

Art. 3º Esta autorização só será válida se forem cumpridos os dispositivos contidos nos artigos 94 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro, ficando o infrator pela inobservância dos aludidos dispositivos sujeito a multa conforme previsto no C.T.B., independente das cominações cíveis e penais cabíveis.

Art. 4º A presente Portaria, terá validade para o dia 13 de maio de 2020, das 23h às 4h do dia subsequente, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA TR/CRV Nº 4.182
EM 11 DE MAIO DE 2020.**

AUTORIZA A INTERDIÇÃO AO TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PROÍBE O ESTACIONAMENTO EM VIA DO BAIRRO LEBLON PARA A REALIZAÇÃO DE PODA DE ÁRVORES.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/CRV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º c/c o Art. 24, inciso II e no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro,

CONSIDERANDO o constante no e-mail encaminhado pela COMLURB,

CONSIDERANDO o parecer técnico da CET/PRE/CTRT/AP-2.1,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a interdição ao trânsito de veículos na Rua Cupertino Durão, no trecho compreendido entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida General San Martin.

Parágrafo único. A interdição de que trata este artigo não se aplica aos veículos de moradores e aos destinados a socorro e emergência previstos no Art. 29, incisos VII e VIII do Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º Proibir o estacionamento de veículos na Rua Cupertino Durão, no trecho compreendido entre a Avenida Delfim Moreira e a Avenida General San Martin, em ambos os lados.

Art. 3º Esta autorização só será válida se forem cumpridos os dispositivos contidos nos artigos 94 e 95 do Código de Trânsito Brasileiro, ficando o infrator pela inobservância dos aludidos dispositivos sujeito a multa conforme previsto no C.T.B., independente das cominações cíveis e penais cabíveis.

Art. 4º A presente Portaria terá validade para o dia 13 de maio de 2020, das 7h às 17h, revogadas as disposições em contrário.

**PORTARIA TR/CRV Nº 4.183
EM 11 DE MAIO DE 2020.**

PROÍBE O ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NAS VIAS LOCALIZADAS JUNTO À ORLA DA PRAIA DOS BAIRROS COPACABANA, IPANEMA, LEBLON, SÃO CONRADO, URCA, BARRA DA TIJUCA E RECREIO DOS BANDEIRANTES COMO MEDIDA ADICIONAL DE CONTENÇÃO DO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID-19.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE REGULAMENTAÇÃO E INFRAÇÕES VIÁRIAS - TR/CRV, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 2º c/c o Art. 24, inciso II e no Art. 95 do Código de Trânsito Brasileiro,

CONSIDERANDO o Decreto Rio nº 47.282, de 21 de março de 2020, que determina a adoção de medidas adicionais, pelo Município, para enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o parecer da CET-RIO/PRE/CTRT AP 2.1 e CTRT AP 4,

RESOLVE:

Art. 1º Proibir o estacionamento de veículos, em toda a extensão e em ambos os sentidos, inclusive nas baías, nas seguintes vias:

I - Avenida Atlântica;

II - Avenida Vieira Souto;

III - Avenida Delfim Moreira;

V - Avenida Niemeyer;

IV - Avenida Prefeito Mendes de Moraes;

VI - Praça General Tibúrcio, junto à Praia Vermelha.

VII - Avenida João Luís Alves;

VIII - Avenida Portugal;

IX - Avenida do Pepê;

X - Avenida Lúcio Costa;

XI - Estrada do Pontal e transversais imediatas;

XII - Av. Paulo Tapajós.

Parágrafo Único. A proibição de que trata esta Portaria não se aplica:

I - Aos veículos de moradores residentes nas vias descritas no Art. 1º, que deverão afixar comprovante de residência junto ao para-brisas, com a descrição do endereço de forma visível;

II - Aos veículos de hóspedes de hotéis localizados nas vias descritas no artigo 1º, que deverão afixar comprovante de estadia junto ao para-brisas, de forma visível;

III - Aos veículos de idosos e de pessoas com deficiência física, desde que estacionados nas vagas regulamentadas, portando cartão de identificação conforme regulamentação existente;

IV - Veículos autorizados pela autoridade de trânsito municipal.

Art. 2º. Suspender a cobrança de estacionamento nas vias descritas no Art. 1º, onde exista estacionamento pago regulamentado pelo Município.

Art. 3º A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, com implantação da sinalização necessária, revogadas disposições em contrário.

CET-RIO

Companhia de Engenharia de Tráfego
Rua Dona Mariana, nº48 - Botafogo - Tel.: 2535-6100/ 2535-6101

**DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 11/05/2020**

PROCESSO Nº 03/200.764/2020 - Aprovo o Projeto Básico/Termo de Referência, inserto no p.p., e, em conformidade com o art. 1º da Lei nº 10.520/02, com a Lei nº 13.303/2016 e com o Decreto nº 44.698/2018, autorizo a abertura de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, referente à Prestação de serviços especializados de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com vistas à elaboração, implementação, acompanhamento e coordenação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTAT), do Laudo de Insalubridade e Periculosidade, da Análise Ergonômica e do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), pelo período de 12 (doze) meses.

PROCESSO Nº 03/201.332/2018 - Tendo em vista o informado pela Comissão designada pela Portaria "P" nº 016 CET-RIO, de 16/01/2020, às fs. 334, ACEITO, em caráter Definitivo, os serviços de cópiagem nas dependências da CET-Rio, objeto do Contrato nº 019/2018, a cargo da empresa DIAMANTE SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., com base na alínea "b", do inciso I, do artigo 73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE
EXPEDIENTE DE 28/04/2020**

PROCESSO Nº 03/200.632/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.671/2020 - DEFERIDO

PROCESSO Nº 03/200.673/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.675/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.664/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.663/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.666/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.223/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.242/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.567/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.549/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 01/06/000.013/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 01/06/000.008/2020 - DEFERIDO

EXPEDIENTE DE 29/04/2020

PROCESSO Nº 03/200.230/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.428/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.656/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.660/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.754/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.755/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.636/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.640/2020 - DEFERIDO
PROCESSO Nº 03/200.646/2020 - DEFERIDO

SECRETARIA DE URBANISMO

Secretária: Fernanda Maria da Silva Fernandez Tejada

**SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
COORDENADORIA GERAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DESPACHO DO COORDENADOR**

EXPEDIENTE DE 11/05/2020

02/001395/2015 - MARCUS QUARESMA FERRAZ
Indeferido o que requer considerando que o Laudo foi elaborado de acordo com o parecer PG/PADM/URB/027/2018/FLC, de 25/09/2018, e súmula da jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nº 384, no processo nº 02/263.240/2015(memorando circular CGLF nº 5/2018, sendo este parecer mais recente e atualizado do que o apresentado neste recurso; o exposto no §10º do art. 8º da L.C. 198/2019, onde é permitida a cobrança do fechamento da varanda que não atenda integralmente à L>C> 145/2014 regulamentada pelo decreto 39.345/2014.

02/265376/2015 - PAULO ROBERTO LACERDA
Indeferido o que requer

02/05/000689/2019 - MARLENE TINOCO DE CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS
Indeferido o que requer

**COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO
E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 5 - CAMPO GRANDE
DESPACHO DO COORDENADOR**

EXPEDIENTE DE 11/05/2020

02/05/000901/2019 - U/SUBU/CGLF/CLU-5
Aprovo o laudo de vistoria administrativa 25/0004/2020

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO**

Secretário: Sebastião Bruno

**SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
PORTARIA "P" Nº 034 DE 08 DE MAIO DE 2020.**

O SUBSECRETÁRIO DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:

Designar com eficácia a partir de 28/04/2020 os servidores, JOÃO ADOLPHO DA SILVA JÚNIOR, matrícula n.º 11/241.313-6, CREA-RJ n.º 181591/D, SUSANA VIANA BITTENCOURT, matrícula n.º 11/268.112-0, CREA-RJ 2009110807 e MAURÍCIO GONÇALVES DE ALENCASTRO GRAÇA, matrícula: n.º 11/119.129-5, CREA-RJ 881062287/D, para juntos comporem a comissão de fiscalização dos "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO RIO", objeto do processo n.º 06/300.120/2020, referente ao contrato n.º 024/2020, assinado em 28/04/2020, a cargo da firma prestadora de serviços DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

**COMISSÃO COORDENADORA DE OBRAS E REPAROS
EM VIAS PÚBLICAS - IHC/COR-VIAS**

Despacho do Presidente da Comissão Coordenadora de Obras e Reparos em Vias Públicas - IHC/COR-VIAS, baseado no que foi analisado pelos relatores na Seção Plenária de 05/05/2020:

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Secretário: Bernardo Egas Lima Fonseca
Rua Maia de Lacerda nº167 - Estácio - Tel.: 2976-6777/ Fax: 2389-0411

DESPACHO DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

PROCESSO Nº 14/000.229/2019 - Torno sem efeito o APROVO do Termo de Referência de fls. 198, publicado no D.O.-Rio nº 174 de 26/11/2019, APROVO o Termo de Referência de fls.322/336 (v).

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Secretário: Sebastião Bruno

DESPACHOS DO SECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

PROCESSO: 06/801.528/2020 - Autorizo nos termos das fls. 02.

PROCESSO: 06/500.470/2018 - Autorizo.

SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

Processo: 06/700.338/2019 - Tendo em vista o parecer da Comissão designada pela Portaria "P" nº 09 - IHC/SUBH de 07/04/2020, ficam aceitas em caráter **Provisório** as "Obras de Demolição de 87 (oitenta e sete) Unidades Habitacionais na Av. Kelson, Penha Circular, Rio de Janeiro/RJ", referente ao contrato nº 139/2019, a cargo da Empresa ENIMONT - Empresa Nacional de Instalação e Montagens LTDA.

SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

Processo: 06/700.446/2019 - Tendo em vista o parecer da Comissão designada pela Portaria "P" nº 10 - IHC/SUBH de 06/04/2020, ficam aceitas em caráter **Provisório** as "Obra de Reforma da escadaria na Travessa Henrique de Azevedo - Engenheiro Leal - Rio de Janeiro/RJ", referente ao contrato nº 129/2019, a cargo da empresa Novo Tempo Construções Eireli EPP.

SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

Processo: 06/700.462/2019 - Tendo em vista o parecer da Comissão designada pela Portaria "P" nº 11 - IHC/SUBH de 06/04/2020, ficam aceitas em caráter **Provisório** as "Obra de Reforma da escadaria na Rua Zélia - Engenheiro Leal - Rio de Janeiro/RJ", referente ao contrato nº 137/2019, a cargo da empresa Novo Tempo Construções Eireli EPP.

SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

PROCESSO 02/500.435/2018 - Conforme informação da fiscalização da Coordenadoria de Ações Sócio-Habitacionais, autorizo a **Readequação de Planilhas Orçamentárias sem acréscimo de valor**, sendo R\$ 65.298,41 (3,95%) de itens reduzidos e R\$ 65.298,41 (3,95%) em itens acrescidos com fundamento no artigo art. 65 inc. II, alínea "b" da Lei Federal 8666/93, referente à "Contratação de empresa para serviços especiais de trabalho técnico social no residencial Colônia Juliano Moreira do Programa Minha Casa Minha Vida", referente ao Contrato nº 82/2019, a cargo da empresa COBRAPE - CIA Brasileira de Projetos e Empreendimentos.

SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL DESPACHOS DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 08/04/2020

PROCESSO: 06/300.121/2020

1. **Objeto:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP-3 - Programa Pavimentação Rio.
2. **Partes:** Município do Rio de Janeiro por Intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação e GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
3. **Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei nº 10.520/2002.
4. **Valor:** R\$ 55.638.716,79 (Cinquenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, setecentos e dezesseis reais, setenta e nove centavos)
5. **Autorização:** CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA

PROCESSO: 06/300.120/2020

1. **Objeto:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP-4 - Programa Pavimentação Rio.
2. **Partes:** Município do Rio de Janeiro por Intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

3. **Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei nº 10.520/2002.
4. **Valor:** R\$ 36.091.144,98 (Trinta e seis milhões, noventa e um mil, cento e quarenta e quatro reais, noventa e oito centavos)
5. **Autorização:** CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA

PROCESSO: 06/300.119/2020

1. **Objeto:** Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP-3 - Programa Pavimentação Rio.
2. **Partes:** Município do Rio de Janeiro por Intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação e FP VIEIRA ENGENHARIA LTDA.

3. **Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei nº 10.520/2002.
4. **Valor:** R\$ 47.299.771,28 (Quarenta e sete milhões, duzentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e um reais, vinte e oito centavos)
5. **Autorização:** CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA

PROCESSO: 06/300.147/2020

1. **Objeto:** Serviços de Manutenção do Sistema de Drenagem na Área das I, II, III, VII, XXI E XXIII RAS - AP-1 e IV, V, VI, VIII, IX E XXVII RAS - AP-2.
2. **Partes:** Município do Rio de Janeiro por Intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação e GRAVISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
3. **Fundamento:** Artigo 1 Inciso Caput da Lei nº 10.520/2002.
4. **Valor:** R\$ 9.613.722,00 (Nove milhões, seiscentos e treze mil, setecentos e vinte e dois reais)
5. **Autorização:** CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA

SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO EXPEDIENTE DE 30/03/2020

Processo nº 26/340.421/2016 - AUTORIZO, na forma proposta pela Comissão de Fiscalização, a celebração de Termo Aditivo ao Contrato nº 68/2018:

a) a prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias, a contar de 06/04/2020, com base no Artigo 57, § 1º, inciso III da lei nº 8.666/93.
b) a adequação do cronograma físico-financeiro, com base no Art. 65, II, c, da Lei nº 8.666/93, bem como o Art. 480 caput e Parágrafo Único do RGCAF.

(*) Republicado por ter saído com incorreções no D.O. Rio nº 14 de 31/03/2020, pág. 36, 1ª coluna.

RIOURBE

Empresa Municipal de Urbanização
Largo dos Leões, 15 - Humaitás - Tel.: 2976-9206/ 2976-9204
Fax: 2976-9225 - E-mail: rriourbe@perj.rj.gov.br

PORTARIA "P" Nº 060 08 DE ABRIL DE 2020.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,

Designar, a partir de 26/03/2020, os servidores ANTONIO PARENTE DA SILVA FILHO, matrícula nº 131/192.544-5, IGOR FRANCISCO TEIXEIRA LEMOS, matrícula nº 69/561.029-0 e RONALDO ARANHA OLIVEIRA, matrícula nº 11/248.039-0, para, sob a presidência do primeiro, fiscalizarem e acompanharem a execução das "OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NO CTI, ENFERMARIAS E OUTROS ESPAÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA", objeto do processo nº 06/500.485/2020, a cargo da empresa IRMÃOS HADDAD CONSTRUÇÃO EIRELI, cabendo a esses a atestação dos respectivos documentos fiscais, observando-se o disposto no Decreto N.º 34.012 de 20 de junho de 2011, e suas alterações.

PORTARIA "P" Nº 061 08 DE ABRIL DE 2020.

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,

Designar, a partir de 26/03/2020, os servidores JOSE CLAUDIO TRAVASSOS BASTOS, matrícula nº 13/190.942-3, MIGUEL SIMÕES DE LIMA, matrícula nº 13/248.015-0, RENAN RICARDO RODRIGUES NOGUEIRA PINTO, matrícula nº 13/267.603-9 e RONALDO ARANHA OLIVEIRA, matrícula nº 11/248.039-0, para, sob a presidência do primeiro, fiscalizarem e acompanharem a execução das "OBRAS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL TEMPORÁRIO DO RIOCENTRO", objeto do processo nº 06/500.486/2020, a cargo da empresa M3 MANUTENÇÃO E MONTAGENS LTDA. cabendo a esses a atestação dos respectivos documentos fiscais, observando-se o disposto no Decreto N.º 34.012 de 20 de junho de 2011, e suas alterações.

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE EXPEDIENTE DO DIA 07.04.2020

06/500.317/2014 - Autorizo a prorrogação por 36 (trinta e seis) meses do contrato de locação não residencial nº 001/2014, entre a Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE e o Município do Rio de Janeiro,

representado pela Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, referente ao imóvel localizado na Rua Dona Mariana nº 48, Botafogo, pelo valor de R\$56.117,62 (cinquenta e seis mil, cento e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) mensais. *Omitido no D.O. de 08/04/2020.

RIO-ÁGUAS

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
Rua Voluntários da Pátria, 169 - Botafogo - Cep: 22.270-001
Tel: 3895-5114 - Fax: 3895-8217 - E-mail: rioaguas@perj.rj.gov.br

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EXPEDIENTE DE 26/03/2020

06/600.123/2020 - AUTORIZO a despesa conforme os dados que se seguem:

1. **Objeto:** PIS/PASEP
2. **Partes:** FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E BANCO DO BRASIL S.A.
3. **Razão:** Não Sujeito
4. **Valor:** R\$ 102.005,28 (Cento e dois mil e cinco reais e vinte e oito centavos).
5. **Autorização:** Ricardo Cardoso da Silva

*Omitido do D.O.M. de 02/01/2020

06/600.123/2020 - AUTORIZO a despesa conforme os dados que se seguem:

1. **Objeto:** Multas por Não Cumprimento de Obrigações Tributárias, Contributivas e Acessórias
2. **Partes:** FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E BANCO DO BRASIL S.A.
3. **Razão:** Não Sujeito
4. **Valor:** R\$ 103.495,94 (Cento e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos).
5. **Autorização:** Ricardo Cardoso da Silva

*Omitido do D.O.M. de 02/01/2020

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Secretária: Jucelia Oliveira Freitas
Rua Afonso Cavalcanti, 453 - S'andar - Tel.: 2293-0393/ Fax: 2273-6645

DESPACHO DO SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO EXPEDIENTE DO DIA 01/04/2020

*PROCESSO: 08/000.966/2015

NAD: 109

OBJETO: Termo Aditivo - Serviços de telefonia móvel

PARTES: SMASDH E CLARO S/A

FUNDAMENTO: Artigo 1 caput da Lei nº 10.520/2002 e suas alterações.

RAZÃO: Pregão

VALOR: R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais)

ORDENADOR: FRANCISCO HARILTON ALVES BANDEIRA

* Omitido: D.O. 02/04/2020.

*PROCESSO: 08/000.666/2020

NAD: 48

OBJETO: Material de limpeza e Higiene

PARTES: SMASDH E NOVA KEFFA DISTRIBUIDORA EIRELI

FUNDAMENTO: Artigo 4 caput da Lei nº 13.979/2020 e suas alterações.

RAZÃO: Dispensa

VALOR: R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais)

ORDENADOR: FRANCISCO HARILTON ALVES BANDEIRA

RATIFICADOR: JUCELIA OLIVEIRA FREITAS

* Omitido: D.O. 02/04/2020.

*PROCESSO: 08/000.666/2020

NAD: 36

OBJETO: Material de limpeza e Higiene

PARTES: SMASDH E ATACADÃO PAPELEX LTDA

FUNDAMENTO: Artigo 4 caput da Lei nº 13.979/2020 e suas alterações.

RAZÃO: Dispensa

VALOR: R\$ 75.024,89 (setenta e cinco mil, vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos)

ORDENADOR: FRANCISCO HARILTON ALVES BANDEIRA

RATIFICADOR: JUCELIA OLIVEIRA FREITAS

* Omitido: D.O. 02/04/2020.

*PROCESSO: 08/000.666/2020

NAD: 38

OBJETO: Material de limpeza e Higiene

PARTES: SMASDH E GPB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

FUNDAMENTO: Artigo 4 caput da Lei nº 13.979/2020 e suas alterações.

RAZÃO: Dispensa

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

CONCESSÃO DE LICENÇA (LMI)

CANOA QUEBRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 08.543594/0001-99, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, através do processo nº 14/200.222/2015, a renovação da Licença Municipal de Instalação (LMI) nº 001623/2015 para construção de grupamento residencial multifamiliar situado na Avenida Rosauero Estellita, 155 - Barra da Tijuca, RJ.

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

POSTO E GARAGEM 902 LTDA, sob CNPJ 34.320.515/0001-90, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade SMAC, através do processo nº 14/201.174/2013, a renovação de sua licença LMO Nº 002659/2020 para ATIVIDADE POSTO DE REVENDA E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS, SITUADO AV. PARARANAPUAN Nº 902 - FREGUESIA - ILHA DO GOVERNADOR-RJ-CEP 21910-002.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 04/410.391/2019
CONTRATO Nº 010/2020-SMF
ASSINATURA: 04.03.2020
PARTES: Município do Rio de Janeiro/SMF e a Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos.
OBJETO: Desconto em folha de pagamento de servidores municipais ativos e inativos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações, nas modalidades de Empréstimo Pessoal Consignado e/ou Cartão de Crédito Consignado em favor da Contratada.
PRAZO: 02(dois) anos a contar da data de sua assinatura.
DISP. LEGAL: Reger-se à pelas normas constantes da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 8.893/94, em especial pelo disposto no seu artigo 25, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública - Lei nº 207/80, e suas alterações, recepcionado pela Lei Complementar nº 01, de 13 de setembro de 1990, bem como pelo Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro(RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal nº 3221/81 e suas alterações.

*Omitido no D.O.Rio de 24.03.20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

*EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: 04/410.391/2019
TERMO ADITIVO Nº 11/2020 ao Contrato Nº 10/2020 -SMF
ASSINATURA: 04.03.2020
PARTES: Município do Rio de Janeiro/SMF e a Financeira Alfa S/A - Crédito, Financiamento e Investimento.
OBJETO: Prorrogar a vigência, relicitação da Clausula Primeira e Quarta do Contrato.

*Omitido no D.O.Rio de 24.03.20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

Processo Instrutivo: 09/002.822/2017
Contrato nº: 40/2020
Data da Assinatura: 18/02/2020
Partes: PCRJ / SMS e a empresa EGS ELEVADORES EIRELI

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e monta cargas.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses de 16/05/2020 até 15/05/2020

Valor Total: R\$ 643.318,56

Programa de Trabalho: 18.01.10.302.0306.2009

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48

Nota de Empenho nº: 2020/000238 no valor de R\$ 1,00 (um real)

Fundamento: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-SMS Nº 580/2018, e o decidido no Processo nº 09/002.822/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CCPC

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO INSTRUTIVO Nº: 12/000.631/2020
TERMO DE COMPROMISSO Nº: 731/2020
DATA DA ASSINATURA: 15/12/19
PARTES: PCRJ/SMC/RKF RIO EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA/ANTARES EDUCACIONAL S A
OBJETO: PROJETO "BIGBEAT FESTIVAL"
CÓDIGO DO PROJETO: WEC429/01/2019
VALOR: R\$ 160.000,00
FUNDAMENTO: LEI 5.553/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo: 06/500.218/2020
Instrumento: Contrato nº 25/2020
Data da assinatura: 06/05/2020
Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMHC E IRMÃOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI, COM A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE COMO INTERVENIENTE.
Objeto: OBRAS EMERGENCIAIS DO TELHADO DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA
Valor: R\$ 289.709,13
PRAZO: 60 dias
Programa de Trabalho: 18.01.10.302.0306.1063
Natureza da despesa: 4.4.90.51.02
Nota de Empenho: 2020/000730
Valor do Empenho: R\$ 289.709,13
Fundamento: Lei 8.666/93 e suas alterações

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,

HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO INSTRUTIVO: 06/300.120/2020
CONTRATO Nº 024/2020
DATA DA ASSINATURA: 28/04/2020
PARTES: Município do Rio de Janeiro/SMHC e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
OBJETO: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da A.P.4 - Programa Pavimenta Rio.
VALOR: R\$38.091.144,98
PRAZO: 180 dias
PLANO DE TRABALHO: 15.15.15.452.0071.2778
NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.24
NOTA DE EMPENHO: 2020/000449 no valor de R\$7.611.054,46 e 2020/000450 no valor de R\$3.215.724,27
FUNDAMENTO: Lei nº 10.520/2002 e suas alterações

MULTIRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE MULTIMEIOS LTDA.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Instrutivo: 07/100.171/2018
Instrumento: 4º Termo Aditivo nº 06/2020 ao Contrato nº 07/2018
Data da Assinatura: 03/04/2020
Partes: MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios Ltda. e T&S Locação de Mão de Obra em Geral EIRELI

Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses, de 05/04/2020 a 04/04/2021 e reajuste pelo IPCA-E de aproximadamente 2.6967%.

Valor: R\$ 41.297,40

Nota de Empenho: 2019/000171, no valor de R\$ 31.337,11

Natureza da Despesa: 3.3.90.37.09

Programa de Trabalho: 16.51.12.361.0381.4161.

Fundamento: Artigo 57, inciso II e 65 da Lei nº 8666/93.

(* Omitido do D.O.Rio do dia 30/04/2020)

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo: Nº 40/100.143/2020.
Identificação do Instrumento: 2º Termo Aditivo nº 11/2020.
Data da assinatura: 30/04/2020.
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e P C EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - ME.
Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato nº 17/2018, serviços de motomensageiro.
PRAZO: 12 meses, de 02/05/2020 a 01/05/2021.
Valor: R\$ 162.000,00
Empenho: n.º 173 de 30/04/2020, no valor de R\$ 107.550,00.
Programa de Trabalho: 2101.01.032.0004.2051.
Natureza da Despesa: 33.90.39.13.
Fundamento do Instrumento: Artigo 57 da Lei Fed. nº 8.666/93 e autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente na peça P049 do processo instrutivo, publicada no D.O. RIO nº 35 de 30/04/2020.

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO


EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo: Nº 40/100.256/2019.
Identificação do Instrumento: 4º Termo Aditivo nº 05/2020.
Data da assinatura: 12/03/2020.
Partes: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Objeto: Prorrogação de prazo do Contrato nº 05/2015, serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) e conectividade sem fio para acesso à Internet (modens USB).
PRAZO: 02 (dois) meses, de 13/03/2020 a 12/05/2020.
Valor: R\$ 17.171,74
Empenho: n.º 142 de 11/03/2020, no valor de R\$ 17.171,74.
Programa de Trabalho: 2101.01.032.0004.2051.
Natureza da Despesa: 33.90.39.26
Fundamento do Instrumento: Artigo 57, parágrafo 4º, da Lei nº 8.666/93 e autorização do Exmo. Sr. Conselheiro-Presidente à peça P112 do processo instrutivo, publicada no D.O. RIO nº 241 de 11/03/2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

Processo Instrutivo nº: 09/004.898/18
Contrato nº: 047/2020
Data da Assinatura: 06/04/2020
Partes: PCRJ / SMS e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO / INSTITUTO DE PSIQUIATRIA.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo, formalizar a contratação dos serviços de saúde destinados a garantia da integralidade e acesso à saúde dos usuários SUS do Município do Rio de Janeiro, conforme especificações no Documento descritivo.
Vigência: O presente contrato vigorará pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura.
Valor Anual: R\$ 6.751.988,32
Fundamento: Art. 8º, IV, do Anexo 2, do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 02 de 28/09/2017 e Artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como o decidido no Processo nº.09/004.898/18



Elimine os focos do *Aedes aegypti* na sua casa e ajude a evitar a dengue, zika e chikungunya.

#FaçaSuaParte

**AQUI MOSQUITO
NÃO SE CRIA**



02/12/000014/2019 - CARLOS ALBERTO MULLER
Passe-se Alvará

02/12/000119/2019 - VALENTE EMPREENDIMENTOS 31 SPE LTDA
Passe-se Alvará

02/270007/2017 - CYRELA TOLTECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Passe-se Alvará

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO
COORDENADORIA DE REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA
GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS

ERRATA D.O. Nº 41 DE 08/05/2020, PÁGINA 49 Onde se lê: 06/700684/2020 - OFÍCIO IHC/SUBH/CGTI/CRUG/ GRL Nº 91/2020 leia-se: 06/700684/2020 - OFÍCIO IHC/SUBH /CGTI/CRUG/ GRL Nº 91/2020

SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
COMUNICAÇÃO DE INÍCIO Nº 005 DE 27 DE MARÇO DE 2020

FIRMA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
TÍTULO: "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA APA - PROGRAMA PAVIMENTA RIO"
VALOR: R\$ 36.091.144,98 (trinta e seis milhões noventa e um mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
INÍCIO: 28/04/2020
TÉRMINO: 24/10/2020
PROCESSO: 06/300.120/2020

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
EXPEDIENTE DE 07/05/2020
CONVOCAÇÃO Nº 030/2020

Ao: CONSÓRCIO JARDIM MARAVILHA

Processo nº 06/600.977/2013 - Contrato nº 033/2014

Prezados Senhores, a Fiscalização do contrato em questão, no uso de suas atribuições, vem por meio deste solicitar que o CONSÓRCIO JARDIM MARAVILHA, seja CONVOCADO, para no prazo de 72 horas a partir da publicação desta, comparecer na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS, sediada na Rua Voluntários da Pátria 169 - 2º andar - Botafogo, para ciência e providências do contido no ofício nº 644/2020 de 30 de abril de 2020 da Procuradoria Geral do Município.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RIO-ÁGUAS
DIRETORIA DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO
COMPARECER PARA CIÊNCIA
EXPEDIENTE DE 08/05/2020

26/700.471/2019 - JACKSON NOGUEIRA DO NASCIMENTO.

Agendar data e horário para comparecimento através do e-mail abaixo.
rioaguas.dan@gmail.com

EXPEDIENTE DE 11/05/2020

06/600.445/2020 - AVANÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Agendar data e horário para comparecimento através do e-mail abaixo.
rioaguas.dan@gmail.com

NOTIFICAÇÃO Nº 292/2020

REF.: Processo 06/600.438/2020 e Ofício OP/SUBPDEC 1087/2020

SENHORES PROPRIETÁRIOS, RESPONSÁVEIS OU OCUPANTES da FMP do trecho do Rio Viegas situado entre a Rua Doutor Augusto Figueiredo e a Rua Coronel Tamarindo, próximo à Rua Coronel Tamarindo número 3100 - Bangú: Tendo em vista o que dispõem os Art. 73 a 75 do RPT aprovado pelo Decreto "E" nº 3.800/70 (Código de Obras da Cidade do Rio de Janeiro) e Art. 05 do Decreto RIO Nº 44670 DE 25 DE JUNHO DE 2018, ficam NOTIFICADOS os proprietários, responsáveis ou ocupantes das construções irregulares sobre a F.M.P. (Faixa Marginal de Proteção) do Viegas no trecho citado acima, a qual está compreendida na área abrangida pelo polígono definido pelas coordenadas SAD 69 do quadro abaixo: De que as edificações que estão na FMP estão situadas em área de alto risco de desabamento e enchente, onde não são permitidas construções. E fiquem cientes de que: A construção que foi erguida totalmente ou em parte sobre a FMP do Rio Viegas deverá ser demolida pelo responsável, devendo ser removido todo o entulho, de modo que não haja carreamento de material para o leito do rio. Decorrido os prazos de processo administrativo, relativo à questão, o Poder Público poderá demolir a construção irregular e cobrar as despesas do infrator; Fica determinado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento desta para apresentação de recurso. Para o interessado visualizar a notificação na íntegra deverá ser acessado o link abaixo.
Link: <http://www.rio.rj.gov.br/web/rio-aguas/licenciamento-de-projetos-particulares-de-drenagem>

SECRETARIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E EVENTOS

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDEPI-RIO

ATA DA 27ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO.

No dia 28 de abril de 2020 foi realizada a 27ª Assembleia Extraordinária do COMDEPI, com vistas ao uso de R\$15.000,00 (quinze mil reais) do recurso do Fundo Municipal do Idoso (FMI) a ser destinado as Instituições públicas e sem fins lucrativos que possuem convênio com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), material de higiene e material de limpeza para Instituições de Longa Permanência para Idosos (LPIs) públicas e sem fins lucrativos cadastradas no COMDEPI. A proposta teve votação unânime pela maioria dos conselheiros quais sejam: Fernando Binello, Caroline Mafra, Eliana Chagas, Dayse Noval, Sandra Marques, Tiago Almeida, Maxwell Simões, Rosa Vaz e Silvia Barreto.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDEPI-RIO
ATA DA 28ª ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-COMDEPI-RIO.

No dia 04 de maio de 2020 foi realizada a 28ª Assembleia Extraordinária do COMDEPI-RIO, com vistas a deliberar sobre o uso de seiscentos mil reais (R\$600.000,00) de recurso do Fundo Municipal do Idoso (FMI) a serem destinados para: 1) compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), material de higiene e material de limpeza para Instituições de Longa Permanência para Idosos (LPIs) cadastradas no COMDEPI e 2) Aquisição de cestas básicas a serem entregues aos idosos dos projetos da SEMESQVE, por um período de três meses, que de acordo com os gestores dos mesmos, estão necessitando desta ajuda. A proposta inicial era utilizar o uso do recurso para financiar a todas as Instituições inscritas no COMDEPI, sem distinção da natureza (privadas com ou sem fins lucrativos). Porém a decisão da maioria dos conselheiros foi de contemplar somente as públicas com ou sem fins lucrativos, entendendo que, neste momento, são as que mais estão sendo penalizadas com a pandemia por não terem recursos financeiros para arcar com a compra em larga escala dos produtos mencionados acima, bem como os novos preços praticados no mercado. 4 votos contra a nova proposta: Dayse Noval, Sandra Marques, Maxwell Simões, Caroline Mafra; 3 votos a Favor: Fernando Binello, Silvia, Tiago Almeida. Sendo assim, a proposta deliberada foi: Liberação de 600.000,00 (seiscentos mil reais) para LPIs públicas e sem fins lucrativos, para compra de EPIs, material de consumo e material de higiene para 32 Instituições (exceto os Projetos e LPIs privadas que totalizam 101 inscrições) e a compra de 2.743 (duas mil setecentos e quarenta e três cestas) por três meses. Republicado por incorreção no DO Rio de 08/05/2020

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

O POSTO DE GASOLINA SOLAR DE CAMPO GRANDE LTDA - CNPJ: 09.401.042/0001-09, torna público que requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMAC, através do processo nº 14/200.729/2010, a renovação de sua Licença Municipal de Operação - LMO nº 1303/2014 para POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS, situado à Rua Barcelos Domingos, 123 - Campo Grande - Rio de Janeiro CEP: 23.080-020.

REQUERIMENTO DE LICENÇA

A MAGACHO LOPES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 21.674.564/0001-80 torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Cidade - SMAC, através do processo nº 26/510.318/2018, a Licença Municipal de Operação para operar posto de abastecimento e serviços com sistema de GNV situado na Av. das Américas, nº 7.380 - quadra B, do PAL 29430 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL

Processo instrutivo nº 07/05/000459/2017.

3º Termo Aditivo nº 13/2020 ao Contrato nº. 02/2017.

Data da assinatura: 22/03/2020.

Partes: PCRJS/ME/5ªCRE e TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA.

Objeto: Locação de veículo do tipo ônibus adaptado com motorista e 02 (dois) monitores por veículo.

Prazo: 22/03/2020 até 21/03/2021.

Valor Total: R\$ 690.056,16

Programa de Trabalho: 16.06.12.361.0315.2081

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.13

Nota de Empenho: 2020/075 no valor R\$ 115.009,36

Fundamento: Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 07/002628/2020

Contrato nº. 35/2020

Partes: PCRJS/ME e TRANNOGUEIRA COMÉRCIO E MERCADO EIRELI

Data de assinatura: 08/04/2020

Objeto: Aquisição de álcool gel, para atendimento às 11 (onze) Coordenadorias Regionais de Educação.

Prazo: 08/04/2020 até 07/10/2020

Valor Total: R\$ 8.424.000,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e quatro mil reais).

Programas de Trabalho: 16.01.12.361.0315.2213

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.02

Nota de Empenho: 2020/000868

Fundamento: Artigos 4-B e 4-H da Lei 13.979/2020, Decreto Municipal 47.263/2020 e Lei 8.666/93.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 07/007.448/2018

Instrumento: 2º Termo Aditivo nº 049/2020 ao Contrato SMIH nº 151/2019.

Data da assinatura: 06/05/2020

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMHC e ARBORIUM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP, COM A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO URBEO COMO INTERVENIENTE.

Objeto: Modificação das especificações do projeto para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

Fundamento: artigo 65, inciso I, alínea "a" c/c §1º e §2º da Lei nº 8.666/93 e no artigo 482, II, "a" e "b" do RGCAF.

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

= RETIFICAÇÃO =

PROCESSO INSTRUTIVO nº: Onde se Lê: 01/221.056/2020

Leia-se: 01/221.056/2017

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 001/2020 ao T.C. nº 151/2017

PARTES: RIOTUR e a DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA

*** Retificado por ter saído com incorreção no D.O. do dia 30/04/2020, Pág. 71, Col.03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 26/340.421/2016

Instrumento: 08º Termo Aditivo Nº 050/2020 ao Contrato Nº 68/2016

Data da assinatura: 11/05/2020

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMHC e EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.

Objeto: prorrogação de prazo por mais 90 (noventa) dias, a contar de 06/04/2020 até 04/07/2020, e readequação do cronograma físico-financeiro.

Fundamento: Art. 57, § 1º, inciso III c/c Art. 65, inciso II, alínea "c", ambos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.003.50761/79	Nome da obra 00.211 - Pavimenta Rio AP'4	Data do cadastramento 27/05/2020 17:32	Origem do cadastramento e-CAC
Data do início da obra 28/04/2020	CNAE 4211101 Construção de rodovias e ferrovias		

Situação da obra

Situação Ativa	Data 28/04/2020
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 22.713-470
Bairro DIVERSOS	Logradouro OUTROS Diversos logradouros na Área da A.P. 4	Número SN	Complemento SN

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 28/04/2020	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 360.000,00	Número do Contrato 024/2020
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------


SH

DECLARAÇÃO

RIO DE JANEIRO 08 DE JUNHO DE 2020.

Declaramos para os devidos fins e de acordo com o Art. 28, parágrafo 1º, da Instrução Normativa nº 18 - INSS de 11/05/2000, que a Empresa Dimensional Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, possui escrituração contábil e os valores ora apresentados referentes às contribuições, encontram-se devidamente contabilizados.

Atenciosamente



Dimensional Engenharia Ltda
Gloria Benevides
Diretora



Leonardo Patrício Giraldez
Contador CRC/RJ 036962/0-0
CPF 034.100.557-22

A

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encaminhamos o endosso nº 0000001 da apólice de seguro nº 061902020890407750014901, cuja autenticidade, integridade e validade jurídica deste documento em forma eletrônica, estão garantidos em conformidade com a MP nº. 2.200-2, de 24/08/2001.

Aproveitamos a oportunidade, para lhe dar as boas vindas e agradecer a sua decisão de se tornar nosso cliente. Esperamos atender plenamente as suas expectativas, colocando-nos à sua disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

TÍTULO: APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº 061902020890407750014901 - ENDOSSO Nº 0000001.

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Assinado digitalmente por:
Luis Felipe Smith de Vasconcellos

✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado



Assinado digitalmente por:
Valmir Marques Rodrigues

✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Luis Felipe Smith De Vasconcellos Nº de Série do Certificado : 3C0CB0F3A2ED1217C937667C6C6B4D8A Data e Hora Atual May 26 2020 3:
Valmir Marques Rodrigues Nº de Série do Certificado : 5A6F9170AC75E56CAB7164542FAE532F Data e Hora Atual May 26 2020 3:14PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA Nº. 061902020890407750014901 - ENDOSSO Nº 0000001.

CONTROLE INTERNO Nº. 67513

DATA DA PUBLICAÇÃO: May 26 2020 3:14PM

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901		Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO		Modalidade CONSTRUÇÃO		
DADOS DO SEGURADO					
Nome/Razão Social MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚB			CNPJ/CPF 42.498.733/0001-48		
Endereço RUA MAIA DE LACERDA		Número 167	Complemento 2º ANDAR		
Cep: 20250001	Bairro ESTÁCIO	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ		
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			CNPJ/CPF 00.299.904/0001-60		
Endereço R SETÉ DE SETEMBRO		Número 98	Complemento		
Cep: 20050002	Bairro CENTRO	Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ		
A Tokio Marine Seguradora S.A, a seguir denominada SEGURADORA, tendo em vista as declarações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo TOMADOR acima identificado, proposta esta que, servindo de base para emissão desta apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o SEGURADO, sob os termos das condições gerais e/ou especiais e demais cláusulas expressamente convencionadas, insertas na presente ou em seus anexos, as obrigações assumidas pelo TOMADOR, até o limite dos valores da garantia a seguir especificados.					
GARANTIAS : TOTAL DO VALOR DA GARANTIA : R\$ 721.823,00 VIGÊNCIA : DAS 24h00 DO DIA : 13/04/2020 ATÉ AS 24h00 DO DIA : 13/12/2021 Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes anexos : 1) Demonstrativo de Prêmio. 2) Condições Particulares. 3) Condições Especiais. 4) Condições Gerais.					
OBSERVAÇÕES: - A garantia dada por este seguro extinguir-se-á quando o término da vigência expressa nesta apólice, salvo se houver prorrogação por meio de endosso. - Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br ; - Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87 - As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela Tokio Marine Seguradora S.A junto a SUSEP* poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br , de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta apólice / endosso. * SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. - Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 21 8484 (de segunda a sexta, das 09h30 às 17h00).					
CORRETOR					
Nome/Razão Social CONSET ADMINISTRACAO E CORRETA		Código Interno 004770		Registro Susep 10.0347906	

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

Em testemunho de que, a SEGURADORA, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, aos 26 dias do mês de Maio de 2020.

Seguradora Tokio Marine Seguradora S.A
Endereço Rua Sampaio Viana, 44 Sobre Loja
CNPJ : 33.164.021/0001-00
Capital Vinculado R\$ 96.000.000,00
Capital Subscrito R\$ 96.000.000,00



Assinado digitalmente por:
Luis Felipe Smith de Vasconcellos



Assinado digitalmente por:
Valmir Marques Rodrigues

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme o MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários (as):

Luis Felipe Smith De Vasconcellos Nº de Série do Certificado : 3C0CB0F3A2ED1217C937667C6C6B4D8A Data e Hora Atual May 26 2020 3:14P

Valmir Marques Rodrigues Nº de Série do Certificado : 5A6F9170AC75E56CAB7164542FAE532F Data e Hora Atual May 26 2020 3:14PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art.62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Premio Líquido	R\$ 0,00
Adicional de fracionamento	R\$ 0,00
Custo de Emissão	R\$ 0,00
I.O.F.	R\$ 0,00
Correção Monetária	R\$ 0,00

Prêmio Total R\$ 0,00

Condições de Pagamento: à vista

Taxa de Juros: 0.000%

Número de Prestações: 1

1ª Prestação R\$ R\$ 0,00

Demais Prestações R\$ R\$

Forma de Cobrança: Boleto sem Registro

Vencimentos: 19/05/2020



CONDIÇÕES PARTICULARES

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP	Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO	

A Tokio Marine Seguradora S.A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana nº 44 - Paraíso, inscrita no C.N.P.J sob o nº 33.164.021/0001-00, garante pela presente apólice, a MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, com sede na RUA MAIA DE LACERDA nº 167 - ESTÁCIO - RIO DE JANEIRO - RJ inscrito no C.N.P.J sob o nº 42.498.733/0001-48, as obrigações assumidas pela(o) DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, com sede na R SETE DE SETEMBRO nº 98 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ, inscrito no C.N.P.J sob o nº 00.299.904/0001-60, até os limites dos valores de garantia abaixo especificados.

Modalidade: CONSTRUÇÃO
Valor da Garantia: R\$ 721.823,00

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte OBJETO: Declara-se para os devidos fins e feitos que fica alterada a razão social do segurado da presente apólice conforme especificado abaixo:

Onde se lê: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SEC MUN DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Leia-se: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais condições da apólice.

OBSERVAÇÕES

- Após sete dias úteis de emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br;

- Processo SUSEP nº. 15414.900306/2014-87



Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

CLÁUSULA PARTICULAR DE RISCOS EXCLUÍDOS

1. Não estão amparados por este seguro:
 - a. Riscos ocorridos anteriormente à data de início de vigência expressa na apólice ou originários de modalidades de Seguro Garantia distintas da modalidade contratada pelo presente seguro;
 - b. Atos terroristas ou de sabotagem, rebeliões, tumultos;
 - c. Obrigações trabalhistas, ou de seguridade social, inclusive decorrentes de acidente de trabalho, exceto quando contratada cobertura específica;
 - d. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato ou quaisquer crimes praticados pelo tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;
 - e. Danos morais;
 - f. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais;
 - g. Riscos de natureza política;
 - h. Danos decorrentes de violação a direitos de propriedade industrial;
 - i. Riscos hidrológicos e/ou geológicos;
 - j. Indenizações que envolvam empregados do tomador ou de terceiros;
 - k. Riscos de energia nuclear;
 - l. Obrigações fiscais, tributos e despesas comerciais;
 - m. Multas e penalidades, exceto para contratos regidos pela Lei 8666/93.
2. Também não estão cobertos por este seguro os danos causados por atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro. Caso o segurado seja uma pessoa jurídica o presente item também se aplica aos seus sócios controladores, dirigentes e administradores legais, bem como aos beneficiários e seus respectivos representantes.
3. A Seguradora não concederá cobertura nem será responsável pelo pagamento de qualquer reclamação de indenização decorrente de riscos cobertos por outros ramos de seguros, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes, infidelidade de empregados, vida em grupo, acidentes pessoais, compreensivo empresarial, riscos de engenharia, danos acordados, etc.
4. Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pelo presente seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios/acionistas, representante, titulares ou funcionários;
5. Atos de hostilidade ou de guerra (contra inimigo estrangeiro ou guerra civil), rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade civil ou militar, de fato ou de direito, bem como todas as demais ações praticadas fora do Estado de Direito;
6. Fissão ou fusão nuclear, bem como contaminação radioativa;
7. Qualquer seguro ou indenização decorrente direta ou indiretamente de qualquer sinistro ou dano (incluindo danos indiretos) relativos à propriedade, posse, operação, controle, abastecimento ou prestação de serviços em:
 - a. Reatores nucleares, os prédios que os contêm, bem como todos os bens existentes nestes prédios;
 - b. Edificações e bens acessórios existentes no local de uma instalação de reator nuclear;
 - c. Instalações para produção de elementos combustíveis, para depósito de material físsil, para reprocessamento, recuperação, separação química, armazenamento ou eliminação de combustível nuclear irradiado ou de resíduos nucleares;
 - d. Qualquer outra instalação ou dependência definida como instalação nuclear pela legislação local ou demais normas governamentais;
 - e. Garantias sem importância segurada definida.
8. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

**MODALIDADE DE SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO,
FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONDIÇÕES ESPECIAIS**

1. Objeto

- 1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.
- 1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.
- 1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a cobertura adicional de ações trabalhistas e previdenciárias.

2. Definições

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I – Prejuízo: perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

- I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras.
- II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1, não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da Seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a expectativa de sinistro.

4.2. Reclamação: a expectativa de sinistro será convertida em reclamação, mediante comunicação pelo segurado à Seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a reclamação do sinistro.

4.2.1. Para a reclamação do sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1 das condições gerais:

- a) cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- b) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
- c) cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- d) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

4.2.2. A não formalização da reclamação do sinistro tornará sem efeito a expectativa do sinistro.

4.3. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1 e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação.

5. Ratificação

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes condições especiais.



Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

**SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO
CONDIÇÕES GERAIS**

1. Objeto

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I - processos administrativos;
- II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas condições gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as condições gerais e/ou condições especiais, de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na apólice de seguro garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a Seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
- 2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.
- 2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
- 2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação

- 3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.
- 3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
- 3.3. A Seguradora terá o prazo de quinze dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.
- 3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.
- 3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.
- 3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de quinze dias previsto no item 3.3 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.
- 3.4. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.
- 3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.
- 3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
- 3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até quinze dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

40

CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de cinco dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência

6.1. Para as modalidades do seguro garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas condições especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas condições especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro

7.1. A expectativa, reclamação e caracterização do sinistro serão especificadas para cada modalidade nas condições especiais, quando couberem.

7.2. A Seguradora descreverá nas condições especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da reclamação de sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A reclamação de sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da cláusula 17 destas condições gerais.

CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização

8.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

- I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
- II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de trinta dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de trinta dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da cláusula 8 destas condições gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

43



CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP	Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO	

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

IV – atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – o segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – se o segurado agravar intencionalmente o risco.

12. Concorrência de Garantias

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices

É vedada a utilização de mais de um seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3 destas condições gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a Seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas condições especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n.º 8.666/1993, e sua extinção se

CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n.º 8.666/93.

15. Rescisão Contratual

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da Seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada
sobre a vigência original
para obtenção de prazo em dias % Do Prêmio

15/365	13
30/365	20
45/365	27
60/365	30
75/365	37
90/365	40
105/365	46
120/365	50
135/365	56
150/365	60
165/365	66
180/365	70
195/365	73
210/365	75
225/365	78
240/365	80
255/365	83
270/365	85
285/365	88
300/365	90
315/365	93
330/365	95
345/365	98
365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2, deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas condições contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP		Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO		

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro

As questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas condições especiais e/ou particulares da apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Seguradora.

CLÁUSULA PARTICULAR DE EXCLUSÃO PARA SITUAÇÕES NACIONAIS OU INTERNACIONAIS DE SANÇÃO, EMBARGO, PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO

1. Essa apólice exclui cobertura para pessoas, países e/ou situações que estejam enquadradas na sanção, embargo, proibição ou restrição previstas nas resoluções da Organização das Nações Unidas e também por sanção, embargo, proibição ou restrição comercial ou econômica da União Europeia, Reino Unido ou Estados Unidos da América, ainda que tal restrição tenha sido incluída nas listas após a contratação do seguro, conforme as listas abaixo:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

2. Considera-se a data da ocorrência do sinistro como o fato gerador para determinar o risco excluído sob o efeito desta cláusula.



CONDIÇÕES GERAIS

Sucursal Emissora 8904-CORPORATE SP	Apólice nº 061902020890407750014901	Endosso nº 0000001	Proposta Nº 30077783
--	--	-----------------------	-------------------------

Grupo RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO	Modalidade CONSTRUÇÃO
-----------------------------	--	--------------------------

2.1. Se o segurado passar a integrar em uma ou mais listas citadas no item 1 desta cláusula, após a data de ocorrência do sinistro, fica estabelecido que:

- a) perderá o direito a indenização se for caracterizada o ato doloso do segurado ou do seu representante e nexos causal com o evento gerador do sinistro; ou
- b) terá o direito à indenização suspenso até que haja a superação do embargo ou sanção pelo órgão internacional que impôs ou eventual solução judicial;

3. Permanecem em vigor as demais condições deste seguro que não tenham sido expressamente alteradas ou revogadas pela presente cláusula.

43

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO


SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.

PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

SERVIÇOS REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/04/2020 A 13/05/2020

NOME	FUNÇÃO
Adenilson Silva Reis Candido	Servente
Adriano da Silva Moutta	Servente
Adriano Oliveira da Silva	Motorista de Caminhão I
Airton Goncalves dos Santos	Encarregado Administrativo III
Alecio Guimaraes	Estagiário
Alexssande Silva Barreto de Freitas	Vigia
Anderson da Silva Vieira	Operador de Acabadora I
Andre da Silva Ribeiro	Motorista de Caminhão I
Antonio Henrique Neto	Servente
Artur Alberto Paula Da Silva	Operador de Rolo Compactador
Breno Marques da Silva	Servente
Bruno Miranda dos Santos	Operador de Máquinas Pesadas I
Caio Marcio Joia da Silva	Vigia
Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho	Servente
Carlos Eduardo Santos do Carmo	Operador de Espargidor
Carlos Henrique de Castilho da Costa	Operador de Rolo Compactador
Celso Alves da Costa	Operador de Fresadora II
Cristiano Cimini Gualberto	Rastilheiro
Cristiano Nascimento Da Silva	Motorista de Caminhão I
Denis Bezerra da Silva	Apontador
Devayr Pedro Luciano	Vigia
Diogo Emanuel Bezerra Da Silva	Servente
Edson Franklin Ferreira	Operador de Pá Mecânica
Everson Evangelista do Rego	Motorista de Caminhão I
Fabio Henrique Fernandes	Sinaleiro
Fernando Jose Azevedo dos Santos	Arquiteto
Flavio Ker Lacerda	Operador de Usina I
Francisco Joaquim Pereira	Encarregado de Pavimentação I
Geroncio de Jesus Cardial	Rastilheiro
Givanildo Santos Andrade	Apontador
Glaucio Dias Guimaraes Manco	Servente
Guilherme Dias de Oliveira	Servente
Higor Souza Muniz	Servente
Hugo Ricardo Leite Vieira	Servente
Jesse Nascimento de Oliveira	Motorista de Caminhão I
João Santos Gonçalves Barbosa	Servente
Joel dos Santos da Costa	Servente
Jorge Henrique de Aquino Duarte	Motorista de Caminhão I
Jorge Luiz de Barros Tortura	Motorista de Caminhão I
Jose Francisco do Carmo	Rastilheiro
Jose Pinheiro	Eletricista I
Jose Renato Maia Tavares	Engenheiro Civil
Juarez Almeida Goncalves Junior	Assistente Administrativo I
Julio Cesar Silva dos Santos	Rastilheiro
Julio Cesar Vieira de Paula	Motorista de Caminhão Espargidor
Leonardo Ferreira Francisco	Operador de Rolo Compactador
Luis Carlos Suarez Y Pereira	Motorista de Caminhão I
Luiz Alberto Lemos Correa	Operador de Rolo Compactador
Luiz Claudio Ferrari Campos	Servente
Luiz Henrique Costa da Silva	Servente
Magno Santos da Silva	Operador de Rolo Compactador
Marcelo Barbosa Ribeiro	Encarregado de Usina III
Marcelo Chafim de Araujo	Motorista de Caminhão I
Marcelo Marcos de Farias Britto	Rastilheiro



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.

PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

SERVIÇOS REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 28/04/2020 A 13/05/2020

NOME	FUNÇÃO
Marcio da Silva de Souza	Servente
Marcio Monteiro de Araujo	Operador de Espargidor
Marcio Ribeiro Bento	Servente
Marcos Soares do Nascimento	Motorista de Caminhão I
Marcos Vinicius Singello Patrocinio	Auxiliar de Engenharia
Matheus Cordeiro Soares Silva	Servente
Matheus Gomes Mariano	Servente
Naassom Moura Navega	Operador de Bob Cat
Osvaldo Manoel Rodrigues Da Silva	Motorista de Caminhão I
Osvaldo Pecanha Sobrinho	Engenheiro Civil
Patrick de Medeiros Brito	Operador de Fresadora I
Paulo Roberto Silva Sathler	Operador de Bob Cat
Rafael Martins da Silva	Servente
Rafael Romao Rosa	Vigia
Reinaldo Martins Lemos	Soldador
Reinaldo Rangel Soares	Vigia
Renan Firmino Da Silva	Servente
Renato Oliveira de Azevedo Silva	Laboratorista
Renato Pereira	Operador de Acabadora I
Ricardo Santos da Costa	Servente
Roberto Carlos de Oliveira	Rastilheiro
Roberto Cordeiro	Encarregado de Pavimentação I
Rogério Martins	Motorista de Caminhão I
Ronaldo Alves da Costa	Servente
Samuel de Paula Santos	Servente
Samuel Marcos Alves	Servente
Sandro Leandro Batista de Mattos	Motorista de Caminhão I
Silas Gomes dos Santos	Motorista de Caminhão Espargidor
Thiago Lucindo Ferreira	Auxiliar de Laboratório
Tiago Oliveira da Silva	Servente
Valdir dos Santos	Motorista de Caminhão I
Victor Varela Saluzi	Estagiário
Victor Hugo Marques da Silva	Motorista de Caminhão I
Wallace Armando De Campos Pessoa	Motorista de Caminhão I
Wallace Martins Bispo Santos	Motorista de Caminhão I
Weverson da Silva Luiz	Vigia
Willians Goncalves Martins	Servente
Winder Diego Pereira	Técnico em Segurança no Trabalho

DIMENSIONAL ENGENHARIA
Edson Roberto
PAINTEIRO
CRISTÓBAL

Rio de Janeiro, 08 de JUNHO de 2020.

PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: "SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO".
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: REF.: 01ª MEDICÃO – 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERÍODO DE 28/04/2020 a 13/05/2020

Prezado Senhor,

Declaramos, para fins de comprovação junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que a **EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, Estado Rio de Janeiro, **RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 98 - GRUPO 605 - RIO DE JANEIRO**, INSCRITA NO CNPJ Nº **CNPJ Nº. 00.299.904/0001-60 INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 85.438.735** em face do **Contrato n.º 024/2020**, firmado com esta Prefeitura em **28/04/2020**, não possui empregados relativamente ao meses de **MARÇO E ABRIL de 2020**, vinculados a esta obra e, portanto, não se faz necessário o recolhimento dos documentos fiscais relativo ao mês citado.

Informamos ainda, que os recolhimentos se iniciaram em **Maior 2020**, vinculados ao **CEI – Nº 90.003.50761/79**.

Atenciosamente,



Dimensional Engenharia Ltda.

Edson Macedo
Administrativo
07570270-4 IPR

46



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2020 - 11:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089807A3756519
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

AUTENTICAÇÃO DE NOTAS
Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução do documento que me foi apresentado.
Autenticação: R\$ 2,46
Proc. dados: R\$ 6,00
Total: R\$ 8,46
Selo: EDLP79982-JQM
Consulte em <http://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

24º OFÍCIO DE NOTAS
Autenticação de Notas
Substituta do Tabelião

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 696,87	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13,93
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten mark

 <p>bradesco net empresa</p>	<p>Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 05/06/2020 Nº Controle: 138.796.242.672.897.096 Autenticação Bancária: 052.606.745</p>										
<p>Conta de débito: Agência: 3428 Conta: 28521-8 Tipo: Conta-Corrente Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60</p>											
<p>Código de barras: 85800000000-3 13930180200-0 60764120000-0 02999040001-6 Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 000299904 CNPJ/CEI: Cod. convênio: 0180 Competência: 05/2020 Data de validade: 07/06/2020 Data de débito: 05/06/2020 Valor do pagamento: R\$ 13,93</p>											
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 3428, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.</p>											
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p style="text-align: center;">iywDRUaV @Y50LNsm Zuc2*UJT hdzf74Ur V6#WrQBp xhq1Bcvq bGJZxYyd u5Ln9Z5T a*DEiWYa QENFu7II *Dikbt*m @yzBbM8A kj?isrpz @b@yvBra LXdfqtBQ JBDBLY6u @WFKZU1H rw7Hb2KZ eEbb@BnY 3Rhr9Y6u @PFYkwn1 kwUTIwD5 00500520 00030013</p>											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td> <td style="width: 25%;">Alô Bradesco 0800 704 8383</td> <td style="width: 25%;">Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td> <td style="width: 25%;">Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">Demais telefones consulte o site Fale Conosco</td> </tr> <tr> <td>Ouvidoria</td> <td colspan="4">0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td> </tr> </table>		SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco	Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco							
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.										



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2020 - 11:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 809.732,51	06-QTDE TRABALHADORES 252	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.778,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.778,60
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40



24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AG756518
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

AUTENTICAÇÃO 30/06/2020

Certifico e dou fé que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original.
Autenticacao: R\$ 2,46
Proc. dados: R\$ 6,00
Total: R\$ 8,46

Lucia Motra de Queiroz

Substituta do Tabelião

Selo: EDLP79981-QYX

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



AUTENTICAÇÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 809.732,51	06-QTDE TRABALHADORES 252	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.778,60	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.778,60
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



hs

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 05/06/2020

Nº Controle: 138.796.242.672.897.096 | Autenticação Bancária: 052.606.750

Conta de débito: **Agência: 3428 | Conta: 28521-8 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60**Código de barras: **85840000647-5 78600180200-5 60764120080-9 02999040001-6**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **800299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **05/2020**Data de validade: **07/06/2020**Data de débito: **05/06/2020**Valor do pagamento: **R\$ 64.778,60**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **3428**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

HEHYSPEp mX*SrNzR TMdt@D9f IdN8Q6jB ZAuuMonr tBQJrDEP PepmfqwQ s2#VbJL9
 jxtqWctW yLKAJryk 94y6Co3m QnCl@NI2 oNRQowbp Em6jYniT gXPcyRkR P4@ridCi
 SeXoyQb* QIKTNeYl tWL5ps99 #tuQ5wVh zH@tJSl7 uqkU9QCx 00500520 004700.7

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.




Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2020	Data de Vencimento 19/06/2020	Número do Documento 07.16.20171.8216219-8	Pagar este documento até 19/06/2020
Observações Nº Recibo Declaração: 50000002323130			Valor Total do Documento 301.680,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	72.809,70			72.809,70
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	2.684,44			2.684,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	64.986,70			64.986,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	5.460,63			5.460,63
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	484,78			484,78
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	9.388,30			9.388,30
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.123,33			8.123,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA	649,86			649,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI	1.624,66			1.624,66
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	2.437,00			2.437,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	1.949,60			1.949,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.218.63534/72	2.235,96			2.235,96
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.218.63534/72	323,01			323,01



85890003016 2 80060385201 8 71071620171 4 82162198337 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890003016 2	80060385201 8	71071620171 4	82162198337 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 00.299.904/0001-60
Número: 07.16.20171.8216219-8
Pagar até: 19/06/2020
Valor: 301.680,06

19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	279,49			279,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.218.63534/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,35			22,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.218.63534/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	55,89			55,89
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.218.63534/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	83,84			83,84
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.218.63534/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	67,07			67,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.218.63534/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.422,64			8.422,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.224.48239/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.216,77			1.216,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.224.48239/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.052,83			1.052,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.224.48239/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	84,22			84,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.224.48239/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	210,56			210,56
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.224.48239/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	315,84			315,84
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.224.48239/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	252,67			252,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.224.48239/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	11.095,11			11.095,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.227.25318/74				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	973,70			973,70
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	CNO:51.227.25318/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.029,91			2.029,91
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.227.25318/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.756,40			1.756,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.227.25318/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	140,51			140,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.227.25318/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	351,28			351,28
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.227.25318/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	526,92			526,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.227.25318/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	421,53			421,53
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.227.25318/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.840,55			1.840,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.232.08100/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	265,89			265,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.232.08100/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	230,06			230,06
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.232.08100/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,40			18,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.232.08100/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	46,01			46,01
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.232.08100/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	69,02			69,02



24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607AG756516
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

AUTENTICAÇÃO 30/06/2020

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado e autenticado o original.

Autenticação: R\$ 2,46

Proc. dados: R\$ 6,00

Total: R\$ 8,46

Selo: EDLP79979-HBR

Substituta do Tabelião

Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



AUTENTICAÇÃO

30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.232.08100/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.232.08100/72	55,21			55,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.46065/72	2.086,89			2.086,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.46065/72	301,48			301,48
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.46065/72	260,86			260,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.46065/72	20,86			20,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.46065/72	52,17			52,17
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.46065/72	78,25			78,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.46065/72	62,60			62,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.234.49577/77	671,67			671,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.234.49577/77	97,03			97,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.234.49577/77	83,95			83,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.234.49577/77	6,71			6,71



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.234.49577/77	16,79			16,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.234.49577/77	25,18			25,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.234.49577/77	20,15			20,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.244.31185/78	10.313,06			10.313,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.31185/78	1.489,87			1.489,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.244.31185/78	1.289,13			1.289,13
1176	CP TERCEIROS - IN CRA 01 CP TERCEIROS - IN CRA CNO:51.244.31185/78	103,13			103,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.244.31185/78	257,82			257,82
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.244.31185/78	386,73			386,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.244.31185/78	309,39			309,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04590/73	3.966,55			3.966,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04590/73	573,02			573,02
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	495,81			495,81

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A3756515
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

AUTENTICAÇÃO 30/06/2020
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Autenticacao: R\$ 2,46
Proc. dados: R\$ 6,00
Total: R\$ 8,46

24º OFÍCIO DE NOTAS
Ana Lucia Motta de Queiros
Selo: EDLP79978-PSV
Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/portal>

AUTENTICAÇÃO

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,66			39,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	99,16			99,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04590/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	148,74			148,74
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04590/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	118,99			118,99
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04590/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	959,39			959,39
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	138,59			138,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.000.04592/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	119,92			119,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.000.04592/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,59			9,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.000.04592/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	23,98			23,98
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.000.04592/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.000.04592/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	28,78			28,78
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.000.04592/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.147,91			6.147,91
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.002.72193/72				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	125,76			125,76



Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.002.72193/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.002.72193/72	888,15			888,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.72193/72	768,48			768,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.72193/72	61,47			61,47
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.72193/72	153,69			153,69
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.72193/72	230,54			230,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.72193/72	184,43			184,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.50761/79	45.871,48			45.871,48
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT CNO:90.003.50761/79	451,08			451,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.50761/79	6.626,82			6.626,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.50761/79	5.733,93			5.733,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.50761/79	458,71			458,71
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.50761/79	1.146,78			1.146,78

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto 089607A03756514
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21)3553-6021

AUTENTICAÇÃO 30/06/2020
 Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução fiel do documento que me foi apresentado, sendo o original.

Autenticação: R\$ 2,46
 Proc. dados: R\$ 6,00
 Total: R\$ 8,46

Selo: EDLP79977-OUT
 Substituta do Tabelião

Consulte em <https://www3.trj.jus.br/sitepublico>




52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.50761/79	1.720,18			1.720,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.50761/79	1.376,14			1.376,14
	Totais	301.680,06			301.680,06

	Data da Transação: 19/06/2020 Nº Controle: 543.655.405.684.563.166 Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60 Agência de Débito: 3428 Conta de Débito: 28521-8			
	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO			
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858900030162 800603852018 710716201714 821621983377 Data do Pagamento: 19/06/2020 Número do Documento: 0716201718216219-8 Valor Total: R\$ 301.680,06 Autenticação Bancária: 064.536.645 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA , junto à Agência 3428, na data de pagamento.				
Autenticação				
xzay90cE 9XNXeUOA JrrysR3A dEVeT3ot QkH?Kz05 mj2cbZth 3*t?ktbL JVH9JQq6 o*yjC7mF sZUxxM2Z 8tsLGrDl xroNArJW 5w2Z*D4Y tMOjZX5A ULKHDMz* HhACd98w M@xGcQyv ZbijELnx um@#ypwt 4xbkhMCK HROPbC6B v6sUVP24 00531920 000.001.				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



59

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:00299904000160 ,

Seu arquivo Jzl2aoBGgKJ00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/06/2020 às 11:05:43.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D80670A95BC5D525..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: FILIPE SA BARRETO CARCELER:05798750752
Inscrição Transmissor: 057.987.507-52

Responsável: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Inscrição Responsável: 00.299.904/0001-60
Competência: 05/2020
NRA: Jzl2aoBGgKJ00008
Base de Processamento: RJ - Rio de Janeiro
Código de Recolhimento: 155
Contato: VANESSA NEVES
Telefone: 002122521341

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

04

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: Dimensional Engenharia Ltda
 COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPEL: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: 00211 Pavimenta Rio AP4 N° CONTROLE: PDWPrnWT2d0000-4
 LOGRADOURO: Rua Sete De Setembro 98 SALA 605 BAIRRO: Centro
 CIDADE: Rio De Janeiro UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021-22521341 CNAE: 4222701
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	23.514,09	0,00	0,00	0,00	23.514,09
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	54.013,95	0,00	0,00	0,00	54.013,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	7.778,00	0,00	0,00	0,00	7.778,00
RAT - Agentes Nociuos	451,08	0,00	0,00	0,00	451,08
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	85.465,40	0,00	0,00	0,00	85.465,40
OUTRAS ENTIDADES	15.664,04	0,00	0,00	0,00	15.664,04
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	15.664,04	0,00	0,00	0,00	15.664,04
TOTAL A RECOLHER	101.129,44	0,00	0,00	0,00	101.129,44

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016
 858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
 COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRIÇÃO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
VALDIR DOS SANTOS	0,00	0,00	108.06552.57-0 0,00	15/01/2014 0,00	01	0,00	23/08/2016 P1	0,00
GUILHERME DIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	161.84644.43-3 0,00	12/06/2014 0,00	01	0,00	04/08/2014 P1	0,00
ADRIANO DA SILVA MOUTTA	1.848,15	0,00	122.74872.77-7 0,00	11/03/2020 150,65	01	147,86		07170 0,00
AIRTON GONCALVES DOS SANTOS	5.592,93	0,00	107.85252.52-2 0,00	14/10/2009 641,94	01	447,44		04101 0,00
ALEXANDRE DA CONCEICAO MARQUES	1.508,35	0,00	180.87178.29-2 0,00	09/03/2017 120,07	01	120,66		07170 0,00
ALEXSSANDE SILVA BARRETO DE FREITAS	1.877,55	0,00	212.15970.06-6 0,00	20/07/2015 153,29	01	05 150,20		05174 0,00
ANTONIO HENRIQUE NETO	2.064,76	0,00	124.69458.09-0 0,00	17/03/2020 170,14	01	165,19		07170 0,00
BRENO MARQUES DA SILVA	2.011,40	0,00	161.24195.67-5 0,00	11/03/2020 165,34	01	160,91		07170 0,00
CARLOS ANTONIO DA FONSECA	2.074,72	0,00	123.33915.29-5 0,00	06/07/2012 171,04	01	165,98		07152 0,00
CELSO ALVES DA COSTA	3.629,29	0,00	124.37726.32-4 0,00	16/03/2020 367,03	01	290,35		07151 0,00
CLEZIVALDO SANTOS FREITAS	1.900,52	0,00	190.50680.07-3 0,00	04/02/2019 155,36	01	152,04		04110 0,00
DENIS BEZERRA DA SILVA	4.666,57	0,00	128.72130.18-9 0,00	16/06/2014 512,25	01	373,32		04142 0,00
FABRICIO AURELIO DA SILVA BARROS	2.074,72	0,00	127.33024.54-1 0,00	21/03/2018 171,04	01	165,98		07152 0,00
FERNANDO JOSE AZEVEDO DOS SANTOS	10.115,06	0,00	128.93463.60-8 0,00	08/04/2008 713,08	01	809,20		02141 0,00
FLAVIO KER LACERDA	3.507,13	0,00	131.13705.62-1 0,00	11/03/2020 349,93	01	280,57		07212 0,00
GILBERTO AUGUSTO FERRO COSTA ASSUMPCAO	10.115,06	0,00	124.34299.44-1 0,00	04/05/2009 713,08	01	809,21		02149 0,00
GIVANILDO SANTOS ANDRADE	3.939,35	0,00	128.17881.76-3 0,00	14/03/2016 410,44	01	315,15		04142 0,00
IVANILZA NUNES DOS SANTOS	1.491,44	0,00	127.22128.56-1 0,00	13/07/2011 118,54	01	119,32		05142 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 785001802005 607641200809 029990400016
 858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60
 COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 TOMADOR/OBRA:00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
JOAO SANTOS GONCALVES BARBOSA	1.834,56	0,00	206.55546.13-2 0,00	17/03/2020 149,43	01	146,76	07170 0,00
JOEL DOS SANTOS DA COSTA	1.856,34	0,00	131.62786.56-7 0,00	13/03/2020 151,39	01	148,50	07170 0,00
JORGE HENRIQUE DE AQUINO DUARTE	2.395,18	0,00	130.63804.56-7 0,00	16/03/2020 209,04	01	191,61	07825 0,00
JOSE PINHEIRO	2.667,03	0,00	108.04227.05-2 0,00	19/03/2020 241,67	01	213,37	07156 0,00
JOSE RENATO MAIA TAVARES	10.115,06	0,00	123.71399.71-1 0,00	24/04/2012 713,08	01	809,21	02142 0,00
LUIZ CLAUDIO FERRARI CAMPOS	1.949,75	0,00	125.37720.80-8 0,00	11/03/2020 159,79	01	155,99	07170 0,00
LUIZ HENRIQUE COSTA DA SILVA	1.824,23	0,00	163.80689.12-6 0,00	17/03/2020 148,50	01	145,93	07170 0,00
MARCELO BARBOSA RIBEIRO	7.518,05	0,00	124.13230.57-4 0,00	13/09/2010 713,08	01	04 601,45	07201 0,00
MARCELO VIDAL DE NEGREIROS	2.074,72	0,00	124.05670.04-8 0,00	01/11/2002 171,04	01	165,98	07152 0,00
MARCIO DA SILVA DE SOUZA	1.994,54	0,00	228.20071.70-7 0,00	17/03/2020 163,82	01	159,56	07170 0,00
MARCOS VINICIUS SINGELLO PATROCINIO	2.844,56	0,00	136.24918.76-0 0,00	28/04/2016 262,97	01	227,56	03121 0,00
NAASSOM MOURA NAVEGA	2.866,90	0,00	182.21090.47-1 0,00	13/03/2020 265,65	01	229,35	07151 0,00
OSVALDO PECANHA SOBRINHO	11.179,80	0,00	122.79476.13-6 0,00	04/09/2009 713,08	01	894,39	02142 0,00
PATRICK DE MEDEIROS BRITO	3.248,97	0,00	127.48446.58-7 0,00	17/03/2020 313,78	01	259,92	07151 0,00
PEDRO IVO BASILIO ALVES	2.722,23	0,00	131.97016.52-0 0,00	01/06/2011 248,29	01	217,77	03516 0,00
PHILLIP DE OLIVEIRA PINHEIRO	1.900,52	0,00	190.43802.98-3 0,00	19/05/2014 155,36	01	152,04	04110 0,00
RAFAEL DA ANUNCIACAO BARROS	3.148,47	0,00	129.97012.56-4 0,00	15/09/2014 299,71	01	251,87	03121 0,00
REINALDO MARTINS LEMOS	2.875,22	0,00	130.24131.60-3 0,00	13/03/2020 266,65	01	230,01	07243 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 786001802006 607641200809 029990400016
 858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60
 COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
REINALDO RANGEL SOARES	2.191,51	0,00	107.90328.55-8 0,00	02/02/2009 184,60	01	175,33	05174 0,00
RENAN FIRMINO DA SILVA	2.058,28	0,00	209.04234.40-6 0,00	17/03/2020 169,56	01	164,66	07170 0,00
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA	2.667,95	0,00	129.29353.54-8 0,00	19/03/2020 241,78	01	213,43	03011 0,00
RICARDO SANTOS DA COSTA	1.981,81	0,00	131.54140.60-2 0,00	13/03/2020 162,68	01	158,54	07170 0,00
ROGERIO MARTINS	2.440,16	0,00	107.32770.01-4 0,00	16/03/2020 214,44	01	195,22	07825 0,00
ROMARIO NUNES GOMES DA SILVA	1.503,25	0,00	165.54046.93-4 0,00	07/12/2018 119,61	01	120,26	07170 0,00
ROMILDO HERMINIO DOS SANTOS	1.503,25	0,00	124.49836.54-5 0,00	11/02/2014 119,61	01	120,27	07170 0,00
SAMUEL JOSE ACIOLI	4.496,02	0,00	123.49206.84-1 0,00	10/08/2009 488,37	01	359,69	07102 0,00
SANDRO LEANDRO BATISTA DE MATTOS	2.311,14	0,00	129.17033.09-8 0,00	16/03/2020 198,96	01	184,89	07825 0,00
TIAGO OLIVEIRA DA SILVA	1.809,34	0,00	236.06997.90-2 0,00	16/03/2020 147,16	01	144,74	07170 0,00
VINICIUS MARTINGIL PEREIRA	4.199,08	0,00	131.99557.54-5 0,00	14/09/2009 446,80	01	335,92	03516 0,00
WINDER DIEGO PEREIRA	4.131,67	0,00	130.55703.60-9 0,00	16/05/2011 437,36	01	330,53	03516 0,00
ADENILSON SILVA REIS CANDIDO	1.673,18	0,00	133.74430.56-1 0,00	27/04/2020 134,90	04	133,85	07170 0,00
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA	2.546,31	0,00	126.23054.54-3 0,00	25/02/2019 227,18	04	203,71	07825 0,00
ANDERSON DA SILVA VIEIRA	2.850,88	0,00	127.05181.24-7 0,00	20/04/2020 263,73	04	228,08	07112 0,00
ANDRE DA SILVA RIBEIRO	2.532,68	0,00	124.67194.12-6 0,00	26/02/2018 225,56	04	202,62	07825 0,00
BRUNO MIRANDA DOS SANTOS	2.431,98	0,00	201.29724.93-3 0,00	20/04/2020 213,46	04	194,55	07151 0,00
CAIO MARCIO JOIA DA SILVA	253,52	0,00	124.37749.24-3 0,00	06/05/2020 19,01	04	20,29	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016
 858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA							INSCRIÇÃO:	00.299.904/0001-60									
COMP:	05/2020	COD REC:	155	COD GPS:	2208	FPAS:	507	OUTRAS ENT:	0079	SIMPLES:	1	RAT:	3,0	FAP:	0,96	RAT AJUSTADO:	2,88
TOMADOR/OBRA:00211 PAVIMENTA RIO AP4							INSCRIÇÃO:	900035076179									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	OCBO	JAM							
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA													
			BASE CÁL PREV SOCIAL														
CARLOS EDUARDO SANTOS DO CARMO	2.853,95	0,00	165.23428.89-4	25/03/2020	04			228,31		07151							
			0,00	264,10						0,00							
CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA CARVALHO	1.752,86	0,00	212.89841.24-3	27/04/2020	04			140,22		07170							
			0,00	142,07						0,00							
CARLOS HENRIQUE DE CASTILHO DA COSTA	1.789,18	0,00	133.29643.54-3	13/05/2020	04			143,13		07151							
			0,00	145,34						0,00							
CRISTIANO CIMINI GUALBERTO	2.191,37	0,00	164.95333.18-9	25/03/2020	04			175,30		07111							
			0,00	184,59						0,00							
CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA	2.808,38	0,00	127.29614.56-9	01/04/2020	04			224,68		07825							
			0,00	258,63						0,00							
DEVAYR PEDRO LUCIANO	2.123,11	0,00	122.92730.70-9	20/04/2020	04			169,85		05174							
			0,00	176,40						0,00							
DIOGO EMANUEL BEZERRA DA SILVA	2.266,53	0,00	154.17334.05-0	20/04/2020	04			181,32		07170							
			0,00	193,61						0,00							
EDSON FRANKLIN FERREIRA	2.625,81	0,00	129.42743.60-5	25/03/2020	04			210,06		07151							
			0,00	236,72						0,00							
EVERSON EVANGELISTA DO REGO	2.963,09	0,00	128.72820.62-2	25/03/2020	04			237,04		07825							
			0,00	277,19						0,00							
FABIO HENRIQUE FERNANDES	2.604,21	0,00	126.77106.14-2	27/04/2020	04			208,34		07821							
			0,00	234,13						0,00							
FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA	4.301,71	0,00	108.81753.99-5	27/04/2020	04			344,14		07102							
			0,00	461,17						0,00							
GERONCIO DE JESUS CARDIAL	2.177,82	0,00	120.22275.97-9	22/04/2020	04			174,23		07111							
			0,00	182,96						0,00							
GLAUCIO DIAS GUIMARAES MANCO	2.080,54	0,00	204.69303.81-0	27/04/2020	04			166,44		07170							
			0,00	171,56						0,00							
HIGOR SOUZA MUNIZ	1.910,09	0,00	134.02792.58-2	22/04/2020	04			152,80		07170							
			0,00	156,22						0,00							
HUGO RICARDO LEITE VIEIRA	1.673,18	0,00	165.58655.33-1	27/04/2020	04			133,85		07170							
			0,00	134,90						0,00							
JESSE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	347,17	0,00	128.10535.54-1	27/05/2020	04			27,78		07825							
			0,00	26,03						0,00							
JORGE LUIZ DE BARROS TORTURA	2.404,94	0,00	124.34438.15-8	06/05/2020	04			192,40		07825							
			0,00	210,22						0,00							
JOSE FRANCISCO DO CARMO	2.374,23	0,00	127.12799.56-0	27/04/2020	04			189,94		07111							
			0,00	206,53						0,00							

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016

858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRICAO: 00.299.904/0001-60

FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88

TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4

INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO OCBO JAM
JUAREZ ALMEIDA GONCALVES JUNIOR	1.850,81	0,00	131.61107.62-3 0,00	11/05/2020 150,89	04	148,06	04110 0,00
JULIO CESAR SILVA DOS SANTOS	2.363,78	0,00	130.25877.56-0 0,00	27/04/2020 205,28	04	189,10	07111 0,00
JULIO CESAR VIEIRA DE PAULA	2.370,55	0,00	130.29223.58-1 0,00	27/04/2020 206,09	04	189,64	07825 0,00
LEONARDO FERREIRA FRANCISCO	2.571,47	0,00	130.49898.56-8 0,00	27/04/2020 230,20	04	205,71	07151 0,00
LUIS CARLOS SUAREZ Y PEREIRA	2.211,51	0,00	124.67225.89-7 0,00	06/05/2020 187,00	04	176,93	07825 0,00
LUIZ ALBERTO LEMOS CORREA	2.582,77	0,00	106.55806.35-8 0,00	27/04/2020 231,56	04	206,63	07151 0,00
MAGNO SANTOS DA SILVA	2.388,87	0,00	128.75298.56-0 0,00	27/04/2020 208,29	04	191,10	07151 0,00
MARCELO CHAFIM DE ARAUJO	2.737,93	0,00	129.00755.58-3 0,00	25/03/2020 250,17	04	219,03	07825 0,00
MARCELO MARCOS DE FARIAS BRITTO	2.193,67	0,00	125.63691.60-7 0,00	25/03/2020 184,86	04	175,50	07111 0,00
MARCIO MONTEIRO DE ARAUJO	1.651,81	0,00	163.83169.61-1 0,00	27/04/2020 132,98	04	132,14	07151 0,00
MARCIO RIBEIRO BENTO	1.544,63	0,00	124.66974.16-0 0,00	27/04/2020 123,33	04	123,58	07170 0,00
MARCOS SOARES DO NASCIMENTO	2.682,48	0,00	108.67010.13-1 0,00	27/04/2020 243,52	04	214,60	07825 0,00
MATHEUS CORDEIRO SOARES SILVA	1.629,89	0,00	237.39372.03-2 0,00	20/04/2020 131,01	04	130,39	07170 0,00
OSVALDO MANOEL RODRIGUES DA SILVA	345,57	0,00	123.57248.21-3 0,00	27/05/2020 25,91	04	27,65	07825 0,00
PAULO ROBERTO SILVA SATHLER	3.237,40	0,00	204.70144.01-1 0,00	01/04/2020 312,17	04	258,99	07151 0,00
RAFAEL MARTINS DA SILVA	1.936,20	0,00	166.53205.23-2 0,00	27/04/2020 158,57	04	154,89	07170 0,00
RAFAEL ROMAO ROSA	928,96	0,00	156.32854.27-6 0,00	06/05/2020 69,67	04	74,31	05174 0,00
RENATO PEREIRA	2.715,16	0,00	120.77154.59-6 0,00	29/04/2020 247,44	04	217,22	07112 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016
 858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA INSCRICAO: 00.299.904/0001-60
 COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 2,88
 TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 INSCRICAO: 900035076179

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	2.367,66	0,00	124.71831.71-2 0,00	27/04/2020 205,74	04	189,42	07111 0,00
ROBERTO CORDEIRO	3.999,86	0,00	120.04622.73-5 0,00	25/03/2020 418,91	04	319,99	07102 0,00
RONALDO ALVES DA COSTA	2.057,03	0,00	125.05511.73-1 0,00	27/04/2020 169,45	04	164,57	07170 0,00
SAMUEL DE PAULA SANTOS	2.250,23	0,00	131.52274.56-3 0,00	22/04/2020 191,65	04	180,01	07170 0,00
SAMUEL MARCOS ALVES	2.007,85	0,00	207.16160.26-3 0,00	22/04/2020 165,02	04	160,62	07170 0,00
SILAS GOMES DOS SANTOS	2.394,08	0,00	124.05453.32-2 0,00	27/04/2020 208,91	04	191,53	07825 0,00
THIAGO LUCINDO FERREIRA	963,43	0,00	133.42835.56-6 0,00	19/05/2020 72,25	04	77,07	08181 0,00
VICTOR HUGO MARQUES DA SILVA	2.469,22	0,00	207.62428.25-7 0,00	29/04/2020 217,93	04	197,53	07825 0,00
WALLACE ARMANDO DE CAMPOS PESSOA	242,40	0,00	133.60928.54-6 0,00	28/05/2020 18,18	04	19,39	07825 0,00
WALLACE MARTINS BISPO SANTOS	359,42	0,00	128.34763.89-7 0,00	27/05/2020 26,95	04	28,76	07825 0,00
WEVERSON DA SILVA LUIZ	2.514,86	0,00	166.89308.29-5 0,00	20/04/2020 223,41	04	201,18	05174 0,00
WILLIANS GONCALVES MARTINS	2.236,96	0,00	134.03055.27-1 0,00	22/04/2020 190,06	04	178,95	07170 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	270.069,77	0,00	0,00	23.514,09		21.605,55	0,00

57

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400006475 786001802005 607641200809 029990400016
858000000003 139301802000 607641200000 029990400016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nº DE CONTROLE: N° ARQUIVO: Jz12aoBGgKJ0000-8
COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60
TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 Nº DE CONTROLE: PDIWPmWT2d0000-4 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 CNAE: 4222701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	46	154.726,59	0,00	154.726,59	0,00
04	54	115.343,18	0,00	115.343,18	0,00
TOTAIS:	100	270.069,77	0,00	270.069,77	0,00

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400006475 786001802005 607641200809 02999904000016
 858000000003 139301802000 607641200000 02999904000016

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
 N° ARQUIVO: Jz12aoBGgKJ0000-8
 FPAS: 507 OUTRAS ENTID:0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 05/2020
 N° CONTROLE: EEHpnNXfHMA0000-6

TOMADOR/OBRA : 00211 PAVIMENTA RIO AP4
 INSCRIÇÃO: 900035076179 N° CONTROLE: PDIWPrnWT2d0000-4
 LOGRADOURO
 BAIRRO CIDADE CEP UF
 ESTRADA DA LIGACAO SN DIVERSOS LOGRADOUROS JACAREPÁGUA RIO DE JANEIRO 22713470 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	270.069,77	270.069,77
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
DEPÓSITO		21.605,55
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL TRABALHADORES	100	100

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	270.069,77	270.069,77
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	23.514,09	21.605,55
VAL DEVIDO PREV SOC	101.129,44	0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL TRABALHADORES	100	100

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nº DE CONTROLE: JzI2aoBGgKJ0000-8
 COMP: 05/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.299.904/0001-60
 TOMADOR/OBRA: 00211 PAVIMENTA RIO AP4 Nº DE CONTROLE: PDIWPmWT2d0000-4 INSCRICAO: 900035076179

LOGRADOURO: RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4222701
 CIDADE: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20050-002 TELEFONE: 0021 2252 1341 CNAE: 4222701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	101.129,44	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	23.514,09
SALÁRIO FAMÍLIA:	291,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 7.518,05
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP8.40 (29/03/2020)

DATA: 05/06/2020
HORA: 00:00:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
COMPETÊNCIA: 05/2020

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 00.299.904/0001-60
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	252	1
REMUNERAÇÃO	809.732,51	696,87
DEPÓSITO	64.778,60	13,93
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	64.778,60	13,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	00.299.904/0001-60			0079	2100	507
32.588,97	78.953,16	18.507,21	48,62	0,00	130.000,72	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512186353472			0079	2208	507
713,08	2.557,93	648,42	0,00	0,00	3.919,43	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512244823975			0079	2208	507
3.032,18	7.263,58	1.841,29	0,00	0,00	12.137,05	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512272531874			0079	2208	507
6.071,71	17.048,33	4.074,86	0,00	0,00	27.194,90	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512320810072			0079	2208	507
754,07	2.105,58	533,75	0,00	0,00	3.393,40	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512344606572			0079	2208	507
713,08	2.387,40	605,19	0,00	0,00	3.705,67	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						

65

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020C)

DATA: 05/06/2020

HORA: 00:00:00

PÁG : 002/002

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512344957777		0079	2208	507	
329,10	768,39	194,78	0,00	1.292,27	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	512443118578		0079	2208	507	
3.896,36	9.726,02	2.465,51	0,00	16.087,89	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459073		0079	2208	507	
1.558,00	3.628,20	919,73	0,00	6.105,93	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900000459278		0079	2208	507	
419,33	1.097,54	278,22	0,00	1.795,09	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900027219372		0079	2208	507	
1.885,84	4.499,53	1.108,73	0,00	7.494,10	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						
DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	900035076179		0079	2208	507	
23.514,09	62.243,03	15.664,04	291,72	101.129,44	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA - 00.299.904/0001-60						

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP4						
007998	Adenilson Silva Reis Candido	220:00	Servente	27/04/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		12,41	51,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.673,18
0261 Intermitente Horas	I		898,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			239,03		B110 - Base IRRF Salário	1.673,18
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		91,82		B120 - Dedução IRRF Salário	134,90
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		30,61		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	134,90
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		91,82		B400 - Base FGTS Salário	1.673,18
1020 H. E. 70%	P	22:35	269,51		B410 - FGTS Salário 8%	133,85
5010 INSS				134,90	B900 - Remuneração Total Mês	898,56
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	535,59
Totais			1.673,18	134,90		
Líquido				1.538,28		
007937	Adriano da Silva Moutta	220:00	Servente	11/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.848,15
0190 DSR s/ Salário Variável		6,59	48,99		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	0:15	2,98		B110 - Base IRRF Salário	1.230,39
1040 H. E. 100%	P	17:56	251,78		B120 - Dedução IRRF Salário	150,65
5010 INSS				150,65	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	150,65
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.848,15
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	147,85
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais			1.848,15	783,85		
Líquido				1.064,30		
007867	Adriano Oliveira da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I	25/02/2019	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,50	69,70		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.546,31
0261 Intermitente Horas	I		1.415,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			363,76		B110 - Base IRRF Salário	2.546,31
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		143,60		B120 - Dedução IRRF Salário	227,19
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,87		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	227,19
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		143,60		B400 - Base FGTS Salário	2.546,31
1010 H. E. 50%	P	28:00	362,46		B410 - FGTS Salário 8%	203,70
5010 INSS				227,19	B900 - Remuneração Total Mês	1.415,32
					B905 - Salário Hora	8,63
					B920 - Base Salário Família	767,23
Totais			2.546,31	227,19		
Líquido				2.319,12		
000513	Airton Goncalves dos Santos	220:00	Encarregado Administrativo III	14/10/2009	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.592,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	5.592,93
5010 INSS				641,96	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5110 IRRF				46,52	B110 - Base IRRF Salário	3.355,76
5120 IRRF s/ Adiantamento				393,50	B120 - Dedução IRRF Salário	641,96
5310 Adiantamento Salarial				1.843,67	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	641,96
5700 Vale Transporte				55,93	B400 - Base FGTS Salário	5.592,93
					B410 - FGTS Salário 8%	447,43
					B900 - Remuneração Total Mês	5.592,93
					B903 - Salário Mês	5.592,93
Totais			5.592,93	2.981,58		
Líquido				2.611,35		
E00086	Alecio Guimaraes	150:00	Estagiário	19/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		12	640,00		B110 - Base IRRF Salário	640,00
					B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
					B903 - Salário Mês	1.600,00

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
Totais		640,00	0,00	- Admitido em 19/05/2020		
Líquido		640,00				
006213	Alexssande Silva Barreto de Freitas	180:00	Vigia	20/07/2015	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.877,55
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,32	40,96		B110 - Base IRRF Salário	1.228,11
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	118:04	212,99		B120 - Dedução IRRF Salário	153,29
5010 INSS				153,29	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	153,29
5310 Adiantamento Salarial				649,44	B400 - Base FGTS Salário	1.877,55
5700 Vale Transporte				16,24	B410 - FGTS Salário 8%	150,20
					B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
					B903 - Salário Mês	1.623,60
Totais		1.877,55	818,97			
Líquido		1.058,58				
007971	Anderson da Silva Vieira	220:00	Operador de Acabadora I	20/04/2020	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,36	103,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.850,88
0261 Intermitente Horas			1.454,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			407,27		B110 - Base IRRF Salário	2.850,88
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			150,24		B120 - Dedução IRRF Salário	263,74
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			50,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	263,74
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			150,24		B400 - Base FGTS Salário	2.850,88
1020 H. E. 70%	P	27:45	535,91		B410 - FGTS Salário 8%	228,07
5010 INSS				263,74	B900 - Remuneração Total Mês	1.454,08
					B905 - Salário Hora	11,36
					B920 - Base Salário Família	989,53
Totais		2.850,88	263,74			
Líquido		2.587,14				
007698	Andre da Silva Ribeiro	220:00	Motorista de Caminhão I	26/02/2018	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,24	62,13		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.532,68
0261 Intermitente Horas			1.396,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			361,81		B110 - Base IRRF Salário	2.532,68
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			141,89		B120 - Dedução IRRF Salário	225,56
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			47,30		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	225,56
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			141,89		B400 - Base FGTS Salário	2.532,68
0670 Premio por Tempo de Serviço			58,53		B410 - FGTS Salário 8%	202,61
1010 H. E. 50%	P	25:55	323,05		B900 - Remuneração Total Mês	1.454,61
5010 INSS				225,56	B905 - Salário Hora	8,31
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
Totais		2.532,68	225,56			
Líquido		2.307,12				
007951	Antonio Henrique Neto	220:00	Servente	17/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.064,76
0190 DSR s/ Salário Variável		11,57	83,93		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	13:26	160,31		B110 - Base IRRF Salário	1.447,00
1040 H. E. 100%	P	19:40	276,12		B120 - Dedução IRRF Salário	170,14
5010 INSS				170,14	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	170,14
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	2.064,76
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	165,18
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais		2.064,76	803,34			
Líquido		1.261,42				

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007969	Artur Alberto Paula Da Silva	220:00	Operador de Rolo Compactador	25/03/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
1510 Insuficiência de Saldo			26,90		B905 - Salário Hora	10,28
7010 Insuficiência de Saldo				26,90		
Totais			26,90	26,90		
Líquido				0,00		
007935	Breno Marques da Silva	220:00	Servente	11/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.011,40
0190 DSR s/ Salário Variável		10,44	75,32		B110 - Base IRRF Salário	1.393,64
1020 H. E. 70%	P	10:01	119,54		B120 - Dedução IRRF Salário	165,34
1040 H. E. 100%	P	19:23	272,14		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	165,34
5010 INSS				165,34	B400 - Base FGTS Salário	2.011,40
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B410 - FGTS Salário 8%	160,91
5700 Vale Transporte				15,44	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais			2.011,40	798,54		
Líquido				1.212,86		
007972	Bruno Miranda dos Santos	220:00	Operador de Máquinas Pesadas I	20/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,06	57,81		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.431,98
0261 Intermitente Horas			1.398,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			347,43		B110 - Base IRRF Salário	2.431,98
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			140,60		B120 - Dedução IRRF Salário	213,47
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			46,87		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	213,47
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			140,60		B400 - Base FGTS Salário	2.431,98
1020 H. E. 70%	P	17:12	300,59		B410 - FGTS Salário 8%	194,56
5010 INSS				213,47	B900 - Remuneração Total Mês	1.398,08
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	686,47
Totais			2.431,98	213,47		
Líquido				2.218,51		
008004	Caio Marcio Joia da Silva	180:00	Vigia	06/05/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0261 Intermitente Horas			177,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	253,52
0268 Descanso Semanal Remunerado			36,22		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			17,22		B110 - Base IRRF Salário	253,52
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			5,74		B120 - Dedução IRRF Salário	19,01
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			17,22		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	19,01
5010 INSS				19,01	B400 - Base FGTS Salário	253,52
					B410 - FGTS Salário 8%	20,28
					B900 - Remuneração Total Mês	177,12
					B905 - Salário Hora	7,38
Totais			253,52	19,01	- Admitido em 06/05/2020	
Líquido				234,51		
007997	Carlos Eduardo Vieira de Souza Carvalho	220:00	Servente	27/04/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,18	62,50		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.752,86
0261 Intermitente Horas			898,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			250,41		B110 - Base IRRF Salário	1.752,86
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			92,74		B120 - Dedução IRRF Salário	142,07
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			30,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	142,07
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			92,74		B400 - Base FGTS Salário	1.752,86
1020 H. E. 70%	P	27:14	325,00		B410 - FGTS Salário 8%	140,23
5010 INSS				142,07	B900 - Remuneração Total Mês	898,56
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	603,89

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
Totais		1.752,86	142,07			
Líquido			1.610,79			
007960	Carlos Eduardo Santos do Carmo	220:00	Operador de Espargidor	25/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,36	70,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.853,95
0261 Intermitente Horas	I		1.624,24		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			407,71		B110 - Base IRRF Salário	2.853,95
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		164,01		B120 - Dedução IRRF Salário	264,11
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		54,67		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	264,11
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		164,01		B400 - Base FGTS Salário	2.853,95
1020 H. E. 70%	P	21:05	368,45		B410 - FGTS Salário 8%	228,32
5010 INSS				264,11	B900 - Remuneração Total Mês	1.624,24
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	822,00
Totais		2.853,95	264,11			
Líquido			2.589,84			
008010	Carlos Henrique de Castilho da Costa	220:00	Operador de Rolo Compactador	13/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,08	34,67		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.789,18
0261 Intermitente Horas	I		1.069,12		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			255,60		B110 - Base IRRF Salário	1.789,18
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		106,93		B120 - Dedução IRRF Salário	145,34
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		35,64		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	145,34
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		106,93		B400 - Base FGTS Salário	1.789,18
1020 H. E. 70%	P	10:19	180,29		B410 - FGTS Salário 8%	143,13
5010 INSS				145,34	B900 - Remuneração Total Mês	1.069,12
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	464,46
Totais		1.789,18	145,34	- Admitido em 13/05/2020		
Líquido			1.643,84			
007948	Celso Alves da Costa	220:00	Operador de Fresadora II	16/03/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.800,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.629,29
0190 DSR s/ Salário Variável		10,31	133,76		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	8:26	182,51		B110 - Base IRRF Salário	2.509,29
1040 H. E. 100%	P	20:09	513,02		B120 - Dedução IRRF Salário	367,05
5010 INSS				367,05	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	367,05
5120 IRRF s/ Adiantamento				41,60	B400 - Base FGTS Salário	3.629,29
5310 Adiantamento Salarial				1.078,40	B410 - FGTS Salário 8%	290,34
5700 Vale Transporte				28,00	B900 - Remuneração Total Mês	2.800,00
					B903 - Salário Mês	2.800,00
					B920 - Base Salário Família	3.629,29
Totais		3.629,29	1.515,05			
Líquido			2.114,24			
007961	Cristiano Cimini Gualberto	220:00	Rastilheiro	25/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,45	45,55		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.191,37
0261 Intermitente Horas	I		1.293,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			313,05		B110 - Base IRRF Salário	2.191,37
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,67		B120 - Dedução IRRF Salário	184,60
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,22		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,60
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,67		B400 - Base FGTS Salário	2.191,37
1020 H. E. 70%	P	14:39	236,85		B410 - FGTS Salário 8%	175,31
5010 INSS				184,60	B900 - Remuneração Total Mês	1.293,36
					B905 - Salário Hora	9,51
					B920 - Base Salário Família	584,96
Totais		2.191,37	184,60			
Líquido			2.006,77			

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007967	Cristiano Nascimento Da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I	01/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		12,40	86,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.808,38
0261 Intermitente Horas			1.508,64		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			401,20		B110 - Base IRRF Salário	2.808,38
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			154,16		B120 - Dedução IRRF Salário	258,64
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			51,39		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	258,64
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			154,16		B400 - Base FGTS Salário	2.808,38
1010 H. E. 50%	P	33:33	451,92		B410 - FGTS Salário 8%	224,67
5010 INSS				258,64	B900 - Remuneração Total Mês	1.508,64
5110 IRRF				34,21	B905 - Salário Hora	8,98
Totais			2.808,38	292,85		
Líquido				2.515,53		
004387	Denis Bezerra da Silva	220:00	Apontador	16/06/2014	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.666,57
0190 DSR s/ Salário Variável		31,57	356,59		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	56:29	1.071,60		B110 - Base IRRF Salário	3.684,29
1040 H. E. 100%	P	35:04	782,69		B120 - Dedução IRRF Salário	512,26
5010 INSS				512,26	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	512,26
5110 IRRF				66,66	B400 - Base FGTS Salário	4.666,57
5120 IRRF s/ Adiantamento				97,58	B410 - FGTS Salário 8%	373,33
5310 Adiantamento Salarial				884,70	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
5700 Vale Transporte				24,56	B903 - Salário Mês	2.455,69
Totais			4.666,57	1.585,76		
Líquido				3.080,81		
007975	Devayr Pedro Luciano	220:00	Vigia	20/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,55	29,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.123,11
0261 Intermitente Horas			1.328,40		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			303,30		B110 - Base IRRF Salário	2.123,11
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			131,71		B120 - Dedução IRRF Salário	176,41
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			43,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	176,41
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			131,71		B400 - Base FGTS Salário	2.123,11
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	127:49	154,40		B410 - FGTS Salário 8%	169,85
5010 INSS				176,41	B900 - Remuneração Total Mês	1.328,40
Totais			2.123,11	176,41		
Líquido				1.946,70		
007974	Diogo Emanuel Bezerra Da Silva	220:00	Servente	20/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,50	82,85		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.266,53
0261 Intermitente Horas			1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	2.266,53
0268 Descanso Semanal Remunerado			323,79		B120 - Dedução IRRF Salário	193,62
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			119,06		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	193,62
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			39,69		B400 - Base FGTS Salário	2.266,53
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			119,06		B410 - FGTS Salário 8%	181,32
1020 H. E. 70%	P	28:53	344,69		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1040 H. E. 100%	P	6:08	86,11		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				193,62		
5110 IRRF				12,67		
Totais			2.266,53	206,29		
Líquido				2.060,24		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007962	Edson Franklin Ferreira	220:00	Operador de Pá Mecânica	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,52	42,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.625,81
0261 Intermitente Horas			1.611,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			375,12		B110 - Base IRRF Salário	2.625,81
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			160,04		B120 - Dedução IRRF Salário	236,73
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			53,35		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	236,73
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			160,04		B400 - Base FGTS Salário	2.625,81
1020 H. E. 70%	P	12:23	223,15		B410 - FGTS Salário 8%	210,06
5010 INSS				236,73	B900 - Remuneração Total Mês	1.611,20
5110 IRRF				22,16	B905 - Salário Hora	10,60
Totais			2.625,81	258,89		
Líquido				2.366,92		
007963	Everson Evangelista do Rego	220:00	Motorista de Caminhão I	25/03/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		13,04	93,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.963,09
0261 Intermitente Horas			1.580,48		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			423,30		B110 - Base IRRF Salário	2.963,09
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			161,74		B120 - Dedução IRRF Salário	277,21
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			53,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	277,21
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			161,74		B400 - Base FGTS Salário	2.963,09
1010 H. E. 50%	P	36:14	488,06		B410 - FGTS Salário 8%	237,05
5010 INSS				277,21	B900 - Remuneração Total Mês	1.580,48
					B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	959,31
Totais			2.963,09	277,21		
Líquido				2.685,88		
008001	Fabio Henrique Fernandes	220:00	Sinaleiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		21,13	116,75		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.604,21
0261 Intermitente Horas			1.210,32		B110 - Base IRRF Salário	2.604,21
0268 Descanso Semanal Remunerado			372,03		B120 - Dedução IRRF Salário	234,14
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			127,72		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	234,14
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			42,57		B400 - Base FGTS Salário	2.604,21
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			127,72		B410 - FGTS Salário 8%	208,34
1020 H. E. 70%	P	38:54	488,04		B900 - Remuneração Total Mês	1.210,32
1040 H. E. 100%	P	8:04	119,06		B905 - Salário Hora	7,38
5010 INSS				234,14		
5110 IRRF				34,96		
Totais			2.604,21	269,10		
Líquido				2.335,11		
000058	Fernando Jose Azevedo dos Santos	150:00	Arquiteto	08/04/2008	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet			3.752,50		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5010 INSS				713,09	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	189,59
5110 IRRF				551,39	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5350 Adiantamento de Folha	G			3.752,50	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.664,04
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
					B920 - Base Salário Família	10.115,06

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15.45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
Totais		13.867,56	9.063,00			
Líquido			4.804,56			
007934	Flavio Ker Lacerda	220:00	Operador de Usina I	11/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.384,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.507,13
0190 DSR s/ Salário Variável		16,43	181,15		B110 - Base IRRF Salário	2.553,53
1020 H. E. 70%	P	1:07	20,58		B120 - Dedução IRRF Salário	349,94
1040 H. E. 100%	P	42:30	921,40		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	349,94
5010 INSS				349,94	B400 - Base FGTS Salário	3.507,13
5110 IRRF				22,47	B410 - FGTS Salário 8%	280,57
5120 IRRF s/ Adiantamento				93,35	B900 - Remuneração Total Mês	2.384,00
5310 Adiantamento Salarial				860,25	B903 - Salário Mês	2.384,00
5700 Vale Transporte				23,84		
Totais		3.507,13	1.349,85			
Líquido			2.157,28			
007989	Francisco Joaquim Pereira	220:00	Encarregado de Pavimentação I	27/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,10	152,35		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.301,71
0261 Intermitente Horas	I		2.210,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			614,53		B110 - Base IRRF Salário	4.301,71
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		228,03		B120 - Dedução IRRF Salário	461,18
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		76,01		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	461,18
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		228,03		B400 - Base FGTS Salário	4.301,71
1020 H. E. 70%	P	26:59	792,20		B410 - FGTS Salário 8%	344,14
5010 INSS				461,18	B900 - Remuneração Total Mês	2.210,56
5110 IRRF				192,84	B905 - Salário Hora	17,27
Totais		4.301,71	654,02			
Líquido			3.647,69			
007982	Geroncio de Jesus Cardial	220:00	Rastilheiro	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,26	43,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.177,82
0261 Intermitente Horas	I		1.293,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			311,12		B110 - Base IRRF Salário	2.177,82
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,51		B120 - Dedução IRRF Salário	182,97
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,17		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	182,97
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,51		B400 - Base FGTS Salário	2.177,82
1020 H. E. 70%	P	14:04	227,42		B410 - FGTS Salário 8%	174,23
5010 INSS				182,97	B900 - Remuneração Total Mês	1.293,36
					B905 - Salário Hora	9,51
Totais		2.177,82	182,97			
Líquido			1.994,85			
006807	Givanildo Santos Andrade	220:00	Apontador	14/03/2016	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.455,69		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.939,35
0190 DSR s/ Salário Variável		21,26	239,30		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	36:53	699,75		B110 - Base IRRF Salário	2.957,07
1040 H. E. 100%	P	24:24	544,61		B120 - Dedução IRRF Salário	410,45
5010 INSS				410,45	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	410,45
5110 IRRF				19,76	B400 - Base FGTS Salário	3.939,35
5120 IRRF s/ Adiantamento				53,23	B410 - FGTS Salário 8%	315,15
5310 Adiantamento Salarial				929,05	B900 - Remuneração Total Mês	2.455,69
5700 Vale Transporte				24,56	B903 - Salário Mês	2.455,69
					B920 - Base Salário Família	3.939,35
Totais		3.939,35	1.437,05			
Líquido			2.502,30			

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007996	Glaucio Dias Guimaraes Manco	220:00	Servente	27/04/2020	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		11,04	57,94		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.080,54
0261 Intermitente Horas			1.151,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			297,22		B110 - Base IRRF Salário	2.080,54
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			116,92		B120 - Dedução IRRF Salário	171,56
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			38,97		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	171,56
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			116,92		B400 - Base FGTS Salário	2.080,54
1020 H. E. 70%	P	18:16	217,99		B410 - FGTS Salário 8%	166,44
1040 H. E. 100%	P	5:56	83,30		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
5010 INSS				171,56	B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	632,04
Totais			2.080,54	171,56		
Líquido				1.908,98		
004350	Guilherme Dias de Oliveira	220:00	Servente	12/06/2014	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.544,40
Totais					- Afastado desde: 04/08/2014 Motivo: Auxílio Doença	
Líquido						
007977	Higor Souza Muniz	220:00	Servente	22/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,24	53,13		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.910,09
0261 Intermitente Horas			1.123,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			272,87		B110 - Base IRRF Salário	1.910,09
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			112,69		B120 - Dedução IRRF Salário	156,22
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			37,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	156,22
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			112,69		B400 - Base FGTS Salário	1.910,09
1020 H. E. 70%	P	23:09	276,27		B410 - FGTS Salário 8%	152,81
5010 INSS				156,22	B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
5624 Faltas (H)	P	8:00		40,88	B905 - Salário Hora	7,02
5625 DSR s/ Faltas	P	1		37,44	B920 - Base Salário Família	592,34
Totais			1.988,41	234,54		
Líquido				1.753,87		
007994	Hugo Ricardo Leite Vieira	220:00	Servente	27/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		12,41	51,83		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.673,18
0261 Intermitente Horas			898,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			239,03		B110 - Base IRRF Salário	1.673,18
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)			91,82		B120 - Dedução IRRF Salário	134,90
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)			30,61		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	134,90
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			91,82		B400 - Base FGTS Salário	1.673,18
1020 H. E. 70%	P	22:35	269,51		B410 - FGTS Salário 8%	133,85
5010 INSS				134,90	B900 - Remuneração Total Mês	898,56
					B905 - Salário Hora	7,02
Totais			1.673,18	134,90		
Líquido				1.538,28		

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
008012	Jesse Nascimento de Oliveira	220:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,17	5,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	347,17
0261 Intermitente Horas			215,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			49,60		B110 - Base IRRF Salário	347,17
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			21,40		B120 - Dedução IRRF Salário	26,03
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			7,13		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	26,03
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			21,40		B400 - Base FGTS Salário	347,17
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	27,77
1010 H. E. 50%	P	2:00	26,94		B900 - Remuneração Total Mês	215,52
5010 INSS				26,03	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	82,05
					- Admitido em 27/05/2020	
		Totais	395,79	26,03		
		Líquido		369,76		
007950	João Santos Gonçalves Barbosa	220:00	Servente	17/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.834,56
0190 DSR s/ Salário Variável		6,40	46,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	9:00	107,41		B110 - Base IRRF Salário	1.216,80
1040 H. E. 100%	P	9:41	135,95		B120 - Dedução IRRF Salário	149,43
5010 INSS				149,43	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	149,43
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.834,56
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	146,76
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
		Totais	1.834,56	782,63		
		Líquido		1.051,93		
007941	Joel dos Santos da Costa	220:00	Servente	13/03/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.856,34
0190 DSR s/ Salário Variável		7,10	50,31		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	0:26	5,17		B110 - Base IRRF Salário	1.238,58
1040 H. E. 100%	P	18:16	256,46		B120 - Dedução IRRF Salário	151,39
5010 INSS				151,39	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	151,39
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.856,34
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	148,51
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.856,34
		Totais	1.856,34	784,59		
		Líquido		1.071,75		
007945	Jorge Henrique de Aquino Duarte	220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.395,18
0190 DSR s/ Salário Variável		7,32	67,65		B110 - Base IRRF Salário	1.604,88
1010 H. E. 50%	P	26:07	351,79		B120 - Dedução IRRF Salário	209,06
5010 INSS				209,06	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	209,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				40,85	B400 - Base FGTS Salário	2.395,18
5310 Adiantamento Salarial				749,45	B410 - FGTS Salário 8%	191,61
5700 Vale Transporte				19,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.395,18
		Totais	2.395,18	1.019,12		
		Líquido		1.376,06		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15.45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
008007	Jorge Luiz de Barros Tortura	220:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		11,09	67,39		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.404,94
0261 Intermitente Horas	I		1.329,04		B110 - Base IRRF Salário	2.404,94
0268 Descanso Semanal Remunerado			343,56		B120 - Dedução IRRF Salário	210,23
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		134,79		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	210,23
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		44,93		B400 - Base FGTS Salário	2.404,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		134,79		B410 - FGTS Salário 8%	192,40
1010 H. E. 50%	P	26:01	350,44		B900 - Remuneração Total Mês	1.329,04
5010 INSS				210,23	B905 - Salário Hora	8,98
5110 IRRF				21,80		
Totais			2.404,94	232,03	- Admitido em 06/05/2020	
Líquido				2.172,91		
007990	Jose Francisco do Carmo	220:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,18	84,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.374,23
0261 Intermitente Horas	I		1.217,28		B110 - Base IRRF Salário	2.374,23
0268 Descanso Semanal Remunerado			339,18		B120 - Dedução IRRF Salário	206,54
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		125,63		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	206,54
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		41,88		B400 - Base FGTS Salário	2.374,23
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		125,63		B410 - FGTS Salário 8%	189,94
1020 H. E. 70%	P	27:13	440,01		B900 - Remuneração Total Mês	1.217,28
5010 INSS				206,54	B905 - Salário Hora	9,51
5110 IRRF				19,78		
Totais			2.374,23	226,32		
Líquido				2.147,91		
007957	Jose Pinheiro	220:00	Eletricista I	19/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.425,12		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.667,03
0190 DSR s/ Salário Variável		3,32	39,02		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	0:11	3,43		B110 - Base IRRF Salário	1.696,98
1040 H. E. 100%	P	9:03	199,46		B120 - Dedução IRRF Salário	241,68
5010 INSS				241,68	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	241,68
5120 IRRF s/ Adiantamento				28,87	B400 - Base FGTS Salário	2.667,03
5310 Adiantamento Salarial				941,18	B410 - FGTS Salário 8%	213,36
5700 Vale Transporte				24,25	B900 - Remuneração Total Mês	2.425,12
					B903 - Salário Mês	2.425,12
Totais			2.667,03	1.235,98		
Líquido				1.431,05		
001902	Jose Renato Maia Tavares	150:00	Engenheiro Civil	24/04/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet			4.066,00		B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5010 INSS				713,09	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5110 IRRF				603,53	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	10.115,06
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.112,65	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				2.933,37	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	1.716,18
5350 Adiantamento de Folha	G			4.066,00	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
Totais			14.181,06	9.428,64		
Líquido				4.752,42		

GA

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimentação Rio AP'4						
008009	Juarez Almeida Goncalves Junior	220:00	Assistente Administrativo I	11/05/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,30	49,43		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.850,81
0261 Intermitente Horas	I		1.035,20		B110 - Base IRRF Salário	1.850,81
0268 Descanso Semanal Remunerado			264,40		B120 - Dedução IRRF Salário	150,89
0324 Férias Proporcional (Intermitente)	I		104,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	150,89
0329 1/3 s/ Férias Proporcional (Intermitente)	I		34,97		B400 - Base FGTS Salário	1.850,81
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		104,90		B410 - FGTS Salário 8%	148,06
1020 H. E. 70%	P	11:41	257,01		B900 - Remuneração Total Mês	1.035,20
5010 INSS				150,89	B905 - Salário Hora	12,94
		Totais	1.850,81	150,89	- Admitido em 11/05/2020	
		Líquido		1.699,92		
007992	Julio Cesar Silva dos Santos	220:00	Rastilheiro	27/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,02	83,22		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.363,78
0261 Intermitente Horas	I		1.217,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			337,68		B110 - Base IRRF Salário	2.363,78
0324 Férias Proporcional (Intermitente)	I		125,51		B120 - Dedução IRRF Salário	205,29
0329 1/3 s/ Férias Proporcional (Intermitente)	I		41,84		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	205,29
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		125,51		B400 - Base FGTS Salário	2.363,78
1020 H. E. 70%	P	26:46	432,74		B410 - FGTS Salário 8%	189,10
5010 INSS				205,29	B900 - Remuneração Total Mês	1.217,28
		Totais	2.363,78	205,29	B905 - Salário Hora	9,51
		Líquido		2.158,49	B920 - Base Salário Família	808,82
007985	Julio Cesar Vieira de Paula	220:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,26	42,05		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.370,55
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B110 - Base IRRF Salário	2.370,55
0268 Descanso Semanal Remunerado			338,65		B120 - Dedução IRRF Salário	206,10
0324 Férias Proporcional (Intermitente)	I		143,31		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	206,10
0329 1/3 s/ Férias Proporcional (Intermitente)	I		47,77		B400 - Base FGTS Salário	2.370,55
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		143,31		B410 - FGTS Salário 8%	189,64
1010 H. E. 50%	P	16:14	218,66		B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
5010 INSS				206,10	B905 - Salário Hora	8,98
5110 IRRF				19,53		
		Totais	2.370,55	225,63		
		Líquido		2.144,92		
007987	Leonardo Ferreira Francisco	220:00	Operador de Roço Compactador	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,24	92,14		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.571,47
0261 Intermitente Horas	I		1.315,84		B110 - Base IRRF Salário	2.571,47
0268 Descanso Semanal Remunerado			367,35		B120 - Dedução IRRF Salário	230,21
0324 Férias Proporcional (Intermitente)	I		135,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	230,21
0329 1/3 s/ Férias Proporcional (Intermitente)	I		45,29		B400 - Base FGTS Salário	2.571,47
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		135,86		B410 - FGTS Salário 8%	205,72
1020 H. E. 70%	P	27:25	479,13		B900 - Remuneração Total Mês	1.315,84
5010 INSS				230,21	B905 - Salário Hora	10,28
5110 IRRF				32,79		
		Totais	2.571,47	263,00		
		Líquido		2.308,47		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
008008	Luis Carlos Suarez Y Pereira	220:00	Motorista de Caminhão I	06/05/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,39	55,18		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.211,51
0261 Intermitente Horas	I		1.257,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			315,93		B110 - Base IRRF Salário	2.211,51
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		126,98		B120 - Dedução IRRF Salário	187,02
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		42,33		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	187,02
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		126,98		B400 - Base FGTS Salário	2.211,51
1010 H. E. 50%	P	21:18	286,91		B410 - FGTS Salário 8%	176,92
5010 INSS				187,02	B900 - Remuneração Total Mês	1.257,20
					B905 - Salário Hora	8,98
					- Admitido em 06/05/2020	
Totais			2.211,51	187,02		
Líquido				2.024,49		
008000	Luiz Alberto Lemos Correa	220:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,39	93,65		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.582,77
0261 Intermitente Horas	I		1.315,84		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			368,97		B110 - Base IRRF Salário	2.582,77
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		135,99		B120 - Dedução IRRF Salário	231,57
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		45,33		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	231,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		135,99		B400 - Base FGTS Salário	2.582,77
1020 H. E. 70%	P	27:52	487,00		B410 - FGTS Salário 8%	206,62
5010 INSS				231,57	B900 - Remuneração Total Mês	1.315,84
5110 IRRF				19,32	B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	897,96
Totais			2.582,77	250,89		
Líquido				2.331,88		
007936	Luiz Claudio Ferrari Campos	220:00	Servente	11/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.949,75
0190 DSR s/ Salário Variável		9,19	65,38		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	5:21	63,85		B110 - Base IRRF Salário	1.331,99
1040 H. E. 100%	P	19:40	276,12		B120 - Dedução IRRF Salário	159,79
5010 INSS				159,79	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	159,79
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.949,75
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	155,98
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais			1.949,75	792,99		
Líquido				1.156,76		
007954	Luiz Henrique Costa da Silva	220:00	Servente	17/03/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.528,02		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.824,23
0190 DSR s/ Salário Variável		6,26	45,13		B110 - Base IRRF Salário	1.206,47
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		2:20	16,38		B120 - Dedução IRRF Salário	148,50
1020 H. E. 70%	P	8:00	95,47		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	148,50
1040 H. E. 100%	P	9:55	139,23		B400 - Base FGTS Salário	1.824,23
5010 INSS				148,50	B410 - FGTS Salário 8%	145,94
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
5700 Vale Transporte				15,44	B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais			1.824,23	781,70		
Líquido				1.042,53		

68

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007988	Magno Santos da Silva	220:00	Operador de Rolo Compactador	27/04/2020	2	4
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,10	51,92		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.388,87
0261 Intermitente Horas	I		1.398,08		B100 - Dependentes IRRF Sal	758,36
0268 Descanso Semanal Remunerado			341,27		B110 - Base IRRF Salário	2.388,87
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		140,40		B120 - Dedução IRRF Salário	208,30
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		46,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	208,30
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		140,40		B400 - Base FGTS Salário	2.388,87
1020 H. E. 70%	P	15:27	270,00		B410 - FGTS Salário 8%	191,11
5010 INSS				208,30	B900 - Remuneração Total Mês	1.398,08
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	649,52
Totais			2.388,87	208,30		
Líquido				2.180,57		
000923	Marcelo Barbosa Ribeiro	220:00	Encarregado de Usina III	13/09/2010	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	5.816,65		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	7.518,05
0190 DSR s/ Salário Variável		7,18	207,00		B110 - Base IRRF Salário	5.191,39
1020 H. E. 70%	P	15:17	736,32		B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
1040 H. E. 100%	P	6:00	340,08		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
1430 Adicional Insalubridade		40	418,00		B400 - Base FGTS Salário	7.518,05
5010 INSS				713,09	B410 - FGTS Salário 8%	601,44
5110 IRRF				371,49	B900 - Remuneração Total Mês	6.234,65
5120 IRRF s/ Adiantamento				610,10	B903 - Salário Mês	5.816,65
5310 Adiantamento Salarial				1.716,56	B935 - Base Insalubridade	418,00
5700 Vale Transporte				58,17		
Totais			7.518,05	3.469,41		
Líquido				4.048,64		
007964	Marcelo Chafim de Araujo	220:00	Motorista de Caminhão I	25/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		12,36	84,36		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.737,93
0261 Intermitente Horas	I		1.472,72		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			391,13		B110 - Base IRRF Salário	2.737,93
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		150,45		B120 - Dedução IRRF Salário	250,19
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		50,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	250,19
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		150,45		B400 - Base FGTS Salário	2.737,93
1010 H. E. 50%	P	32:34	438,67		B410 - FGTS Salário 8%	219,03
5010 INSS				250,19	B900 - Remuneração Total Mês	1.472,72
5110 IRRF				15,34	B905 - Salário Hora	8,98
Totais			2.737,93	265,53		
Líquido				2.472,40		
007965	Marcelo Marcos de Farias Britto	220:00	Rastilheiro	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,48	45,86		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.193,67
0261 Intermitente Horas	I		1.293,36		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			313,38		B110 - Base IRRF Salário	2.193,67
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		129,69		B120 - Dedução IRRF Salário	184,88
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		43,23		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,88
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		129,69		B400 - Base FGTS Salário	2.193,67
1020 H. E. 70%	P	14:45	238,46		B410 - FGTS Salário 8%	175,49
5010 INSS				184,88	B900 - Remuneração Total Mês	1.293,36
					B905 - Salário Hora	9,51
Totais			2.193,67	184,88		
Líquido				2.008,79		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007949	Marcio da Silva de Souza	220:00	Servente	17/03/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.994,54
0190 DSR s/ Salário Variável		10,21	72,60		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	8:24	100,25		B110 - Base IRRF Salário	1.376,78
1040 H. E. 100%	P	19:45	277,29		B120 - Dedução IRRF Salário	163,82
5010 INSS				163,82	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	163,82
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.994,54
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	159,56
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	1.994,54
		Totais	1.994,54	797,02		
		Líquido		1.197,52		
007986	Marcio Monteiro de Araujo	220:00	Operador de Espargidor	27/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,09	32,04		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.651,81
0261 Intermitente Horas	I		986,88		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			235,97		B110 - Base IRRF Salário	1.651,81
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		98,71		B120 - Dedução IRRF Salário	132,98
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		32,90		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	132,98
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		98,71		B400 - Base FGTS Salário	1.651,81
1020 H. E. 70%	P	9:32	166,60		B410 - FGTS Salário 8%	132,14
5010 INSS				132,98	B900 - Remuneração Total Mês	986,88
					B905 - Salário Hora	10,28
					B920 - Base Salário Família	428,96
		Totais	1.651,81	132,98		
		Líquido		1.518,83		
007995	Marcio Ribeiro Bento	220:00	Servente	27/04/2020	3	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,29	34,62		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.544,63
0261 Intermitente Horas	I		898,56		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			220,66		B110 - Base IRRF Salário	1.544,63
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		90,34		B120 - Dedução IRRF Salário	123,33
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		30,11		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	123,33
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		90,34		B400 - Base FGTS Salário	1.544,63
1020 H. E. 70%	P	15:05	180,00		B410 - FGTS Salário 8%	123,57
5010 INSS				123,33	B900 - Remuneração Total Mês	898,56
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	425,41
		Totais	1.544,63	123,33		
		Líquido		1.421,30		
007984	Marcos Soares do Nascimento	220:00	Motorista de Caminhão I	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		11,30	76,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.682,48
0261 Intermitente Horas	I		1.472,72		B110 - Base IRRF Salário	2.682,48
0268 Descanso Semanal Remunerado			383,21		B120 - Dedução IRRF Salário	243,53
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		149,81		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	243,53
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		49,94		B400 - Base FGTS Salário	2.682,48
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		149,81		B410 - FGTS Salário 8%	214,60
1010 H. E. 50%	P	29:42	400,06		B900 - Remuneração Total Mês	1.472,72
5010 INSS				243,53	B905 - Salário Hora	8,98
5110 IRRF				40,12		
		Totais	2.682,48	283,65		
		Líquido		2.398,83		

69

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimentação Rio AP'4						
007048	Marcos Vinicius Singello Patrocinio	220:00	Auxiliar de Engenharia	28/04/2016	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			2.611,82		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.844,56
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep		18:00	232,74		B110 - Base IRRF Salário	1.706,74
5010 INSS				262,98	B120 - Dedução IRRF Salário	262,98
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,82	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	262,98
5310 Adiantamento Salarial				1.087,00	B400 - Base FGTS Salário	2.844,56
5700 Vale Transporte				26,61	B410 - FGTS Salário 8%	227,56
					B900 - Remuneração Total Mês	2.844,56
					B903 - Salário Mês	2.844,56
Totais			2.844,56	1.427,41		
Líquido				1.417,15		
007973	Matheus Cordeiro Soares Silva	220:00	Servente	20/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,08	35,27		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.629,89
0261 Intermitente Horas			954,72		B110 - Base IRRF Salário	1.629,89
0268 Descanso Semanal Remunerado			232,84		B120 - Dedução IRRF Salário	131,01
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			95,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	131,01
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			31,95		B400 - Base FGTS Salário	1.629,89
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			95,86		B410 - FGTS Salário 8%	130,39
1020 H. E. 70%		15:22	183,39		B900 - Remuneração Total Mês	954,72
5010 INSS				131,01	B905 - Salário Hora	7,02
Totais			1.629,89	131,01		
Líquido				1.498,88		
007978	Matheus Gomes Mariano	220:00	Servente	22/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B905 - Salário Hora	7,02
Totais						
Líquido						
007940	Naassom Moura Navega	220:00	Operador de Bob Cat	13/03/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.261,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.866,90
0190 DSR s/ Salário Variável		9,30	97,63		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1020 H. E. 70%		5:43	99,90		B110 - Base IRRF Salário	1.962,26
1040 H. E. 100%		19:50	407,77		B120 - Dedução IRRF Salário	265,66
5010 INSS				265,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	265,66
5310 Adiantamento Salarial				904,64	B400 - Base FGTS Salário	2.866,90
5700 Vale Transporte				22,62	B410 - FGTS Salário 8%	229,35
					B900 - Remuneração Total Mês	2.261,60
					B903 - Salário Mês	2.261,60
					B920 - Base Salário Família	2.866,90
Totais			2.866,90	1.192,92		
Líquido				1.673,98		
008013	Oswaldo Manoel Rodrigues Da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,04	4,97		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	345,57
0261 Intermitente Horas			215,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			49,37		B110 - Base IRRF Salário	345,57
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)			21,38		B120 - Dedução IRRF Salário	25,91
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)			7,13		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	25,91
0354 13o. Proporcional (Intermitente)			21,38		B400 - Base FGTS Salário	345,57
1010 H. E. 50%		1:55	25,82		B410 - FGTS Salário 8%	27,65
5010 INSS				25,91	B900 - Remuneração Total Mês	215,52
					B905 - Salário Hora	8,98
Totais			345,57	25,91	- Admitido em 27/05/2020	
Líquido				319,66		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
000469	Oswaldo Pecanha Sobrinho	100:00	Engenheiro Civil	04/09/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	11.179,80		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	11.179,80
3073 Reembolso de despesas com quilomet			4.493,50		B110 - Base IRRF Salário	6.707,88
5010 INSS				713,09	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5110 IRRF				779,21	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	11.179,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				1.229,78	B160 - Dedução IRRF Salário(Ant)	713,09
5310 Adiantamento Salarial				3.242,14	B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	2.008,99
5350 Adiantamento de Folha	G			4.493,50	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B400 - Base FGTS Salário	11.179,80
					B410 - FGTS Salário 8%	894,38
					B900 - Remuneração Total Mês	11.179,80
					B903 - Salário Mês	11.179,80
Totais			15.673,30	10.457,72		
Líquido				5.215,58		
007952	Patrick de Medeiros Brito	220:00	Operador de Fresadora I	17/03/2020	0	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.500,00		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.248,97
0190 DSR s/ Salário Variável		10,38	120,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	8.54	171,88		B110 - Base IRRF Salário	2.248,97
1040 H. E. 100%	P	20:05	456,29		B120 - Dedução IRRF Salário	313,80
5010 INSS				313,80	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	313,80
5120 IRRF s/ Adiantamento				14,22	B400 - Base FGTS Salário	3.248,97
5310 Adiantamento Salarial				985,78	B410 - FGTS Salário 8%	259,92
5700 Vale Transporte				24,19	B900 - Remuneração Total Mês	2.500,00
					B903 - Salário Mês	2.500,00
Totais			3.248,97	1.337,99		
Líquido				1.910,98		
007968	Paulo Roberto Silva Sathler	220:00	Operador de Bob Cat	01/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		13,03	102,50		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.237,40
0261 Intermitente Horas	I		1.727,04		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			462,49		B110 - Base IRRF Salário	3.237,40
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		176,73		B120 - Dedução IRRF Salário	312,18
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitent	I		58,91		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	312,18
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		176,73		B400 - Base FGTS Salário	3.237,40
1020 H. E. 70%	P	17:17	302,04		B410 - FGTS Salário 8%	258,99
1040 H. E. 100%	P	11:14	230,96		B900 - Remuneração Total Mês	1.727,04
5010 INSS				312,18	B905 - Salário Hora	10,28
5110 IRRF				62,37		
Totais			3.237,40	374,55		
Líquido				2.862,85		
007999	Rafael Martins da Silva	220:00	Servente	27/04/2020	2	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		14,16	65,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.936,20
0261 Intermitente Horas	I		1.010,88		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			276,60		B110 - Base IRRF Salário	1.936,20
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		103,92		B120 - Dedução IRRF Salário	158,57
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitent	I		34,64		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	158,57
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		103,92		B400 - Base FGTS Salário	1.936,20
1020 H. E. 70%	P	28:33	340,72		B410 - FGTS Salário 8%	154,90
5010 INSS				158,57	B900 - Remuneração Total Mês	1.010,88
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	648,72
Totais			1.936,20	158,57		
Líquido				1.777,63		

10

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
008005	Rafael Romao Rosa	180:00	Vigia	06/05/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0191 DSR s/ Adicional Noturno		1,37	5,58		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	928,96
0261 Intermitente Horas	I		619,92		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			132,71		B110 - Base IRRF Salário	928,96
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		60,75		B120 - Dedução IRRF Salário	69,67
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		20,25		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	69,67
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		60,75		B400 - Base FGTS Salário	928,96
0400 Salário Família		2	97,24		B410 - FGTS Salário 8%	74,32
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	42:09	29,00		B900 - Remuneração Total Mês	619,92
5010 INSS				69,67	B905 - Salário Hora	7,38
					B920 - Base Salário Família	176,33
		Totais	1.026,20	69,67	- Admitido em 06/05/2020	
		Líquido		956,53		
007943	Reinaldo Martins Lemos	220:00	Soldador	13/03/2020	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.841,61		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.875,22
0190 DSR s/ Salário Variável		0,25	5,42		B110 - Base IRRF Salário	1.738,58
1020 H. E. 70%	P	1:17	28,19		B120 - Dedução IRRF Salário	266,66
5010 INSS				266,66	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	266,66
5120 IRRF s/ Adiantamento				56,31	B400 - Base FGTS Salário	2.875,22
5310 Adiantamento Salarial				1.080,33	B410 - FGTS Salário 8%	230,02
5700 Vale Transporte				28,42	B900 - Remuneração Total Mês	2.841,61
					B903 - Salário Mês	2.841,61
					B920 - Base Salário Família	2.875,22
		Totais	2.875,22	1.431,72		
		Líquido		1.443,50		
000178	Reinaldo Rangel Soares	180:00	Vigia	02/02/2009	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.623,60		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.191,51
0190 DSR s/ Salário Variável		5,37	50,65		B110 - Base IRRF Salário	1.542,07
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,32	40,95		B120 - Dedução IRRF Salário	184,62
1040 H. E. 100%	P	5:00	90,20		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	184,62
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	118:02	212,93		B400 - Base FGTS Salário	2.191,51
1070 H. E. Not. 100%	P	8:00	173,18		B410 - FGTS Salário 8%	175,32
5010 INSS				184,62	B900 - Remuneração Total Mês	1.623,60
5120 IRRF s/ Adiantamento				22,60	B903 - Salário Mês	1.623,60
5310 Adiantamento Salarial				626,84		
5700 Vale Transporte				16,24		
		Totais	2.191,51	850,30		
		Líquido		1.341,21		
007953	Renan Firmino Da Silva	220:00	Servente	17/03/2020	1	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.058,28
0190 DSR s/ Salário Variável		11,48	82,88		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
1020 H. E. 70%	P	12:34	149,97		B110 - Base IRRF Salário	1.440,52
1040 H. E. 100%	P	20:01	281,03		B120 - Dedução IRRF Salário	169,56
5010 INSS				169,56	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,56
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	2.058,28
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	164,66
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
					B920 - Base Salário Família	2.058,28
		Totais	2.058,28	802,76		
		Líquido		1.255,52		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimentação Rio AP'4						
007958	Renato Oliveira de Azevedo Silva	220:00	Laboratorista	19/03/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.546,38		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.667,95
0190 DSR s/ Salário Variável		1,55	22,19		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
1020 H. E. 70%	P	5:52	115,39		B110 - Base IRRF Salário	1.649,40
5010 INSS				241,79	B120 - Dedução IRRF Salário	241,79
5120 IRRF s/ Adiantamento				50,44	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	241,79
5310 Adiantamento Salarial				968,11	B400 - Base FGTS Salário	2.667,95
5610 Atrasos	P	0:23		4,44	B410 - FGTS Salário 8%	213,44
5626 DSR s/ Atraso	P	1:00		11,57	B900 - Remuneração Total Mês	2.546,38
5700 Vale Transporte				25,46	B903 - Salário Mês	2.546,38
					B920 - Base Salário Família	2.683,96
Totais			2.683,96	1.301,81		
Líquido				1.382,15		
008002	Renato Pereira	220:00	Operador de Acabadora I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		9,36	67,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.715,16
0261 Intermitente Horas	I		1.544,96		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			387,88		B110 - Base IRRF Salário	2.715,16
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		156,01		B120 - Dedução IRRF Salário	247,45
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		52,00		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	247,45
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		156,01		B400 - Base FGTS Salário	2.715,16
1020 H. E. 70%	P	18:10	350,83		B410 - FGTS Salário 8%	217,21
5010 INSS				247,45	B900 - Remuneração Total Mês	1.544,96
5110 IRRF				28,06	B905 - Salário Hora	11,36
Totais			2.715,16	275,51		
Líquido				2.439,65		
007942	Ricardo Santos da Costa	220:00	Servente	13/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.981,81
0190 DSR s/ Salário Variável		10,03	70,55		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	8:15	98,46		B110 - Base IRRF Salário	1.364,05
1040 H. E. 100%	P	19:07	268,40		B120 - Dedução IRRF Salário	162,68
5010 INSS				162,68	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	162,68
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.981,81
					B410 - FGTS Salário 8%	158,54
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais			1.981,81	780,44		
Líquido				1.201,37		
007991	Roberto Carlos de Oliveira	220:00	Rastilheiro	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,08	83,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.367,66
0261 Intermitente Horas	I		1.217,28		B110 - Base IRRF Salário	2.367,66
0268 Descanso Semanal Remunerado			338,24		B120 - Dedução IRRF Salário	205,75
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		125,56		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	205,75
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		41,85		B400 - Base FGTS Salário	2.367,66
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		125,56		B410 - FGTS Salário 8%	189,41
1020 H. E. 70%	P	26:56	435,43		B900 - Remuneração Total Mês	1.217,28
5010 INSS				205,75	B905 - Salário Hora	9,51
5110 IRRF				19,34		
Totais			2.367,66	225,09		
Líquido				2.142,57		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007966	Roberto Cordeiro	220:00	Encarregado de Pavimentação I	25/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8	85,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.999,86
0261 Intermitente Horas	I		2.348,72		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			571,41		B110 - Base IRRF Salário	3.999,86
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		235,71		B120 - Dedução IRRF Salário	418,93
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		78,57		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	418,93
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		235,71		B400 - Base FGTS Salário	3.999,86
1020 H. E. 70%	P	15:08	444,30		B410 - FGTS Salário 8%	319,99
5010 INSS				418,93	B900 - Remuneração Total Mês	2.348,72
5110 IRRF				153,90	B905 - Salário Hora	17,27
Totais			3.999,86	572,83		
Líquido				3.427,03		
007946	Rogério Martins	220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.975,74		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.440,16
0190 DSR s/ Salário Variável		8,20	74,91		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1010 H. E. 50%	P	28:55	389,51		B110 - Base IRRF Salário	1.649,86
5010 INSS				214,45	B120 - Dedução IRRF Salário	214,45
5310 Adiantamento Salarial				790,30	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	214,45
5700 Vale Transporte				19,76	B400 - Base FGTS Salário	2.440,16
					B410 - FGTS Salário 8%	195,21
					B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
Totais			2.440,16	1.024,51		
Líquido				1.415,65		
007993	Ronaldo Alves da Costa	220:00	Servente	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,28	54,79		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.057,03
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B110 - Base IRRF Salário	2.057,03
0268 Descanso Semanal Remunerado			293,86		B120 - Dedução IRRF Salário	169,45
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		116,65		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	169,45
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,88		B400 - Base FGTS Salário	2.057,03
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		116,65		B410 - FGTS Salário 8%	164,56
1020 H. E. 70%	P	18:56	225,95		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
1040 H. E. 100%	P	4:12	58,97		B905 - Salário Hora	7,02
5010 INSS				169,45		
Totais			2.057,03	169,45		
Líquido				1.887,58		
007979	Samuel de Paula Santos	220:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		15,25	80,66		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.250,23
0261 Intermitente Horas	I		1.151,28		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			321,46		B110 - Base IRRF Salário	2.250,23
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		118,88		B120 - Dedução IRRF Salário	191,66
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		39,63		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	191,66
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		118,88		B400 - Base FGTS Salário	2.250,23
1020 H. E. 70%	P	27:57	333,56		B410 - FGTS Salário 8%	180,02
1040 H. E. 100%	P	6:07	85,88		B900 - Remuneração Total Mês	1.151,28
5010 INSS				191,66	B905 - Salário Hora	7,02
Totais			2.250,23	191,66		
Líquido				2.058,57		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007980	Samuel Marcos Alves	220:00	Servente	22/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		10,30	53,59		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.007,85
0261 Intermitente Horas	I		1.123,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			286,84		B110 - Base IRRF Salário	2.007,85
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		113,81		B120 - Dedução IRRF Salário	165,02
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		37,94		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	165,02
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		113,81		B400 - Base FGTS Salário	2.007,85
1020 H. E. 70%	P	23:21	278,66		B410 - FGTS Salário 8%	160,63
5010 INSS				165,02	B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
					B905 - Salário Hora	7,02
Totais			2.007,85	165,02		
Líquido				1.842,83		
007947	Sandro Leandro Batista de Mattos	220:00	Motorista de Caminhão I	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário			1.266,27		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.311,14
0190 DSR s/ Salário Variável		6,01	54,10		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0751 Salário Enfermidade Atraso/Saída Antep	P	79:00	709,47		B110 - Base IRRF Salário	1.520,84
1010 H. E. 50%	P	20:53	281,30		B120 - Dedução IRRF Salário	198,97
5010 INSS				198,97	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	198,97
5120 IRRF s/ Adiantamento				10,95	B400 - Base FGTS Salário	2.311,14
5310 Adiantamento Salarial				779,35	B410 - FGTS Salário 8%	184,89
5700 Vale Transporte				14,02	B900 - Remuneração Total Mês	1.975,74
					B903 - Salário Mês	1.975,74
Totais			2.311,14	1.003,29		
Líquido				1.307,85		
007983	Silas Gomes dos Santos	220:00	Motorista de Caminhão Espargidor	27/04/2020	2	3
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,55	45,20		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.394,08
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	568,77
0268 Descanso Semanal Remunerado			342,01		B110 - Base IRRF Salário	2.394,08
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		143,58		B120 - Dedução IRRF Salário	208,92
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		47,86		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	208,92
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		143,58		B400 - Base FGTS Salário	2.394,08
1010 H. E. 50%	P	17:27	235,05		B410 - FGTS Salário 8%	191,53
5010 INSS				208,92	B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
					B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	615,27
Totais			2.394,08	208,92		
Líquido				2.185,16		
008011	Thiago Lucindo Ferreira	220:00	Auxiliar de Laboratório	19/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,18	21,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	963,43
0261 Intermitente Horas	I		562,32		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			137,63		B110 - Base IRRF Salário	963,43
0324 Férias Proporcionalis (Intermitente)	I		56,50		B120 - Dedução IRRF Salário	72,25
0329 1/3 s/ Férias Proporcionalis (Intermitent	I		18,83		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	72,25
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		56,50		B400 - Base FGTS Salário	963,43
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	77,07
1020 H. E. 70%	P	8:19	110,42		B900 - Remuneração Total Mês	562,32
5010 INSS				72,25	B905 - Salário Hora	7,81
					B920 - Base Salário Família	263,48
Totais			1.012,05	72,25	- Admitido em 19/05/2020	
Líquido				939,80		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4						
007944	Tiago Oliveira da Silva	220:00	Servente	16/03/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.544,40		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.809,34
0190 DSR s/ Salário Variável		6,05	42,73		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	7:36	90,70		B110 - Base IRRF Salário	1.191,58
1040 H. E. 100%	P	9:22	131,51		B120 - Dedução IRRF Salário	147,16
5010 INSS				147,16	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	147,16
5310 Adiantamento Salarial				617,76	B400 - Base FGTS Salário	1.809,34
5700 Vale Transporte				15,44	B410 - FGTS Salário 8%	144,75
					B900 - Remuneração Total Mês	1.544,40
					B903 - Salário Mês	1.544,40
Totais			1.809,34	780,36		
Líquido				1.028,98		
003495	Valdir dos Santos	220:00	Motorista de Caminhão I	15/01/2014	2	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
					B900 - Remuneração Total Mês	2.034,27
					B903 - Salário Mês	1.975,74
					B920 - Base Salário Família	2.034,27
					B939 - Base Premio Tempo Serviço	58,53
Totais					- Afastado desde: 23/08/2016 Motivo: Auxilio Doença	
Líquido						
E00085	Victor Varela Saluzi	150:00	Estagiário	27/04/2020	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0080 Bolsa Auxílio		30	1.600,00		B110 - Base IRRF Salário	960,00
5310 Adiantamento Salarial				640,00	B900 - Remuneração Total Mês	1.600,00
					B903 - Salário Mês	1.600,00
Totais			1.600,00	640,00		
Líquido				960,00		
008003	Victor Hugo Marques da Silva	220:00	Motorista de Caminhão I	29/04/2020	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		8,28	55,26		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.469,22
0261 Intermitente Horas	I		1.436,80		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			352,75		B110 - Base IRRF Salário	2.469,22
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		144,45		B120 - Dedução IRRF Salário	217,94
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		48,15		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	217,94
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		144,45		B400 - Base FGTS Salário	2.469,22
1010 H. E. 50%	P	21:20	287,36		B410 - FGTS Salário 8%	197,54
5010 INSS				217,94	B900 - Remuneração Total Mês	1.436,80
5110 IRRF				11,83	B905 - Salário Hora	8,98
Totais			2.469,22	229,77		
Líquido				2.239,45		
008015	Wallace Armando De Campos Pessoa	220:00	Motorista de Caminhão I	28/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		7,32	4,92		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	242,40
0261 Intermitente Horas	I		143,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			34,63		B110 - Base IRRF Salário	242,40
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		14,39		B120 - Dedução IRRF Salário	18,18
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		4,80		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	18,18
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		14,39		B400 - Base FGTS Salário	242,40
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	19,39
1010 H. E. 50%	P	1:54	25,59		B900 - Remuneração Total Mês	143,68
5010 INSS				18,18	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	64,09
Totais			291,02	18,18	- Admitido em 28/05/2020	
Líquido				272,84		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP4						
008014	Wallace Martins Bispo Santos	220:00	Motorista de Caminhão I	27/05/2020	1	2
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		6,58	6,82		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	359,42
0261 Intermitente Horas	I		215,52		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
0268 Descanso Semanal Remunerado			51,35		B110 - Base IRRF Salário	359,42
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		21,54		B120 - Dedução IRRF Salário	26,95
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		7,18		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	26,95
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		21,54		B400 - Base FGTS Salário	359,42
0400 Salário Família		1	48,62		B410 - FGTS Salário 8%	28,75
1010 H. E. 50%	P	2:38	35,47		B900 - Remuneração Total Mês	215,52
5010 INSS				26,95	B905 - Salário Hora	8,98
					B920 - Base Salário Família	92,55
		Totais	408,04	26,95	- Admitido em 27/05/2020	
		Líquido		381,09		
007976	Weverson da Silva Luiz	220:00	Vigia	20/04/2020	5	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		5,12	33,49		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.514,86
0191 DSR s/ Adicional Noturno		4,55	31,68		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0261 Intermitente Horas	I		1.416,96		B110 - Base IRRF Salário	2.514,86
0268 Descanso Semanal Remunerado			359,27		B120 - Dedução IRRF Salário	223,42
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		143,37		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	223,42
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		47,79		B400 - Base FGTS Salário	2.514,86
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		143,37		B410 - FGTS Salário 8%	201,19
1040 H. E. 100%	P	11:48	174,17		B900 - Remuneração Total Mês	1.416,96
1050 Adicional Noturno 20,0%	P	127:55	164,76		B905 - Salário Hora	7,38
5010 INSS				223,42	B920 - Base Salário Família	738,63
5110 IRRF				14,84		
		Totais	2.514,86	238,26		
		Líquido		2.276,60		
007981	Willians Goncalves Martins	220:00	Servente	22/04/2020	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0190 DSR s/ Salário Variável		16,30	84,27		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.236,96
0261 Intermitente Horas	I		1.123,20		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
0268 Descanso Semanal Remunerado			319,57		B110 - Base IRRF Salário	2.236,96
0324 Férias Proporcionais (Intermitente)	I		116,46		B120 - Dedução IRRF Salário	190,07
0329 1/3 s/ Férias Proporcionais (Intermitente)	I		38,82		B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	190,07
0354 13o. Proporcional (Intermitente)	I		116,46		B400 - Base FGTS Salário	2.236,96
1020 H. E. 70%	P	36:43	438,18		B410 - FGTS Salário 8%	178,96
5010 INSS				190,07	B900 - Remuneração Total Mês	1.123,20
					B905 - Salário Hora	7,02
					B920 - Base Salário Família	794,19
		Totais	2.236,96	190,07		
		Líquido		2.046,89		
001249	Winder Diego Pereira	220:00	Técnico em Segurança no Trabalho	16/05/2011	1	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.722,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.131,67
0190 DSR s/ Salário Variável		18,22	227,33		B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
1020 H. E. 70%	P	32:14	677,83		B110 - Base IRRF Salário	3.042,78
1040 H. E. 100%	P	20:23	504,28		B120 - Dedução IRRF Salário	437,38
5010 INSS				437,38	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	437,38
5110 IRRF				38,39	B400 - Base FGTS Salário	4.131,67
5120 IRRF s/ Adiantamento				78,72	B410 - FGTS Salário 8%	330,53
5310 Adiantamento Salarial				1.010,17	B900 - Remuneração Total Mês	2.722,23
5700 Vale Transporte				27,22	B903 - Salário Mês	2.722,23
					B920 - Base Salário Família	4.131,67
		Totais	4.131,67	1.591,88		
		Líquido		2.539,79		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4 [Contrato: 00.200]						
007858	Clezivaldo Santos Freitas	220:00	Auxiliar Administrativo	04/02/2019	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	1.457,07		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.900,52
0200 Férias		7	443,45		B020 - Base INSS Salário (Ant)	443,45
5005 INSS Férias				33,25	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	33,25
5010 INSS				122,11	B110 - Base IRRF Salário	696,86
5310 Adiantamento Salarial				760,21	B120 - Dedução IRRF Salário	122,11
5330 Adiantamento Férias				410,20	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	122,11
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	33,25
					B210 - Base IRRF Férias	443,45
					B220 - Dedução IRRF Férias	33,25
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	443,45
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	33,25
					B400 - Base FGTS Salário	1.900,52
					B410 - FGTS Salário 8%	152,04
					B900 - Remuneração Total Mês	1.900,52
					B903 - Salário Mês	1.900,52
					- Em Férias de: 18/05/2020 até 24/05/2020	
		Totais	1.900,52	1.325,77		
		Líquido		574,75		
007735	Fabricio Aurelio da Silva Barros	220:00	Pedreiro	21/03/2018	0	1
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.728,93		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.074,72
0200 Férias		5	345,79		B020 - Base INSS Salário (Ant)	345,79
5005 INSS Férias				25,93	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	25,93
5010 INSS				145,11	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5310 Adiantamento Salarial				829,89	B101 - Dependentes IRRF Fer	189,59
5330 Adiantamento Férias				319,86	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
					B110 - Base IRRF Salário	899,04
					B120 - Dedução IRRF Salário	145,11
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	145,11
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	25,93
					B210 - Base IRRF Férias	345,79
					B220 - Dedução IRRF Férias	25,93
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	345,79
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	25,93
					B400 - Base FGTS Salário	2.074,72
					B410 - FGTS Salário 8%	165,98
					B900 - Remuneração Total Mês	2.074,72
					B903 - Salário Mês	2.074,72
					- Em Férias de: 18/05/2020 até 22/05/2020	
		Totais	2.074,72	1.320,79		
		Líquido		753,93		
000011	Marcelo Vidal de Negreiros	220:00	Pedreiro	01/11/2002	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	1.106,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.074,72
0200 Férias		14	968,20		B020 - Base INSS Salário (Ant)	968,20
5005 INSS Férias				72,61	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	72,61
5010 INSS				98,43	B110 - Base IRRF Salário	276,63
5310 Adiantamento Salarial				829,89	B120 - Dedução IRRF Salário	98,43
5330 Adiantamento Férias				895,59	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	98,43
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	72,61
					B210 - Base IRRF Férias	968,20
					B220 - Dedução IRRF Férias	72,61
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	1.313,99
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	98,54
					B400 - Base FGTS Salário	2.074,72
					B410 - FGTS Salário 8%	165,98
					B900 - Remuneração Total Mês	2.074,72
					B903 - Salário Mês	2.074,72
					- Em Férias de: 18/05/2020 até 31/05/2020	
		Totais	2.074,72	1.896,52		
		Líquido		178,20		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero Nome Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
00.211 - Pavimenta Rio AP'4 [Contrato: 00.200]

007821 Romario Nunes Gomes da Silva 220:00 Servente 07/12/2018 0 1

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		25	1.252,71		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.503,25
0200 Férias		5	250,54		B020 - Base INSS Salário (Ant)	250,54
5005 INSS Férias				18,79	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	18,79
5010 INSS				100,82	B100 - Dependentes IRRF Sal	189,59
5310 Adiantamento Salarial				601,30	B101 - Dependentes IRRF Fer	189,59
5330 Adiantamento Férias				231,75	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	189,59
					B110 - Base IRRF Salário	651,41
					B120 - Dedução IRRF Salário	100,82
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	100,82
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	18,79
					B210 - Base IRRF Férias	250,54
					B220 - Dedução IRRF Férias	18,79
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	501,08
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	37,58
					B400 - Base FGTS Salário	1.503,25
					B410 - FGTS Salário 8%	120,26
					B900 - Remuneração Total Mês	1.503,25
					B903 - Salário Mês	1.503,25
		Totais	1.503,25	952,66	- Em Férias de: 18/05/2020 até 22/05/2020	
		Líquido		550,59		

003586 Romildo Herminio dos Santos 220:00 Servente 11/02/2014 0 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		23	1.152,49		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.503,25
0200 Férias		7	350,76		B020 - Base INSS Salário (Ant)	350,76
5005 INSS Férias				26,30	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	26,30
5010 INSS				93,31	B110 - Base IRRF Salário	551,19
5310 Adiantamento Salarial				601,30	B120 - Dedução IRRF Salário	93,31
5330 Adiantamento Férias				324,46	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	93,31
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	26,30
					B210 - Base IRRF Férias	350,76
					B220 - Dedução IRRF Férias	26,30
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	350,76
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	26,30
					B400 - Base FGTS Salário	1.503,25
					B410 - FGTS Salário 8%	120,26
					B900 - Remuneração Total Mês	1.503,25
					B903 - Salário Mês	1.503,25
		Totais	1.503,25	1.045,37	- Em Férias de: 18/05/2020 até 24/05/2020	
		Líquido		457,88		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4 [Contrato: 00.201]						
001991	Carlos Antonio da Fonseca	220:00	Pedreiro	06/07/2012	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	1.106,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.074,72
0200 Férias		14	968,20		B020 - Base INSS Salário (Ant)	968,20
5005 INSS Férias				72,61	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	72,61
5010 INSS				98,43	B110 - Base IRRF Salário	276,63
5310 Adiantamento Salarial				829,89	B120 - Dedução IRRF Salário	98,43
5330 Adiantamento Férias				895,59	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	98,43
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	72,61
					B210 - Base IRRF Férias	968,20
					B220 - Dedução IRRF Férias	72,61
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	1.867,25
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	140,03
					B400 - Base FGTS Salário	2.074,72
					B410 - FGTS Salário 8%	165,98
					B900 - Remuneração Total Mês	2.074,72
					B903 - Salário Mês	2.074,72
		Totais	2.074,72	1.896,52	- Em Férias de: 18/05/2020 até 31/05/2020	
		Líquido		178,20		
004139	Phillip de Oliveira Pinheiro	220:00	Auxiliar Administrativo	19/05/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.900,52		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.900,52
5010 INSS				155,36	B110 - Base IRRF Salário	1.140,31
5310 Adiantamento Salarial				760,21	B120 - Dedução IRRF Salário	155,36
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	155,36
					B400 - Base FGTS Salário	1.900,52
					B410 - FGTS Salário 8%	152,04
					B900 - Remuneração Total Mês	1.900,52
					B903 - Salário Mês	1.900,52
		Totais	1.900,52	915,57		
		Líquido		984,95		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero Nome Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda
00.211 - Pavimenta Rio AP'4 [Contrato: 00.208]

007324 Alexandre da Conceicao Marques 220:00 Servente 09/03/2017 0 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	801,73		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.508,35
0200 Férias		14	706,62		B020 - Base INSS Salário (Ant)	706,62
5005 INSS Férias				52,99	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	52,99
5010 INSS				67,08	B110 - Base IRRF Salário	200,43
5310 Adiantamento Salarial				601,30	B120 - Dedução IRRF Salário	67,08
5330 Adiantamento Férias				653,63	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	67,08
					B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	52,99
					B210 - Base IRRF Férias	706,62
					B220 - Dedução IRRF Férias	52,99
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	1.413,24
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	105,98
					B400 - Base FGTS Salário	1.508,35
					B410 - FGTS Salário 8%	120,67
					B900 - Remuneração Total Mês	1.503,25
					B903 - Salário Mês	1.503,25
Totais			1.508,35	1.375,00	- Em Férias de: 18/05/2020 até 31/05/2020	
Líquido				133,35		

000249 Gilberto Augusto Ferro Costa Assumpcao 150:00 Engenheiro de Segurança do Trabalho 04/05/2009 0 2

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	10.115,06		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	10.115,06
3073 Reembolso de despesas com quilomet			1.577,00		B100 - Dependentes IRRF Sal	379,18
5010 INSS				713,09	B103 - Dependentes IRRF Sal(Ant)	379,18
5110 IRRF				499,25	B104 - Dependentes IRRF Fe(Ant)	379,18
5120 IRRF s/ Adiantamento				195,23	B110 - Base IRRF Salário	6.069,04
5310 Adiantamento Salarial				3.850,79	B120 - Dedução IRRF Salário	713,09
5350 Adiantamento de Folha	G			1.577,00	B150 - Base IRRF Salário(Ant)	4.046,02
					B170 - IRRF s/ Salário (Ant)	195,23
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	713,09
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	5.394,70
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	193,29
					B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	456,75
					B400 - Base FGTS Salário	10.115,06
					B410 - FGTS Salário 8%	809,20
					B900 - Remuneração Total Mês	10.115,06
					B903 - Salário Mês	10.115,06
Totais			11.692,06	6.836,36		
Líquido				4.856,70		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimentação Rio AP'4 [Contrato: 01.178]						
001274	Pedro Ivo Basilio Alves	220:00	Técnico em Segurança no Trabalho	01/06/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	2.722,23		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	2.722,23
5010 INSS				248,30	B110 - Base IRRF Salário	1.633,34
5310 Adiantamento Salarial				1.088,89	B120 - Dedução IRRF Salário	248,30
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	248,30
					B400 - Base FGTS Salário	2.722,23
					B410 - FGTS Salário 8%	217,78
					B900 - Remuneração Total Mês	2.722,23
					B903 - Salário Mês	2.722,23
		Totais	2.722,23	1.337,19		
		Líquido		1.385,04		
004950	Rafael Da Anunciacao Barros	220:00	Auxiliar de Engenharia	15/09/2014	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	3.148,47		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	3.148,47
5010 INSS				299,73	B110 - Base IRRF Salário	1.889,08
5120 IRRF s/ Adiantamento				72,51	B120 - Dedução IRRF Salário	299,73
5310 Adiantamento Salarial				1.186,88	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	299,73
					B400 - Base FGTS Salário	3.148,47
					B410 - FGTS Salário 8%	251,88
					B900 - Remuneração Total Mês	3.148,47
					B903 - Salário Mês	3.148,47
		Totais	3.148,47	1.559,12		
		Líquido		1.589,35		
000435	Samuel Jose Acioli	220:00	Encarregado de Obras II	10/08/2009	1	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	2.397,88		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.496,02
0200 Férias		14	2.098,14		B020 - Base INSS Salário (Ant)	2.098,14
1510 Insuficiência de Saldo			132,09		B030 - INSS s/ Salário (Ant)	173,41
5005 INSS Férias				173,41	B110 - Base IRRF Salário	599,47
5010 INSS				314,98	B120 - Dedução IRRF Salário	731,56
5210 Pensão s/ Salário				416,58	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	314,98
5230 Pensão s/ Férias				384,95	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	173,41
5310 Adiantamento Salarial				1.798,41	B210 - Base IRRF Férias	2.098,14
5330 Adiantamento Férias				1.539,78	B220 - Dedução IRRF Férias	558,36
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	3.297,08
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	863,99
					B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	39,68
					B400 - Base FGTS Salário	4.496,02
					B410 - FGTS Salário 8%	359,68
					B900 - Remuneração Total Mês	4.496,02
					B903 - Salário Mês	4.496,02
					B920 - Base Salário Família	4.496,02
		Totais	4.628,11	4.628,11	- Em Férias de: 18/05/2020 até 31/05/2020	
		Líquido		0,00		

Folha de Pagamento 05/2020

08/07/2020 15:45

Numero Nome Jorn. Cargo Admissão SF IR

3 Dimensional Engenharia Ltda

00.211 - Pavimenta Rio AP'4 [Contrato: 90.10]

000483 Vinicius Martingil Pereira 220:00 Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho 14/09/2009 0 0

Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		16	2.238,91		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	4.199,08
0200 Férias		14	1.960,17		B020 - Base INSS Salário (Ant)	1.960,17
5005 INSS Férias				160,73	B030 - INSS s/ Salário (Ant)	160,73
5010 INSS				286,09	B110 - Base IRRF Salário	559,73
5120 IRRF s/ Adiantamento				195,30	B120 - Dedução IRRF Salário	286,09
5310 Adiantamento Salarial				1.483,88	B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	286,09
5330 Adiantamento Férias				1.799,44	B190 - INSS para Dedução de IRRF s/ Férias	160,73
					B210 - Base IRRF Férias	1.960,17
					B220 - Dedução IRRF Férias	160,73
					B250 - Base IRRF Férias(Ant)	4.620,00
					B260 - Dedução IRRF Férias(Ant)	373,91
					B270 - IRRF s/ Férias (Ant)	184,88
					B400 - Base FGTS Salário	4.199,08
					B410 - FGTS Salário 8%	335,93
					B900 - Remuneração Total Mês	4.197,96
					B903 - Salário Mês	4.197,96
Totais			4.199,08	3.925,44	- Em Férias de: 23/05/2020 até 31/05/2020	
Líquido				273,64	- Em Férias de: 18/05/2020 até 22/05/2020	

Numero	Nome	Jorn.	Cargo	Admissão	SF	IR
3 Dimensional Engenharia Ltda						
00.211 - Pavimenta Rio AP'4 [Contrato: 90.50]						
001339	Ivanilza Nunes dos Santos	220:00	Auxiliar de Serviços Gerais	13/07/2011	0	0
Eventos	I	Qtde	Provento	Desconto	Bases	Total
0001 Salário		30	1.491,44		B010 - Base INSS Salário (S/Limite)	1.491,44
5010 INSS				118,54	B110 - Base IRRF Salário	894,86
5310 Adiantamento Salarial				596,58	B120 - Dedução IRRF Salário	118,54
					B180 - INSS para Dedução de IRRF Salário	118,54
					B400 - Base FGTS Salário	1.491,44
					B410 - FGTS Salário 8%	119,32
					B900 - Remuneração Total Mês	1.491,44
					B903 - Salário Mês	1.491,44
		Totais	1.491,44	715,12		
		Líquido		776,32		

Rio de Janeiro, 08 de JUNHO de 2020.

PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO SALÁRIO E O VALE TRANSPORTE
REF.: 01ª MEDICAÇÃO – 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERÍODO DE 28/04/2020 a 13/05/2020

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 024/2020 referente aos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, PROCESSO Nº. 06/300.120/2020 vem pela presente, declarar, que os SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE referente aos meses MARÇO E ABRIL DE 2020, encontram-se devidamente fornecidos e pagos aos empregados, apesar de os VALES TRANSPORTES não serem remunerados nas medições.

Atenciosamente,



Dimensional Engenharia Ltda

Edson Macedo
Administrativo
07570/7041FP



Rio de Janeiro, 08 de JUNHO de 2020.

PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO
REF.: 01ª MEDICAÇÃO – 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERÍODO DE 28/04/2020 a 13/05/2020

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 024/2020 referente aos “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, PROCESSO Nº. 06/300.120/2020 vem pela presente, declarar, que o TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO referente aos meses de MARCO E ABRIL DE 2020, encontram-se devidamente quitados, apesar de não remunerados nas medições.

Atenciosamente,

Dimensional Engenharia Ltda.


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Edson Inácio
Administrativo
06/300.120/2020

24

Rio de Janeiro, 08 de JUNHO de 2020.

PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E
CONSERVAÇÃO
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICO-OPERACIONAL
COORDENADORIA GER4AL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
RIO DE JANEIRO - RJ

REF.: “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”.
PROCESSO Nº 06/300.120/2020 – CONTRATO Nº 024/2020.

Assunto: DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE NA PRESTAÇÃO DOS
SERVICOS OBSERVOU INTEGRALMENTE AS CLÁUSULAS
01ª MEDICÃO – 01ª ETAPA INTERMEDIÁRIA
PERÍODO DE 28/04/2020 a 13/05/2020

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, representada por EDSON FRANCISCO NEVES DE MACEDO, portador da carteira de identidade nº 07570270-4 DETRAN-RJ e CPF/MF nº 891.962.017-20, declara que na prestação da “SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP.4. – PROGRAMA PAVIMENTA RIO”, realizados no período de 14/05/2020 a 26/06/2020, foram observadas as cláusulas trabalhistas constantes ao Contrato nº. 024/2020 do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/300.120/2020.

Atenciosamente,


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
Edson Macedo
Administrativo
07570270-4 IPR



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente

ANEXO II

DECLARAÇÃO DA CONTRATADA EM PROCESSO DE FATURAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

DECLARAÇÃO

Dimensional Engenharia Ltda, CNPJ 00.279.906/0003-60
(Empresa Contratada) (Inscrição)

estabelecida à Rua São Sebastião nº 98 62.605
(Endereço completo)

representada por Edson Macedo
(Responsável legal da Empresa Contratada)

RG/CPF 0650284/191962018-2 declara que na prestação dos serviços
(Registro / Inscrição)

realizados no período de 28 / 04 / 2020 a 13 / 05 / 2020

foram observadas as cláusulas trabalhistas constantes no Contrato nº 4 / 2020

do processo administrativo nº 06 / 300 / 1201 / 2020

Rio, 08 de Setembro de 2020
(Local e Data)

Representante legal da Contratada
(Carimbo da Empresa Contratada)

Edson Macedo
Administrativo
0870704-1/SP




**PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação - SMIHC
Subsecretaria de Conservação

ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 01/06

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
01	<p>FATURA E FOLHA DE MEDIÇÃO:</p> <p>a) Estão atestadas por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo) para serviços de área técnica ou para Contrato acima de R\$ 80.000,00, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indicam o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>c) Estão atestadas (assinatura e carimbo) nos campos Confere, Coordenador Geral e/ou Visto, respectivamente, pelo servidor que as conferiu (Conferente) e pelo Coordenador Geral ou Responsável/Substituto autorizado/nomeado (hierarquicamente superior aos fiscais), conforme Resolução SMO nº 169/1980.</p>	03 - 06
02	<p>NOTA FISCAL:</p> <p>a) Tem a indicação da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e do CNPJ 042.498.733/0001-48 como Tomador dos Serviços.</p> <p>b) Tem data de emissão que favorece o recolhimento da retenção do INSS, em tempo hábil, pela Secretaria Municipal de Fazenda, para que se evite incidência de juros a serem pagos pelo Município, tendo em vista o prazo para cumprimento da retenção legal de recolhimento até dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento fiscal, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia.</p> <p>c) No caso de Nota Fiscal Eletrônica, foi verificada a sua autenticidade junto ao site do respectivo Município.</p> <p>d) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>e) Está atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo) para serviços de área técnica ou para Contrato acima de R\$ 80.000,00, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>f) Foi verificada a situação cadastral do prestador de serviço de outro município no CEPOM, quando aplicável, através do site http://dief.rio.gov.br/cepom, quanto ao ISS.</p>	04
03	<p>QUADRO/JUSTIFICATIVA COMPROVANDO BASE DE CÁLCULO DO INSS QUANDO RETIDO A MENOR NA NOTA FISCAL (VALORES/ITENS REF. MÃO DE OBRA) OU ISENTO DE RETENÇÃO (QUANDO SÓ EQUIPAMENTO) – INFRN Nº 971/09 ART. 121:</p> <p>a) Está juntado e assinado pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	—


Dolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6


Eng. Susana Helena Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

MUNICÍPIO DE ALEMANSTRO GRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MAY - 11/118129-5
C/A 89-1-20229-7

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 02/06

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
04	<p>BOLETIM DE DESEMPENHO:</p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o nome dos fiscais, o nº do boletim, nº da medição, o nº da etapa, o objeto e o nº do Contrato.</p> <p>c) Está preenchido devidamente com as notas conceituais, o índice de desempenho da etapa e a justificativa para os conceitos aplicados.</p> <p>d) Está assinado pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p>	08 81 - 92
05	<p>NOTA(S) DE EMPENHO(S) INDICADA(S) PARA O PRESENTE FATURAMENTO:</p> <p>a) Tem saldo suficiente para atender o valor total da presente medição.</p> <p>b) Tem como favorecido, o emitente dos documentos comprobatórios da cobrança.</p> <p>c) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p>	09
06	<p>MEMORANDO DE INÍCIO OU COMUNICAÇÃO DE INÍCIO:</p> <p>a) Cópia está juntada.</p>	10
07	<p>CRONOGRAMA VIGENTE:</p> <p>a) Cópia está juntada.</p>	11
08	<p>QUADRO RESOLUÇÃO SMO Nº 169/80 (ELEMENTOS DA MEDIÇÃO, LOGRADOUROS BENEFICIADOS NA MEDIÇÃO E VALORES POR AP):</p> <p>a) Está devidamente preenchido, com as quantidades relacionadas aos respectivos logradouros beneficiados pela execução dos serviços, correspondente à medição apresentada e de acordo com os elementos orçados no contrato.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>c) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	12 - 17
09	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:</p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p>	18 - 21
10	<p>RESUMO DOS VALORES UTILIZADOS POR AP OU POR USINA DE ASFALTO, CONFORME O CASO:</p> <p>a) Está atestado por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p> <p>b) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p>	22

1020 / *Alcides da Silva Junior*
Engenheiro Civil
CREA-RJ:181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Eng. Sílvia Maria Diniz
Matrícula 11/268.112-1
CREA-RJ 2009110807

SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E ENERGIA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
Matr. 11/181.225-5
11/241.313-6

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
11	<p>NOTA(S) FISCAL(IS), RELATIVAS(S) AO(S) MATERIAL(IS) DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO(S) E/OU A(S) FERRAMENTA(S) E EQUIPAMENTO(S) ALUGADO(S), QUE COMPROVE(M) AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO PROJETO APROVADO E ORÇADO, CONFORME ART. 1º, DO DECRETO RIO Nº 43.189/2017:</p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Foi verificada a autenticidade de cada documento apresentado e a de seu emitente.</p>	23-26 83-85
12	<p>DECLARAÇÃO ATESTANDO A ADEQUADA APLICAÇÃO DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 2º, DO DECRETO RIO Nº 43.189/2017:</p> <p>a) Está juntada e foi atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	27-28
13	<p>DOCUMENTO DE CONSULTA PARA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EXTRAÍDO DO SITE DA RECEITA FEDERAL:</p> <p>a) Consta o documento obtido no site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/.</p>	29
14	<p>PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCAIS/ATESTADORES:</p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) de designação dos fiscais ou servidores que atestam a presente despesa.</p>	30
15	<p>PUBLICAÇÃO DO EXTRATO CONTRATUAL E DE TERMOS ADITIVOS EXISTENTES:</p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) autorizativo(s).</p>	31-33
16	<p>PUBLICAÇÃO DE SUSPENSÕES E DE REINÍCIOS DE CONTAGEM DE PRAZO AUTORIZADAS:</p> <p>a) Consta(m) cópia(s) da(s) publicação(ões) do(s) ato(s) autorizativo(s).</p>	-
17	<p>INSCRIÇÃO DE MATRÍCULA CEI, conforme o caso:</p> <p>a) Cópia está juntada.</p> <p>b) Está preenchida adequadamente aos serviços contratados.</p>	34
18	<p>DECLARAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DOS VALORES DA FATURA, para o caso de MATRÍCULA CEI:</p> <p>a) Está assinada pelo CONTADOR (CARIMBO/CRC) e pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificados.</p>	35
19	<p>GARANTIA CONTRATUAL E ENDOSSOS COBRINDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL:</p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p>	36-43

João Adolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Eng. Sérgio Wilson Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807


ALVARO S. DE ALENCASTRO BRAGA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Matr. 11/119128-5
CREA-RJ 2009110807

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa
(nome/cargo/matricúla dos servidores designados)


ANEXO I DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 05 DE 23 DE MAIO DE 2018 – PÁGINA 04/06

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
20	<p>RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA QUE ATUARAM NA MEDIÇÃO (INDICANDO NOME E FUNÇÃO):</p> <p>a) Está juntada e as funções descritas tem especificação no orçamento autorizado;</p> <p>b) No caso de ausência de algum nome nas Guias de Recolhimento e Folha de Pagamento, a Contratada apresentou justificativa para a ausência/divergência entre esses documentos e a Relação apresentada.</p> <p>c) Indica o período da medição, a etapa, o objeto, nº do Contrato e nº do processo instrutivo.</p> <p>d) Foi assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.</p> <p>e) Foi atestada por, no mínimo, 03 (três) atestadores (assinatura e carimbo), formalmente designados, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011.</p>	44 - 45
21	<p>GUIA FGTS (GFIP), PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXCETO COMPROVANTE VIA INTERNETBANK, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO PRAZO DE RECOLHIMENTO:</p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s).</p> <p>b) Foram verificadas as informações constantes na(s) GUIA(S) apresentada(s), incluindo a identificação numérica e/ou código de barras entre a(s) GUIA(S) e seus respectivos comprovantes de pagamento.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de guia do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Folha de Pagamento de Trabalhadores do mês anterior, agrupando-o por mês cronologicamente.</u></p>	46 - 48
22	<p>GUIA GPS (INSS), PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, EXCETO COMPROVANTE VIA INTERNETBANK, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO DE RECOLHIMENTO. NO CASO DE MATRÍCULA CEI, A GUIA DEVE ESTAR SOB O Nº INSCRIÇÃO DA MATRÍCULA CEI:</p> <p>a) Cópia(s) está(ão) juntada(s) – Caso o valor recolhido na GUIA divergir ao valor indicado na GPS emitida pela SEFIP, a Contratada deverá juntar Declaração com justificativa.</p> <p>b) Foram verificadas as informações constantes na(s) GUIA(S) apresentada(s), incluindo a identificação numérica e/ou código de barras entre a(s) GUIA(S) e seus respectivos comprovantes de pagamento.</p> <p>c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de guia do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Guia FGTS do mês da medição, agrupando-o por mês cronologicamente.</u></p>	49 - 53


 Adolpho da Silva Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA-RJ: 181.591/D
 Matr. 11/241.313-6


 Eng. Susana Viana Bittencourt
 Matrícula 11/268.112-0
 CREA-RJ 2009110807


 Eng. G. DE LENCINSKI
 Matr. 11/110128-5
 CREA-RJ 2009110807

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa
 (nome/cargo/matricula dos servidores designados)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
23	PROTOCOLO DE ENVIO DA(S) SEFIP(S), ESPECÍFICA(S) DA(S) SEFIP(S) APRESENTADA(S): a) Cópia(s) está(ão) juntada(s). b) Caso de obrigatoriedade de apresentação de Protocolo de Envio do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da Guia GPS do mês da medição, agrupando-o por mês cronologicamente.</u>	<i>4</i>
24	SEFIP COM TOMADOR EM NOME E CNPJ DA PREFEITURA, PAGA E AUTENTICADA EM CARTÓRIO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO; E REFERENTE AO MÊS DA MEDIÇÃO, QUANDO JÁ VENCIDO O PRAZO DE RECOLHIMENTO. COM ATENÇÃO À INSCRIÇÃO, PARA O CASO DE MATRÍCULA CEI: a) Cópia(s) está(ão) juntada(s) e tem a indicação do CNPJ 042.498.733/0001-48, exceto para caso com Matrícula CEI. b) Caso de obrigatoriedade de apresentação de SEFIP do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir do Protocolo de Envio do mês da medição, agrupando-o por mês cronologicamente.</u>	<i>55-61</i>
25	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES (FOLHA DE SALÁRIOS): a) Cópia está juntada, considerando uma Folha de Pagamento para cada competência de Guias GPS/FGTS apresentadas no presente processo. b) Demonstra o respectivo pagamento mensal dos funcionários indicados na Relação dos Funcionários, que atuaram no período da medição. c) Caso de obrigatoriedade de apresentação de Folha de Pagamento do mês da medição, <u>o documento deverá ser juntado a partir da SEFIP do mês da medição, agrupando-o por mês cronologicamente.</u>	<i>62-66</i>
26	DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE OS SALÁRIOS E O VALE-TRANSPORTE DOS EMPREGADOS, REFERENTES AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO OU AO PERÍODO DA MEDIÇÃO, ENCONTRAM-SE PAGOS: a) Está juntada, devidamente preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.	<i>67</i>
27	DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE O TÍQUETE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS ANTERIOR DA MEDIÇÃO OU AO PERÍODO DA MEDIÇÃO FOI FORNECIDO AOS EMPREGADOS, NO CASO DE ACORDO: a) Está juntada, devidamente preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.	<i>68</i>
28	DECLARAÇÃO DA CONTRATADA DE QUE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBSERVOU INTEGRALMENTE AS CLÁUSULAS TRABALHISTAS CONSTANTES NO CONTRATO (CONFORME ANEXO II DA PORTARIA "N" SECONSERMA Nº 02/2018): a) Está juntada, preenchida e assinada pelo Representante Legal da Empresa Contratada, devidamente identificado.	<i>69-80</i>
29	PUBLICAÇÃO DA RELEVAÇÃO DA MULTA NOS CASOS JUSTIFICADOS EM QUE OS SERVIÇOS NÃO ALCANÇEM 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR PREVISTO DA ETAPA: a) Cópia da publicação está juntada.	<i>-</i>

Eng.º A. Adolpho da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

Eng.º Sílvia Helena Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

MURCIO A. DE ALENCASTRO BRAGA
Matrícula 11/10128-5
CREA-RJ 2009110807

Comissão de Fiscalização/Atestadores da Despesa
(nome/cargo/matricula dos servidores designados)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS DO PROCESSO DE FATURAMENTO
COM USO DE MÃO DE OBRA DE PESSOA JURÍDICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	CONFIRMAÇÃO INDICAR FLS.
30	PUBLICAÇÃO DE ATOS RELATIVOS A RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, NO CASO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. a) Cópia(s) da(s) publicação(ões) está(ão) juntada(s).	—

Observação: A Comissão de Fiscais/Atestadores realizará, quando aplicável, por amostragem, entrevista junto aos empregados relacionados na medição, de modo a verificar se a empresa está fazendo o depósito do FGTS, informando que solicitou cópia do respectivo Extrato de Conta do Fundo de Garantia ao empregado, em atendimento à Circular CGM nº 003/2018.

DECLARAMOS A CONFORMIDADE dos documentos apresentados e das informações neles contidas, estando a presente despesa em condições de prosseguimento à liquidação, de acordo com o inciso I, artigo 120 do Decreto n.º 3.221/1981, alterado pelo Decreto nº 22.318/2002.

Em 08/07/2020

Roberto da Silva Júnior
Roberto da Silva Júnior
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 181.591/D
Matr. 11/241.313-6

SJA
Eggs Susanna Maria Bittencourt
Matrícula 11/268.112-0
CREA-RJ 2009110807

MUNICÍPIO DE ALMOGATINS GRACIA
SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO
Matr. 11/110128-5
11/241.313-6

Dimensional - Fernando Santos

De: Dimensional - Fernando Santos
Enviado em: quinta-feira, 28 de maio de 2020 11:41
Para: pavimentarioap4@dimensionalengenharia.com; Joao Adolpho;
susanabittencourt.cgo@gmail.com; leocavalcanti@yahoo.com.br;
mauriciograca@hotmail.com
Assunto: Medição 1 Etapa Intermediária
Anexos: 1ª MEDIÇÃO - ETAPA 1 INTERMEDIARIA.pdf

A Comissão de Fiscalização:

Segue Medição dos serviços executados compreendidos entre os dias 28/04 a 13/05, para vossa apreciação.

Gostaria de salientar que a empresa conta com sistema de assinatura digital e, que diante das dificuldades de aproximação devido a pandemia do novo Coronavírus, disponibilizamos aos senhores, a ferramenta de forma a mitigar possíveis riscos. Lembrando ainda que na assinatura do nosso contrato, foi utilizado esse sistema.

Atenciosamente,

Fernando J. A. dos Santos
GUN - Gestor de Unidade de Negócio
(21) 35445800 / (21) 99825-4906



MEDIÇÃO 1

1ª ETAPA - INTERMEDIÁRIA

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Obra/Serviço: S SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

Código: 6.150

Processo: 0006/300120/2020

Contrato: 024/2020

IO: Dez./ 2019

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Prazo Inicial: 180 dias corridos

Prorrogações: 0 dias corridos

Total: 180 dias corridos

1ª Medição, 1ª Etapa - Intermediária, Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

INDICE

- DOC. 1 BOLETIM DE MEDIÇÃO
- DOC. 2 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
- DOC. 3 DIÁRIO DE OBRAS
- DOC. 4 MEMÓRIA DE CÁLCULO
- DOC. 5 PROJETOS DE APROPRIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS BASEADO NO PROJETO TOPOGRÁFICO
- DOC. 6 MAPAS DE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE
- DOC. 7 PROJETO EXECUTIVO

Obra/Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMHC**
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO
 Código: **6.150**
 Processo: **0006/300.120/2020**
 Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020
 Prorrogações: 0 dias corridos
 Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10 de Dez/ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO					SALDO A REALIZAR		
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
MT - MOVIMENTO DE TERRA														
1	MT 04.05.0050 (/)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO)	M3	231,00	28,77	6.645,87	-	-	-	-	-	-	231,00	6.645,87
2	MT 14.05.0300 (/)	REATERRO DE VALA, COM PÓ-DE-PEDRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	132,00	106,89	14.109,48	-	-	-	-	-	-	132,00	14.109,48
						TOTAL DA CATEGORIA								20.755,35
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA														
3	TC 04.05.0700 (/)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MÉDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	2.965.061,25	0,49	1.452.880,01	-	-	-	-	-	-	2.965.061,25	1.452.880,01
4	TC 09.05.0150 (/)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL À GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	2.033,25	19,28	39.201,06	-	-	-	-	-	-	2.033,25	39.201,06
5	TC 09.05.0700 (/)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	2.033,25	15,96	32.450,67	723,22	11.542,52	-	-	723,22	11.542,52	1.310,03	20.908,15
						TOTAL DA CATEGORIA		11.542,52					11.542,52	1.512.989,22
SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES														
6	SC 04.05.0850 (/)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DO SERVIÇO.(DESONERADO)	M3	33,00	198,35	6.545,55	-	-	-	-	-	-	33,00	6.545,55
7	SC 04.10.0050 (/)	ARRANCAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLARI).(DESONERADO)	UN	80,00	46,37	3.709,60	-	-	-	-	-	-	80,00	3.709,60
8	SC 04.10.0300 (/)	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS.(DESONERADO)	M3	862,50	215,50	185.868,75	-	-	-	-	-	-	862,50	185.868,75
9	SC 09.05.0900 (/)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	19,86	88.178,40	370,00	7.348,20	-	-	370,00	7.348,20	4.070,00	80.830,20
10	SC 09.05.1100 (/)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	22,32	99.100,80	370,00	8.258,40	-	-	370,00	8.258,40	4.070,00	90.842,40
11	SC 09.05.1200 (/)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	8.880,00	21,38	189.854,40	-	-	-	-	-	-	8.880,00	189.854,40
12	SC 09.05.1450 (/)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	26.640,00	14,38	383.083,20	2.775,00	39.904,50	-	-	2.775,00	39.904,50	23.865,00	343.178,70
13	SC 09.10.0100 (/)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JÚNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17.760,00	14,69	260.894,40	-	-	-	-	-	-	17.760,00	260.894,40
14	SC 09.10.0150 (/)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	2.220,00	17,87	39.671,40	185,00	3.305,95	-	-	185,00	3.305,95	2.035,00	36.365,45
15	SC 14.05.0400 (/)	PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	3.588,75	59,90	214.966,12	200,18	11.990,66	-	-	200,18	11.990,66	3.388,57	202.975,46
16	SC 14.05.0425 (/)	BRITA Nº 0, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	2.093,85	104,50	218.807,32	200,18	20.918,60	-	-	200,18	20.918,60	1.893,67	197.888,72
17	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	800,00	755,29	604.232,00	84,00	63.444,36	-	-	84,00	63.444,36	716,00	540.787,64
18	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	1.700,00	160,84	273.428,00	-	-	-	-	-	-	1.700,00	273.428,00

Obra/Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMHC**
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO
 Código: **6.150**
 Processo: **0006/300.120/2020**
 Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020
 Prorrogações: 0 dias corridos
 Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10/ Dez/ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO						SALDO A REALIZAR	
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
19	SC 34.05.0050 (B)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAPAO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	800,00	220,04	176.032,00	-	-	-	-	-	-	800,00	176.032,00
TOTAL DA CATEGORIA						2.744.371,94		155.170,67				155.170,67		2.589.201,27
DR - GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES														
20	DR 34.05.0250 (/)	TAPAO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	340,00	416,22	141.514,80	-	-	-	-	-	-	340,00	141.514,80
TOTAL DA CATEGORIA						141.514,80								141.514,80
BP - PAVIMENTAÇÃO														
21	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	25.803,00	279,99	7.224.581,97	1.559,62	436.677,81	-	-	1.559,62	436.677,81	24.243,38	6.787.904,16
22	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	15.510,00	374,18	5.803.531,80	563,42	210.819,62	-	-	563,42	210.819,62	14.946,58	5.592.712,18
23	BP 09.05.0300 (/)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	41.313,00	3,46	142.942,98	1.992,37	6.893,58	-	-	1.992,37	6.893,58	39.320,63	136.049,40
24	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	544.500,00	2,31	1.257.795,00	15.242,35	35.209,82	-	-	15.242,35	35.209,82	529.257,65	1.222.585,18
25	BP 09.05.0600 (A)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSAO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	M2	60.000,00	9,65	579.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00	579.000,00
26	BP 09.05.0700 (A)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	M2	132.000,00	53,64	7.080.480,00	-	-	-	-	-	-	132.000,00	7.080.480,00
27	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA A FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	27.150,00	137,11	3.722.536,50	684,09	93.796,12	-	-	684,09	93.796,12	26.465,91	3.628.740,38
28	BP 19.30.0050 (/)	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.(DESONERADO)	M	1.650,00	48,28	79.662,00	-	-	-	-	-	-	1.650,00	79.662,00
TOTAL DA CATEGORIA						25.890.530,25		783.396,95				783.396,95		25.107.133,30
ET - ESTRUTURAS														
29	ET 04.05.0400 (B)	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	99,00	239,04	23.664,96	-	-	-	-	-	-	99,00	23.664,96
30	ET 04.20.0050 (A)	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)	M3	25,00	102,83	2.570,75	-	-	-	-	-	-	25,00	2.570,75
31	ET 04.20.0200 (/)	PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	74,00	52,55	3.888,70	-	-	-	-	-	-	74,00	3.888,70

Obra/Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMHC**
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO
 Código: **6.150**
 Processo: **0006/300.120/2020**
 Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020
 Prorrogações: 0 dias corridos
 Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10/ Dez/ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO						SALDO A REALIZAR	
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
32	ET 04.25.0403 (A)	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	99,00	41,69	4.127,31	-	-	-	-	-	-	99,00	4.127,31
TOTAL DA CATEGORIA						34.251,72		-		-		-		34.251,72
EQ - EQUIPAMENTOS														
33	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV, CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	8.744,69	209.872,56	2,00	17.489,38	-	-	2,00	17.489,38	22,00	192.383,18
34	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV, CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	8.784,89	210.837,36	2,00	17.569,78	-	-	2,00	17.569,78	22,00	193.267,58
35	EQ 14.05.0380 (/)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	3.108,00	84,64	263.061,12	259,00	21.921,76	-	-	259,00	21.921,76	2.849,00	241.139,36
36	EQ 14.05.0386 (/)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1.332,00	32,87	43.782,84	111,00	3.648,57	-	-	111,00	3.648,57	1.221,00	40.134,27
37	EQ 44.05.0059 (/)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H.DAM	4.440,00	0,09	399,60	370,00	33,30	-	-	370,00	33,30	4.070,00	366,30
38	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	3.108,00	64,07	199.129,56	259,00	16.594,13	-	-	259,00	16.594,13	2.849,00	182.535,43
39	EQ 44.05.0106 (/)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1.332,00	5,65	7.525,80	111,00	627,15	-	-	111,00	627,15	1.221,00	6.898,65
40	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	3.108,00	1,79	5.563,32	129,50	231,80	-	-	129,50	231,80	2.978,50	5.331,52
41	EQ 44.05.0606 (/)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1.332,00	1,19	1.585,08	55,50	66,04	-	-	55,50	66,04	1.276,50	1.519,04
TOTAL DA CATEGORIA						941.757,24		78.181,91		-		78.181,91		863.575,33
ST - SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO														
42	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLASTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2.(DESONERADO)	M2	22.275,00	34,42	766.705,50	1,30	44,81	-	-	1,30	44,81	22.273,70	766.660,69
43	ST 74.05.0450 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLASTICA, APLICADA POR EXTRUSÃO, EM PROJETOS ACIMA DE 150M2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CET-RIO.(DESONERADO)	M2	3.174,31	63,77	202.425,74	-	-	-	-	-	-	3.174,31	202.425,74
TOTAL DA CATEGORIA						969.131,24		44,81		-		44,81		969.086,43
AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO														

Obra/Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMHC**
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO
 Código: **6.150**
 Processo: **0006/300.120/2020**
 Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020

Prorrogações: 0 dias corridos

Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10/ Dez/ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO						SALDO A REALIZAR	
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
44	AD 14.10.0050 (/)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	1.898,40	38,86	73.771,82	216,19	8.401,06	-	-	216,19	8.401,06	1.682,21	65.370,76
45	AD 14.10.0300 (/)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)	T.KM	21.696,00	1,62	35.147,52	6.120,82	9.915,73	-	-	6.120,82	9.915,73	15.575,18	25.231,79
46	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG. COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV. AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	24,00	5.396,73	129.521,52	3,00	16.190,19	-	-	3,00	16.190,19	21,00	113.331,33
47	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	12,00	4.248,99	50.987,88	-	-	-	-	-	-	12,00	50.987,88
48	AD 19.25.0210 (/)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	200,00	612,93	122.586,00	70,00	42.905,10	-	-	70,00	42.905,10	130,00	79.680,90
49	AD 19.25.0310 (/)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	16,80	415,07	6.973,17	16,80	6.973,17	-	-	16,80	6.973,17	-	-
50	AD 24.05.0200 (/)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÊS	600,00	55,33	33.198,00	45,00	2.489,85	-	-	45,00	2.489,85	555,00	30.708,15
51	AD 24.05.0250 (/)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOP DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÊS	2.400,00	51,07	122.568,00	35,00	1.787,45	-	-	35,00	1.787,45	2.365,00	120.780,55
52	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.200,00	38,99	46.788,00	-	-	-	-	-	-	1.200,00	46.788,00
53	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	2.399,99	0,73	1.751,99	-	-	-	-	-	-	2.399,99	1.751,99
54	AD 39.05.0086 (/)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	17,53	77.833,20	462,50	8.107,62	-	-	462,50	8.107,62	3.977,50	69.725,58
55	AD 39.05.0116 (/)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	4.440,00	27,49	122.055,60	462,50	12.714,12	-	-	462,50	12.714,12	3.977,50	109.341,48
56	AD 39.05.0134 (/)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	1.110,00	185,76	206.193,60	277,50	51.548,40	-	-	277,50	51.548,40	832,50	154.645,20
						TOTAL DA CATEGORIA		1.029.376,30			161.032,69			868.343,61

Obra/Serviço: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO - SMHC**
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO
 Código: **6.150**
 Processo: **0006/300.120/2020**
 Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 Prazo Inicial: 180 dias corridos



Contrato: 024/2020
 Prorrogações: 0 dias corridos
 Total: 180 dias corridos

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10: Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CONTRATADO			REALIZADO						SALDO A REALIZAR			
				QUANT.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NO PERÍODO		ANTERIOR		ACUMULADO		QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)		
							QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)				
(- ITEM ESPECIAL																
57	IE 00.02.7107()	MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	6.010,13	59,61	358.263,84	-	-	-	-	-	-	-	6.010,13	358.263,84	
58	IE 00.02.7108()	MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUIDO MENOR QUE 97 dB, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	969,38	59,27	57.455,15	-	-	-	-	-	-	-	969,38	57.455,15	
59	IE 00.02.7109()	MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB, TIPO "OPEN GRADE" OU "GAP GRADED", CONSIDERANDO APENAS USINAGEM. (DESONERADO)	T	6.979,50	72,15	503.570,92	-	-	-	-	-	-	-	6.979,50	503.570,92	
60	IE 00.02.7110()	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLIMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP (DESONERADO)	T	572,90	3.273,93	1.875.634,49	-	-	-	-	-	-	-	572,90	1.875.634,49	
TOTAL DA CATEGORIA						2.794.924,40									2.794.924,40	
TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.						36.091.144,98		1.189.369,55								34.901.775,43

CONTRATO:
PROCESSO:
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**
LOGRADOURO: **CANTEIRO DE OBRAS**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (REFEITÓRIO)




SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (ALMOXARIFADO)




SERVIÇO: CONTAINERES (ADMINISTRAÇÃO)



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (VESTIÁRIOS)

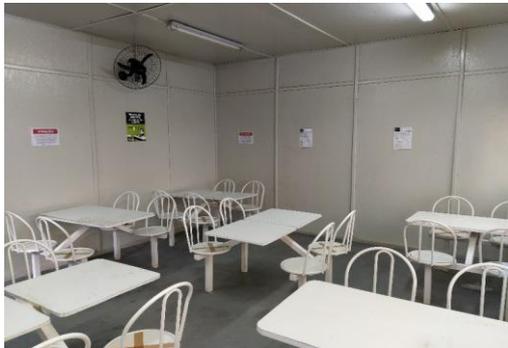

SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (REFEITÓRIO)

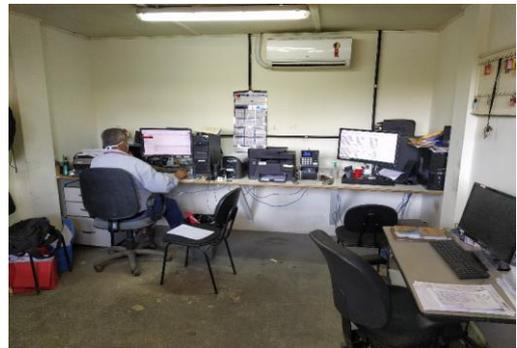

SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (ADMINISTRATIVO)



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (MEDIÇÃO/CONTROLE)



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (GERÊNCIA/ENGENHARIA)

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**

LOGRADOURO: **CANTEIRO DE OBRAS**



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (SALA DE REUNIÕES)



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (LABORATÓRIO)



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (LABORATÓRIO)



SERVIÇO: BARRACO DE OBRAS (LABORATÓRIO)

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**

LOGRADOURO: **ESTRADA DO RIO GRANDE**



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: FRESAGEM

SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM

SERVIÇO: FRESAGEM

CONTRATO:
PROCESSO:
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**
LOGRADOURO: **ESTRADA DO RIO GRANDE**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPAMENTOS DE APOIO (CAMINHÃO TANQUE)



SERVIÇO: EQUIPAMENTOS DE APOIO (CAMINHÃO TANQUE)

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**

LOGRADOURO: **ESTRADA DO RIO GRANDE**



SERVIÇO: EQUIPAMENTOS DE APOIO (BANHEIRO QUÍMICO)

SERVIÇO: EQUIPAMENTOS DE APOIO (BANHEIRO QUÍMICO)



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO

SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO

SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO

SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO

CONTRATO:
PROCESSO:
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**
LOGRADOURO: **ESTRADA DO RIO GRANDE**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: **ESPALHAMENTO DE ASFALTO**

SERVIÇO: **ESPALHAMENTO DE ASFALTO**



SERVIÇO: **COMPACTAÇÃO MECÂNICA**

SERVIÇO: **COMPACTAÇÃO MECÂNICA**



SERVIÇO: **COMPACTAÇÃO MECÂNICA**

SERVIÇO: **COMPACTAÇÃO MECÂNICA**



SERVIÇO: **MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

SERVIÇO: **MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**

LOGRADOURO: **ESTRADA DO RIO GRANDE**



SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

CONTRATO:
PROCESSO:
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**
LOGRADOURO: **ESTRADA DO RIO GRANDE**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA

SERVIÇO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA



SERVIÇO: CHAPA DE AÇO



SERVIÇO: CHAPA DE AÇO

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

LOGRADOURO: **AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: SINALIZAÇÃO DE OBRAS



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

LOGRADOURO: **AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: FRESAGEM



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)



SERVIÇO: EQUIPE DE APOIO (LIMPEZA DA PISTA)

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

LOGRADOURO: **AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: EQUIPAMENTOS DE APOIO (BANHEIRO QUÍMICO)



SERVIÇO: EQUIPAMENTOS DE APOIO (CAMINHÃO TANQUE)



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO



SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO



SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE ASFALTO

CONTRATO:

PROCESSO:

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**

LOGRADOURO: **AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MECÂNICA



SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MECÂNICA



SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MECÂNICA



SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MECÂNICA



SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

CONTRATO:
PROCESSO:
EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
ETAPA: **1ª Etapa - Intermediária** MEDIÇÃO: **1**
LOGRADOURO: **AVENIDA JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO**

PERÍODO: **28/04/2020** à **13/05/2020**



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO



SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

SERVIÇO: REMENDO PROFUNDO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP

1

VERSÃO 0
PÁGINA 1/1

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio
Contratada: Dimensional Engenharia Ltda. **Hora início:** 07:00 **Hora término:** 17:00
Contrato: 024/2020 **Processo:** 06/300.120/2020 **Fiscalização:** João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça **Data:** terça-feira, 28 de abril de 2020 **Condição do Tempo:** Sol **Intensidade:**

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	9	OPERADOR DE TRAFEGO	12	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	37		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

- 1 - FRESAGEM NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 2 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 3 - FRESAGEM NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 4 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO

OCORRENCIAS:

FORAM IDENTIFICADOS EM VARIOS PONTOS DA FRESAGEM A PRESENÇA DE "BORRACHUDO" COM NECESSIDADE DE SER EXECUTADO REPARO PROFUNDO NESSES LOCAIS.

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio **Contratada:** Dimensional Engenharia Ltda. **Hora início:** 07:00 **Hora término:** 17:00

Contrato: 024/2020 **Processo:** 06/300.120/2020 **Fiscalização:** João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça **Data:** quarta-feira, 29 de abril de 2020 **Condição do Tempo:** Sol **Intensidade:**

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	10	OPERADOR DE TRAFEGO	12	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	38		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

- 1 - FRESAGEM NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 2 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 3 - FRESAGEM NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 4 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO

OCORRENCIAS:

FORAM IDENTIFICADOS EM VARIOS PONTOS DA FRESAGEM A PRESENÇA DE "BORRACHUDO" COM NECESSIDADE DE SER EXECUTADO
REPARO PROFUNDO NESSES LOCAIS.

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP

3

VERSÃO 0
PÁGINA 1/1

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio
Contratada: Dimensional Engenharia Ltda. **Hora início:** 07:00 **Hora término:** 17:00
Contrato: 024/2020 **Processo:** 06/300.120/2020 **Fiscalização:** João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça **Data:** quinta-feira, 30 de abril de 2020 **Condição do Tempo:** Sol **Intensidade:**

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	10	OPERADOR DE TRAFEGO	12	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	4	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	42		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROESCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

- 1 - FRESAGEM NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 2 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 3 - FRESAGEM NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 4 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 5 - EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO EM TRECHOS DA ESTRADA DO RIO GRANDE

OCORRENCIAS:

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio	Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.	Hora início: 0	Hora término: 0
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: domingo, 3 de maio de 2020
		Condição do Tempo: CHUVA	Intensidade: FORTE

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	0	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	0	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	0	SINALEIRO	0
APONTADOR	0	ELETRICISTA	0	MARTELETEIRO	0	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	0	SOLDADOR	0
ARQUITETO	0	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	0	MOTORISTA DE CAMINHÃO	0	OPERADOR DE TRAFEGO	0	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	ENCARREGADO DE OBRAS	0	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	0	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	0	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	0
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	0	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	0	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	0	OPERADOR DE FRESADORA	0	TOPÓGRAFO	0
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	0	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	0	PEDREIRO	0	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	0	ENGENHEIRO CIVIL	0	OPERADOR DE ESPARGIDOR	0	RASTILHEIRO	0	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	0
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	0	ESTAGIÁRIO	0	OPERADOR DE PÁ MECANICA	0	SERVENTE	0		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA:

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:	OCORRENCIAS:
	NÃO HOUVE EXPEDIENTE (FIM DE SEMANA)
	REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio	Contratada: Dimensional Engenharia Ltda.	Hora início: 07:00	Hora término: 17:00
Contrato: 024/2020	Processo: 06/300.120/2020	Fiscalização: João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça	Data: segunda-feira, 4 de maio de 2020
		Condição do Tempo: SOL	Intensidade:

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	10	OPERADOR DE TRAFEGO	11	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	3	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	40		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

- 1 - FRESAGEM NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 2 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 3 - FRESAGEM NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 4 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 5 - EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO

OCORRENCIAS:

FORAM IDENTIFICADOS EM VARIOS PONTOS DA FRESAGEM A PRESENÇA DE "BORRACHUDO" COM NECESSIDADE DE SER EXECUTADO REPARO PROFUNDO NESSES LOCAIS.

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS PAVIMENTO - RDOP

8

VERSÃO 0
PÁGINA 1/1

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio **Contratada:** Dimensional Engenharia Ltda. **Hora início:** 07:00 **Hora término:** 17:00

Contrato: 024/2020 **Processo:** 06/300.120/2020 **Fiscalização:** João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça **Data:** terça-feira, 5 de maio de 2020 **Condição do Tempo:** SOL **Intensidade:**

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	10	OPERADOR DE TRAFEGO	12	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	3	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	39		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

- 1 - FRESAGEM NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 2 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE
- 3 - FRESAGEM NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 4 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
- 5 - EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO

OCORRENCIAS:

FORAM IDENTIFICADOS EM VARIOS PONTOS DA FRESAGEM A PRESENÇA DE "BORRACHUDO" COM NECESSIDADE DE SER EXECUTADO REPARO PROFUNDO NESSES LOCAIS.

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio **Contratada:** Dimensional Engenharia Ltda. **Hora início:** 07:00 **Hora término:** 17:00

Contrato: 024/2020 **Processo:** 06/300.120/2020 **Fiscalização:** João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça **Data:** quarta-feira, 6 de maio de 2020 **Condição do Tempo:** SOL **Intensidade:**

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	10	OPERADOR DE TRAFEGO	10	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	2	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	0	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	3	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	41		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:	OCORRENCIAS:
1 - FRESAGEM NA ESTRADA DO RIO GRANDE	
2 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE	
3 - FRESAGEM NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	
4 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	
5 - EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO NA AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO	
6 - EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO NA ESTRADA DO RIO GRANDE	
	REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

Obra: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP 4 - Programa PavimentaRio **Contratada:** Dimensional Engenharia Ltda. **Hora início:** 07:00 **Hora término:** 16:00

Contrato: 024/2020 **Processo:** 06/300.120/2020 **Fiscalização:** João Adolpho / Susana Bittencourt / Maurício Graça **Data:** sexta-feira, 8 de maio de 2020 **Condição do Tempo:** NUBLADO **Intensidade:**

EFETIVO / QUANTIDADE

ALMOXARIFE	1	AUXILIAR TÉCNICO	0	LABORATORISTA	1	OPERADOR DE RETRO ESCAVADEIRA	1	SINALEIRO	2
APONTADOR	2	ELETRICISTA	1	MARTELETEIRO	2	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	4	SOLDADOR	1
ARQUITETO	1	ENCARREGADO ADMINISTRATIVO	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO	10	OPERADOR DE TRAFEGO	10	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE ESPARGIDOR	1	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO	1	TÉCNICO DE SEG. DO TRABALHO	2
AUXILIAR DE ALMOXARIFE	1	ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO	2	OPERADOR DE VIBRO ACABADORA	2	OPERADOR DE FRESADORA	2	TOPÓGRAFO	2
AUXILIAR DE ENGENHARIA	1	ENCARREGADO DE USINA DE ASFALTO	1	OPERADOR DE MINI CARREGADEIRA	4	PEDREIRO	2	VIGIA	6
AUXILIAR DE LABORATÓRIO	1	ENGENHEIRO CIVIL	3	OPERADOR DE ESPARGIDOR	2	RASTILHEIRO	6	ENGENHEIRO DE SEG. DO TRAB.	1
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	4	ESTAGIÁRIO	2	OPERADOR DE PÁ MECANICA	1	SERVENTE	25		

EQUIPAMENTOS / QUANTIDADE

BOB CAT	4	CAMINHÃO TANQUE	2	PÁ CARREGADEIRA	1				
COMPRESSOR DE AR	4	CAMINHÃO PRANCHA	2	RETROSCAVADEIRA	1				
MANGUEIRA PARA COMPRESSOR	4	FRESA 1000 OU SIMILAR	2	USINA DE ASFALTO	1				
ROMPEDOR PNEUMÁTICO	2	CAMINHÃO ESPARGIDOR	2	GERADOR	1				
CAMINHÃO TRUCK	5	VIBRO ACABADORA	2	ÔNIBUS OU SIMILAR	4				
CAMINHÃO TOCO	4	ROLO CHAPA	2	CAMINHONETE TIPO PICK UP	2				
CAMINHÃO CARROC. FIXA	4	ROLO PNEU	2	VEÍCULO LEVE	2				

DESTINO DO FRESADO / BOTA-FORA: PARTE DO MATERIAL DO FRESADO ENCAMINHADO PARA A USINA DA PREFEITURA DO RJ NA ESTRADA DO CAFUNDÁ E PARTE DO MATERIAL ENCAMINHADO PARA BOTA - ESPERA

DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS:

1 - APLICAÇÃO DE CBUQ NA ESTRADA DO RIO GRANDE

OCORRENCIAS:

NÃO HOUVE APLICAÇÃO DE MASSA NA AV. JOSÉ SILVA POIS A MESMA AINDA ESTAVA COM ACUMULO DE ÁGUA DA CHUVA DA

NOITE ANTERIOR

REGISTROS DA FISCALIZAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS
LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA
PAVIMENTARIO**

CONTRATO: 024/2020

10 - DEZ/2019

FOLHA RESUMO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL POSSIVEL		TOTAL EXECUTADO		TOTAL A MEDIR PÓS RERRA
	MEDIR	%		%	
A - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 88.560,33	7,45%	R\$ 108.285,54	7,99%	R\$ 19.725,21
B - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ -	0,00%	R\$ 34.589,42	2,55%	R\$ 34.589,42
C - CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO	R\$ -	0,00%	R\$ 13.525,31	1,00%	R\$ 13.525,31
D - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 25.289,96	2,13%	R\$ 25.289,96	1,87%	R\$ -
E - EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL	R\$ 31.290,90	2,63%	R\$ 42.298,05	3,12%	R\$ 11.007,15
F - EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL	R\$ 86.440,31	7,27%	R\$ 109.570,75	8,09%	R\$ 23.130,44
G - SINALIZAÇÃO DE OBRAS	R\$ 129.939,32	10,93%	R\$ 129.939,32	9,59%	R\$ -
H - FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL	R\$ 93.796,12	7,89%	R\$ 104.659,80	7,73%	R\$ 10.863,68
I - CBUQ (CONVENCIONAL)	R\$ 221.999,49	18,67%	R\$ 230.273,96	17,00%	R\$ 8.274,47
J - BINDER	R\$ 428.445,59	36,02%	R\$ 434.098,25	32,05%	R\$ 5.652,66
K - REMENDO PROFUNDO	R\$ 83.607,51	7,03%	R\$ 122.035,74	9,01%	R\$ 38.428,23
- TOTAL GERAL	R\$ 1.189.369,53	100%	R\$ 1.354.566,10	100%	R\$ 165.196,57

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						108.285,54		88.560,33
		VISITA DO PREFEITO A USINA: 28/02/2020						
		DATA DE MOBILIZAÇÃO: 09/03/2020						
		PRAZO DE EXECUÇÃO 28/04/2020 À 13/05/2020 = 15 DIAS CORRIDOS			0,50		2,00	FRENTES
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO			185			HORAS
01	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	185,76	277,50	51.548,40	277,50	51.548,40
		Osvaldo Peçanha - Engenheiro Civil - Gestor de Unidade de Negócio José Renato Maia - Engenheiro Civil - Engenheiro de Produção da Obra Fernando Santos - Arquiteto e Urbanista - Gestor de Medição e Controle 3,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			= 277,50			277,50
02	AD 39.05.0116 (I)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	27,49	462,50	12.714,12	462,50	12.714,12
		Airton Gonçalves dos Santos - Encarregado Administrativo Marcelo Barbosa Ribeiro - Encarregado Geral Roberto Cordeiro - Encarregado de Obras Francisco Joaquim Pereira - Encarregado de Obras Samuel José Acioli - Encarregado de Obras 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			= 462,50			462,50
03	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	17,53	462,50	8.107,62	462,50	8.107,62
		Marcos Vinicius Singello - Técnico de Medição e Controle Winder Diego Pereira - Técnico de Segurança do Trabalho Pedro Ivo B. Alves - Técnico de Segurança do Trabalho Everton Ferraz - Técnico de Medição e Controle Rafael da Anuniação Barros - Técnico de Medição e Controle 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			= 462,50			462,50
04	AD 39.05.0068 (I)	APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	22,82	462,50	10.554,66	-	-
		Juarez Almeida Gonçalves - Apontador Denis Bezerra da Silva - Apontador Cleivaldo Santos Freitas - Apontador Philip de Oliveira Pinheiro - Apontador Givanildo Santos Andrade - Apontador 5,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			= 462,50			462,50
05	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	14,70	624,00	9.170,55	-	-
		Alexsandre Silva Barreto Da Freitas - Vigia Reinaldo Rangel Soares - Vigia Crello De Oliveira Gomes - Vigia Edmilso Gevezier - Vigia Ademir Da Silva - Vigia Carlos Henrique da Silva - Vigia DIAS UTEIS (1 POSTO) 1,00 und x 8,00 dias x 16,00 h/dia x 2,00 frentes DIAS UTEIS (2 POSTOS) 2,00 und x 2,00 dias x 16,00 h/dia x 2,00 frentes FIM DE SEMANA/FERIADO (1 POSTO) 1,00 und x 5,00 dias x 24,00 h/dia x 2,00 frentes			= 256,00 = 128,00 = 240,00			624,00
06	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KM/MÊS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	5.396,73	3,00	16.190,19	3,00	16.190,19
		Frete de Serviço 2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês Apoio 2,00 und x 0,50 mês			= 2,00 = 1,00			3,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR		
CANTEIRO DE OBRAS						34.589,42		0,00		
		PRAZO DE EXECUÇÃO	28/04/2020	À	13/05/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES	2,00 FRENTES
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO							185 HORAS	
01	AD 19.15.0050 (/)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	425,37	1,00	425,36	-	-		
		ADMINISTRAÇÃO	2,00 und x	0,50 mês	=	1,00				
02	AD 19.10.0050 (/)	GALPÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPÓSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO)	M2	239,10	142,89	34.164,06	-	-		
		ALMOXARIFADO	5,00 m x	3,60 m	=	18,00				
		ENGENHARIA	3,44 m x	4,60 m	=	15,82				
		RECEPÇÃO	3,45 m x	4,12 m	=	14,21				
		PLANEJAMENTO E CONTR.	3,50 m x	4,60 m	=	16,10				
		REFEITÓRIO	6,10 m x	4,88 m	=	29,77				
		LABORATÓRIO	5,80 m x	3,15 m	=	18,27				
		VESTIÁRIO	4,70 m x	3,00 m	=	14,10				
		BANHEIRO	3,30 m x	3,90 m	=	12,87				
		DEPÓSITO	2,15 m x	1,74 m	=	3,74				
						142,89				



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

Processo: 0006/300120/2020
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR		
CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO						13.525,31		0,00		
		PRAZO DE EXECUÇÃO	28/04/2020	À	13/05/2020	=	15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES	2,00 FRENTES
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO							185 HORAS	
01	AD 39.05.0212 (f)	TOPÓGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39	-	-		
		2,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			=	185,00				
						185,00				
02	AD 39.05.0092 (f)	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92	-	-		
		4,00 und x 0,50 mês x 185,00 h/mês			=	370,00				
						370,00				

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA
ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

Processo: 0006/300120/2020
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						25.289,96		25.289,96		
		PRAZO DE EXECUÇÃO	28/04/2020	À	13/05/2020	= 15 DIAS CORRIDOS	=	0,50 MÊSES	2,00 FRENTES	
		PESO UNIT.	QUANT. / FRETE							
		FRESADORA DE ASFALTO	14.450,00 KG X	1,00	UND	= 14,45	T			
		VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO	10.500,00 KG X	1,00	UND	= 10,50	T			
		ROLO COMPACTADOR TÂNDEN	9.400,00 KG X	1,00	UND	= 9,40	T			
		ROLO COMPACTADOR DE PNEU	9.000,00 KG X	1,00	UND	= 9,00	T			
		RETROSCAVADEIRA	9.439,00 KG X	1,00	UND	= 9,44	T			
		MINI CARREGADEIRA	629,00 KG X	2,00	UND	= 1,26	T			
						TOTAL / FRETE =	54,05	T		
01	AD 19.25.0310 (f)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)			M2	415,07	16,80	6.973,17	16,80	6.973,17
			3,00 und x	2,00 m x	1,40 m x	2,00 frentes	=	16,80		16,80
02	AD 14.10.0050 (f)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO.(DESONERADO)			T	38,86	216,19	8.401,06	216,19	8.401,06
		CANTEIRO -> FRETE DE SERVIÇO	54,05 t x	1,00	operações x	2,00 frentes	=	108,09		
		GARAGEM -> CANTEIRO	108,09 t x	1,00	operações		=	108,09		
							=	216,19		
03	AD 14.10.0300 (f)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)			T.KM	1,62	6.120,82	9.915,73	6.120,82	9.915,73
		CANTEIRO -> RIO GRANDE	54,05 t x	1,00	operações x	3,10 km Estrada do Rio Grande	=	167,55		
		CANTEIRO -> AV. JOSE SILVA	54,05 t x	1,00	operações x	13,95 km Av. José da Silva Azevedo Neto	=	753,96		
		GARAGEM -> CANTEIRO	108,09 t x	1,00	operações x	48,10 km	=	5.199,32		
							=	6.120,82		

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS
NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR
EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL						42.298,05		31.290,90
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/04/2020 À 13/05/2020 = 15 DIAS CORRIDOS			0,50	MÊSES	2,00	FRENTES
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO					185	HORAS		
01	SC 09.05.1450 (I)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	14,38	1.665,00	23.942,70	1.665,00	23.942,70
		9,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	1.665,00			
					1.665,00			
02	SC 09.05.1350 (I)	RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15	-	-
		3,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	555,00			
					555,00			
03	SC 09.05.1200 (I)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	21,38	-	-	-	-
		2,00 und x - frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	-			
					-			
04	SC 09.05.0900 (I)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	19,86	370,00	7.348,20	370,00	7.348,20
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	370,00			
					370,00			



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR
EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL						109.570,75		86.440,31
PRAZO DE EXECUÇÃO		28/04/2020 À 13/05/2020 = 15 DIAS CORRIDOS			0,50	MÊSES	2,00	FRENTES
HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO					185	HORAS		
01	EQ 14.05.0380 (f)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	84,64	259,00	21.921,76	259,00	21.921,76
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 129,50 h/mês		=	259,00			259,00
02	EQ 14.05.0386 (f)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	32,87	111,00	3.648,57	111,00	3.648,57
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 55,50 h/mês		=	111,00			111,00
03	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	64,07	259,00	16.594,13	259,00	16.594,13
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 129,50 h/mês		=	259,00			259,00
04	EQ 44.05.0106 (f)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	5,65	111,00	627,15	111,00	627,15
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 55,50 h/mês		=	111,00			111,00
05	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1,79	129,50	231,80	129,50	231,80
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 129,50 h/mês		=	129,50			129,50
06	EQ 44.05.0606 (f)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1,19	55,50	66,04	55,50	66,04
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 55,50 h/mês		=	55,50			55,50
07	EQ 44.05.0059 (f)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H.DAM	0,09	370,00	33,30	370,00	33,30
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	370,00			370,00
08	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.744,69	2,00	17.489,38	2,00	17.489,38
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês		=	2,00			2,00
09	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.784,89	2,00	17.569,78	2,00	17.569,78
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês		=	2,00			2,00
10	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	-	-
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 129,50 h/mês		=	129,50			129,50
11	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	-	-
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 55,50 h/mês		=	55,50			55,50
12	SC 14.05.0050 (f)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	-	-
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 200,00 m3/mês		=	200,00			200,00



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR
EQUIPAMENTO DE APOIO OPERACIONAL						109.570,75		86.440,31
13	SC 09.05.1100 (I)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,32	370,00	8.258,40	370,00	8.258,40
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês		=	370,00			
					<u>370,00</u>			
14	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)		1.042,15	2,00	2.084,29	-	-
		2,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês		=	2,00			
					<u>2,00</u>			

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

Processo: 0006/300120/2020
Código da Obra: 6.150

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR
SINALIZAÇÃO DE OBRAS						129.939,32		129.939,32
		PRAZO DE EXECUÇÃO 28/04/2020 À 13/05/2020 = 15 DIAS CORRIDOS			0,500	MÊSES	2,00	FRENTES
		HORAS NORMAIS / MÊS TRABALHO			185	HORAS		
		NUMERO DE FRENTES DE SERVIÇO 1,00 FRENTES						
01	SC 09.10.0150 (f)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÊ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	17,87	185,00	3.305,95	185,00	3.305,95
		1,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês			185,00			185,00
02	SC 09.05.1450 (f)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS),(DESONERADO)	H	14,38	1.110,00	15.961,80	1.110,00	15.961,80
		6,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês x 185,00 h/mês			1.110,00			1.110,00
03	AD 24.05.0200 (f)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÊS	55,33	45,00	2.489,85	45,00	2.489,85
		45,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês			45,00			45,00
04	AD 24.05.0250 (f)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPDE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÊS	51,07	35,00	1.787,45	35,00	1.787,45
		35,00 und x 2,00 frentes x 0,50 mês			35,00			35,00
05	AD 19.25.0210 (f)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	612,93	70,00	42.905,10	70,00	42.905,10
		35,00 und x 2,00 frentes			70,00			70,00
06	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	755,29	84,00	63.444,36	84,00	63.444,36
		2,00 chapas x 1,50 m2 x 28,00 aplicações			84,00			84,00
07	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2.(DESONERADO)	M2	34,42	1,30	44,81	1,30	44,81
		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE TRÁFEGO 600,00 m / 4,85 m(esp.) = 124,00 faixas x 0,15 m x 0,07 espesura			1,30			1,30

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS
PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA
ÁREA DA AP - 4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR
FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL						104.659,80		93.796,12
	PRAZO DE EXECUÇÃO	28/04/2020 À 13/05/2020 = 15 DIAS CORRIDOS			= 0,50	MÊSES	2,00	FRENTES
	LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	ÁREA (m²)	TOTAL (m³)	DMT (Km)			
	Estrada do Rio Grande	1.341,49	12.254,88	490,20	2,75			
	Av. José Da Silva Azevedo Neto	394,20	4.847,47	193,90	13,98			
	TOTAL	1.735,69	17.102,35	684,09				
	ESPESSURA			4,00	CM			
	PESO ESPECIFICO			2,35	T/M3			
01	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA À FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	137,11	684,09	93.796,12	684,09	93.796,12
	FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL							
		Volume	684,09	m3	=	<u>684,09</u>		684,09
02	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	9.538,04	9.432,90	-	-
	FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL							
		Volume	490,20	m3 x	2,35	t/m3 x	2,75	KM
		Estrada do Rio Grande	490,20	m3 x	2,35	t/m3 x	2,75	KM
		Av. José Da Silva Azevedo Neto	193,90	m3 x	2,35	t/m3 x	13,98	KM
					=	<u>3.167,89</u>		
					=	<u>6.370,16</u>		
						9.538,04		
03	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	1.607,62	1.430,78	-	-
	FRESAGEM DE PAVIMENTO FLEXIVEL							
		Volume	684,09	m3 x	2,35	t/m3		
					=	<u>1.607,62</u>		
						1.607,62		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL EXECUTADA	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL MEDIR	R\$ POSSIVEL MEDIR																																								
CBUQ (CONVENCIONAL)						230.273,96		221.999,49																																								
	PRAZO DE EXECUÇÃO	28/04/2020 À 13/05/2020 = 15 DIAS CORRIDOS		=	0,50	MÊSES	2,00	FRENTES																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOGRADOURO</th> <th>EXTENSÃO (M)</th> <th>ÁREA (m²)</th> <th>TOTAL (T)</th> <th>1ª CAMADA VOL. (m³)</th> <th>2ª CAMADA VOL. (m³)</th> <th>PINT. LIGACÃO ÁREA (m²)</th> <th>DMT Km</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Av. José da Silva Azevedo Neto</td> <td>328,25</td> <td>3.995,87</td> <td>563,42</td> <td>239,75</td> <td>-</td> <td>3.995,87</td> <td>13,95</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>328,25</td> <td>3.995,87</td> <td>563,42</td> <td>239,75</td> <td>-</td> <td>3.995,87</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	ÁREA (m²)	TOTAL (T)	1ª CAMADA VOL. (m³)	2ª CAMADA VOL. (m³)	PINT. LIGACÃO ÁREA (m²)	DMT Km	Av. José da Silva Azevedo Neto	328,25	3.995,87	563,42	239,75	-	3.995,87	13,95																	TOTAL	328,25	3.995,87	563,42	239,75	-	3.995,87							
LOGRADOURO	EXTENSÃO (M)	ÁREA (m²)	TOTAL (T)	1ª CAMADA VOL. (m³)	2ª CAMADA VOL. (m³)	PINT. LIGACÃO ÁREA (m²)	DMT Km																																									
Av. José da Silva Azevedo Neto	328,25	3.995,87	563,42	239,75	-	3.995,87	13,95																																									
TOTAL	328,25	3.995,87	563,42	239,75	-	3.995,87																																										
	PESO ESPECIFICO	2,35 T/M3																																														
01	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	2,31	3.995,87	9.230,45	3.995,87	9.230,45																																								
		Area 3.995,87 m2		=	3.995,87	3.995,87																																										
02	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	374,18	563,42	210.819,62	563,42	210.819,62																																								
		Volume 239,75 m3 x P. Esp. 2,35 t/m³		=	563,42	563,42																																										
03	BP 09.05.0300 (I)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	3,46	563,42	1.949,42	563,42	1.949,42																																								
		Volume 239,75 m3 x P. Esp. 2,35 t/m³		=	563,42	563,42																																										
04	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	7.859,68	7.773,03	-	-																																								
		Peso Total Av. José da Silva Azevedo Neto 563,42 t x D.M.T. 13,95 km		=	7.859,68	7.859,68																																										
05	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	563,42	501,44	-	-																																								
		Peso Total 563,42 T		=	563,42	563,42																																										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	R\$ UNIT	QUANT. TOTAL	R\$ TOTAL EXECUTADA	QUANT. POSSIVEL	R\$ POSSIVEL MEDIR	
REMENDO PROFUNDO						122.035,74		83.607,51	
	Estrada do Rio Grande	135,40 m3 x	1,50	t/m³	=	203,09			
	Av. José Silva de Azevedo Neto	64,78 m3 x	1,50	t/m³	=	97,17			
					Total	=		1.215,69	
11	TC 04.05.0620 (f)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 17T.(DESONERADO)			T.KM	0,99	9.801,82	9.693,77	-
	Frente de Serviço x Bota-Fora	Tonelada	D.M.T.						
	ASFALTO DEMOLIDO								
	Estrada do Rio Grande	88,38 t x	3,10	km	=	273,99			
	Av. José Silva de Azevedo Neto	67,66 t x	13,95	km	=	943,87			
	ESCAVAÇÃO								
	Estrada do Rio Grande	383,62 t x	3,10	km	=	1.189,23			
	Av. José Silva de Azevedo Neto	183,55 t x	13,95	km	=	2.560,51			
	Canteiro x Frente de Serviço								
	PÓ DE PEDRA (SUB-BASE)								
	Estrada do Rio Grande	203,09 t x	3,10	km	=	629,59			
	Av. José Silva de Azevedo Neto	97,17 t x	13,95	km	=	1.355,56			
	BRITA (BASE)								
	Estrada do Rio Grande	203,09 t x	3,10	km	=	629,59			
	Av. José Silva de Azevedo Neto	97,17 t x	13,95	km	=	1.355,56			
	CBUQ								
	Estrada do Rio Grande	88,38 t x	3,10	km	=	273,99			
	Av. José Silva de Azevedo Neto	42,29 t x	13,95	km	=	589,92			
					Total	=		9.801,82	
12	TC 09.05.0700 (f)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)			T	15,96	723,22	11.542,52	723,22
	Bota-fora	Tonelada							
	ASFALTO DEMOLIDO	156,04 t			=	156,04			
	ESCAVAÇÃO	567,17 t			=	567,17			
					Total	=		723,22	



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020

Código da Obra: 6.150

ITENS A MEDIR PÓS RERRA

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10/ Dez./ 2019

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL A MEDIR PÓS RERRA	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
MT - MOVIMENTO DE TERRA						
novo-1	MT 14.15.0050 (A)	PREPARO DE SOLO ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, COMPREEDENDO ESCAVAÇÃO E ACERTO MANUAIS E COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM REMOÇÃO ATÉ 20M.(DESONERADO)	M2	11,06	-	-
novo-2	MT 09.05.0050 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA.(DESONERADO)	M3	6,55	333,63	2.185,49
novo-25	MT 14.05.0100 (I)	COMPACTAÇÃO DE ATERRRO EM CAMADAS DE 15CM, COM MAÇO.(DESONERADO)	M3	40,26	333,63	13.432,25
					TOTAL DA CATEGORIA	15.617,74
TC - TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA						
novo-3	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA; EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	31.629,28	31.280,62
novo-4	TC 09.05.0200 (I)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANUL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	15,29	108,06	1.652,47
novo-5	TC 09.05.0350 (I)	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	1,20	1.215,69	1.460,84
					TOTAL DA CATEGORIA	34.393,93
SC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
novo-6	SC 09.05.1350 (I)	RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15
novo-7	SC 14.05.0050 (I)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31
					TOTAL DA CATEGORIA	13.695,46
EQ - EQUIPAMENTOS						
novo-8	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10
novo-9	EQ 19.05.0400 (B)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTUAR DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,67	111,00	4.180,94
novo-10	EQ 19.05.0406 (A)	MAQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,48	259,00	5.822,47
novo-11	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74
					TOTAL DA CATEGORIA	28.361,25
AD - ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E APOIO TECNOLÓGICO						
novo-12	AD 19.10.0050 (I)	GALPÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPOSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO)	M2	239,10	142,89	34.164,06
novo-13	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	129,95	-	-
novo-14	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,70	624,00	9.170,55
novo-15	AD 39.05.0092 (I)	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92
novo-16	AD 39.05.0080 (I)	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,66	-	-
novo-17	AD 39.05.0212 (I)	TOPOGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39
novo-18	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLT, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29
novo-19	AD 39.05.0074 (I)	AUXILIAR DE ALMOXARIFE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,66	-	-
novo-20	AD 19.15.0050 (I)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	425,37	1,00	425,36
novo-24	AD 39.05.0068 (I)	APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,82	462,50	10.554,66
					TOTAL DA CATEGORIA	69.924,23



**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO
DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS
RELACIONADOS NA ÁREA DA AP - 4 -
PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Processo: 0006/300120/2020

Código da Obra: 6.150



ITENS A MEDIR PÓS RERRA

Medição: 1ª Etapa: 1ª - Intermediária

Serviços Executados de 28/04/2020 à 13/05/2020

10: Dez./ 2019


ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	CUSTO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL A MEDIR PÓS RERRA	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
CE - CONSULTORIA ESPECIALIZADA						
nov0-21	CE 04.10.0188 (/)	LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	9,97	-	-
nov0-22	CE 04.10.0080 (/)	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	8,89	-	-
					TOTAL DA CATEGORIA	-
(- ITEM ESPECIAL						
nov0-23	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	3.599,99	3.203,98
					TOTAL DA CATEGORIA	3.203,98
TOTAL DOS SERVIÇOS COM B.D.I.						165.196,59

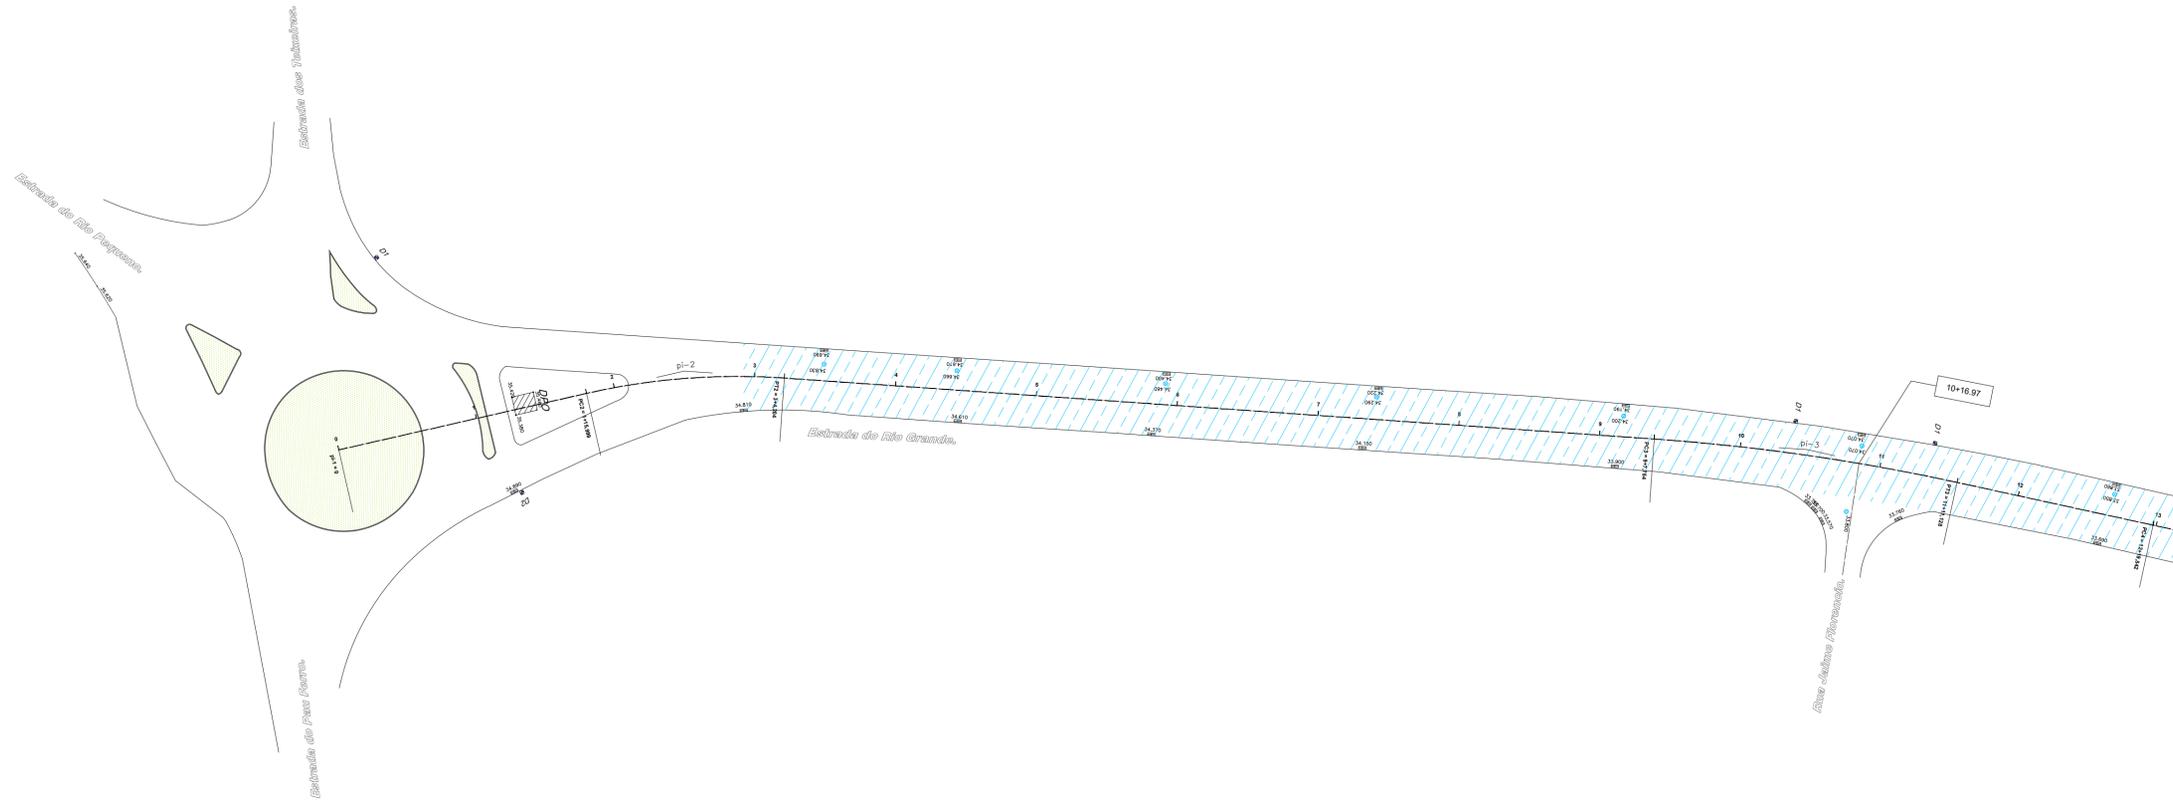

LEGENDA:

- TRECHO FRESADO
- TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
- TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

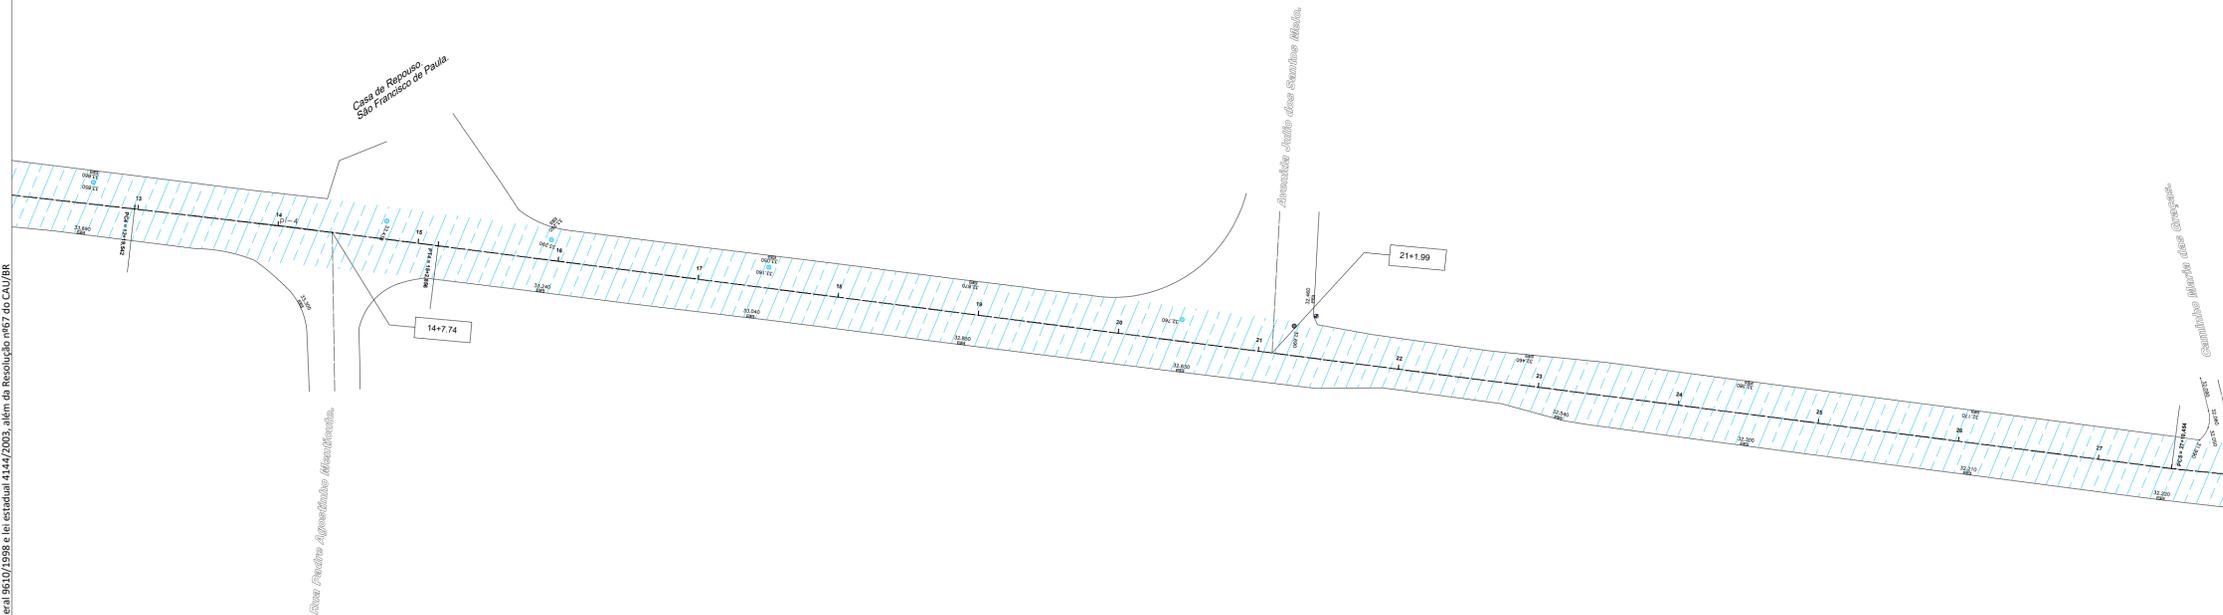

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações: Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

Nível A

Identificação:	Contratante:
00.211	SMIHC

Empreendimento: **PAVIMENTA RIO AP - 4**

Endereço: **ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ**



Setor:	Profissionais responsáveis:
	Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos

Etapas:	Disciplina:	Escala:
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/500

Conteúdo da prancha:	Nº da Prancha:
ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE	01/08


Nome da prancha: MED-00211-AC-PE-01-F01-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e a lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.

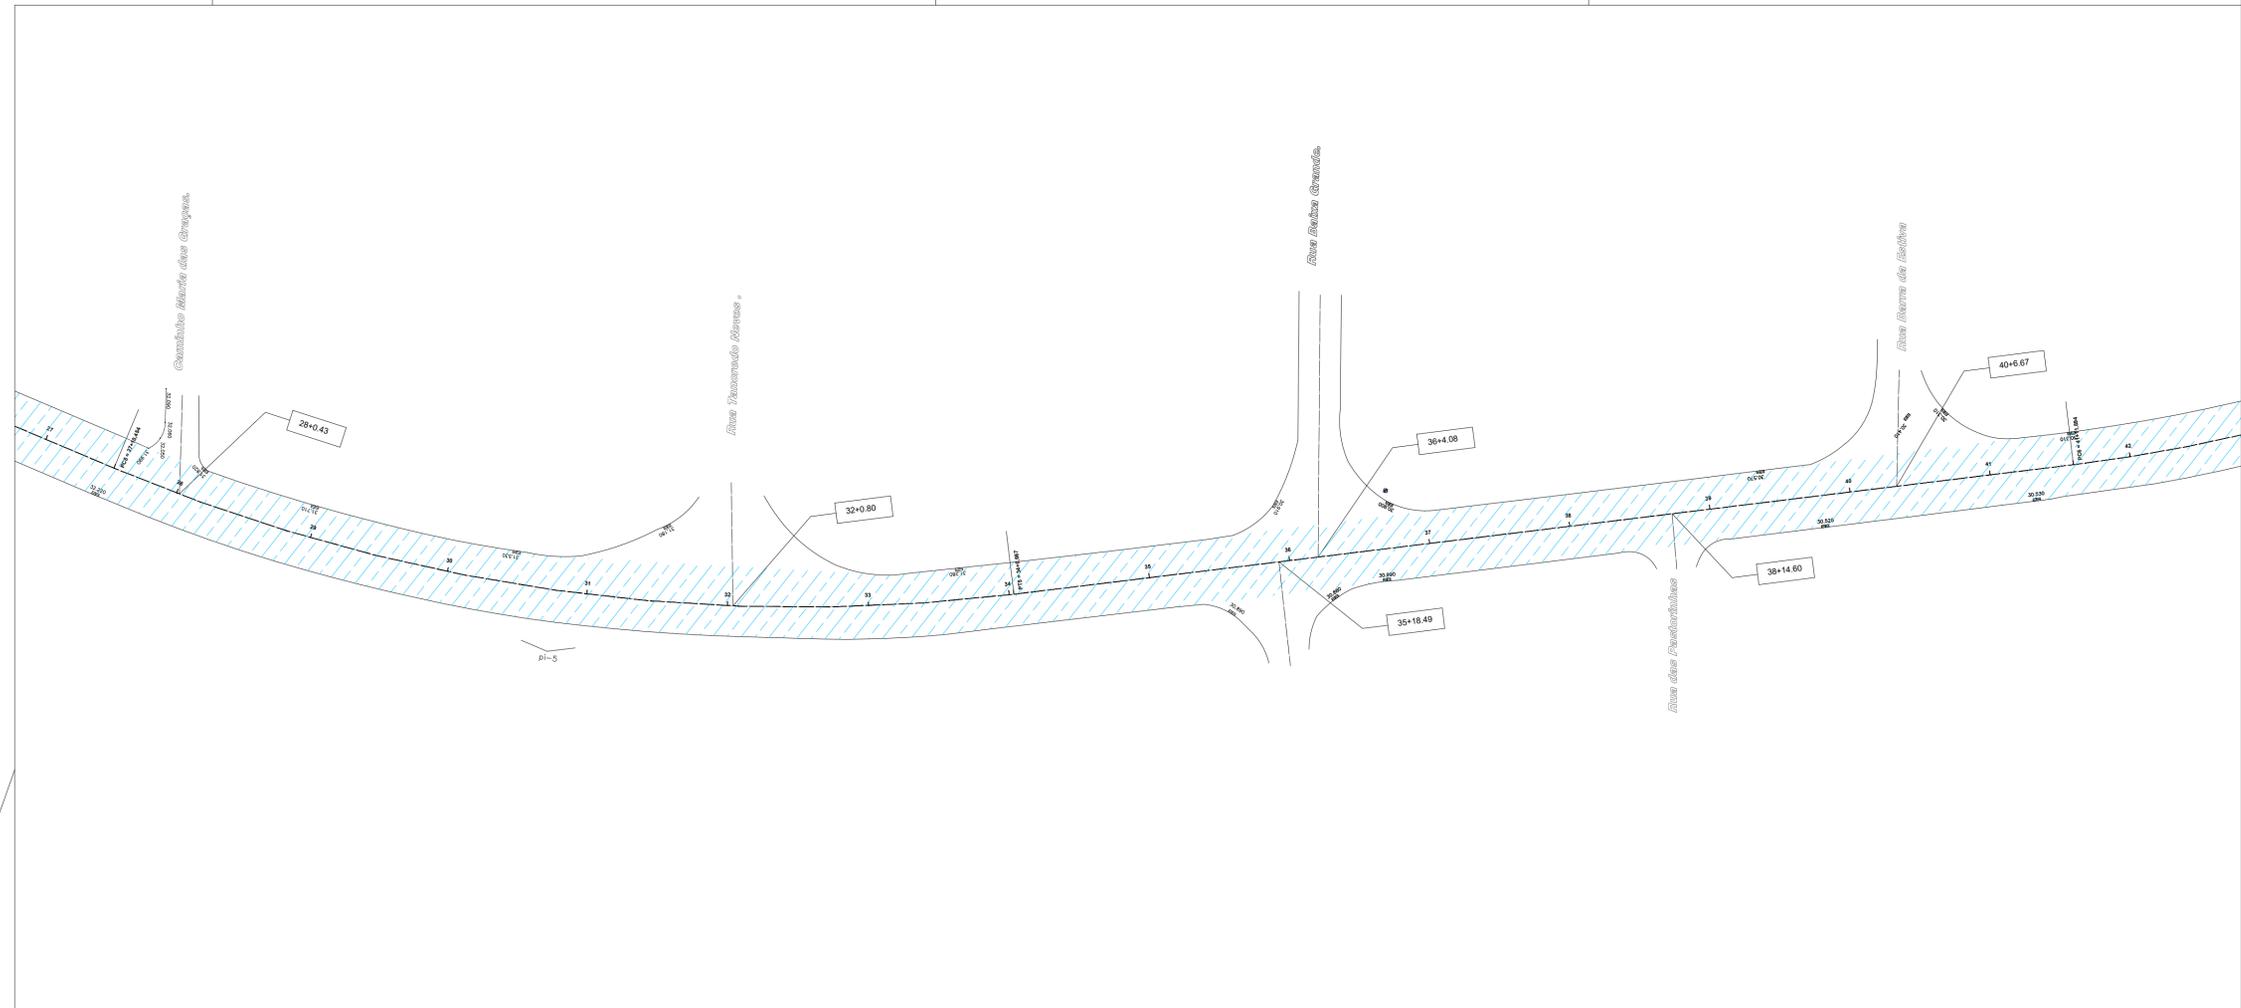

- LEGENDA:**
- TRECHO FRESADO
 - TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
 - TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

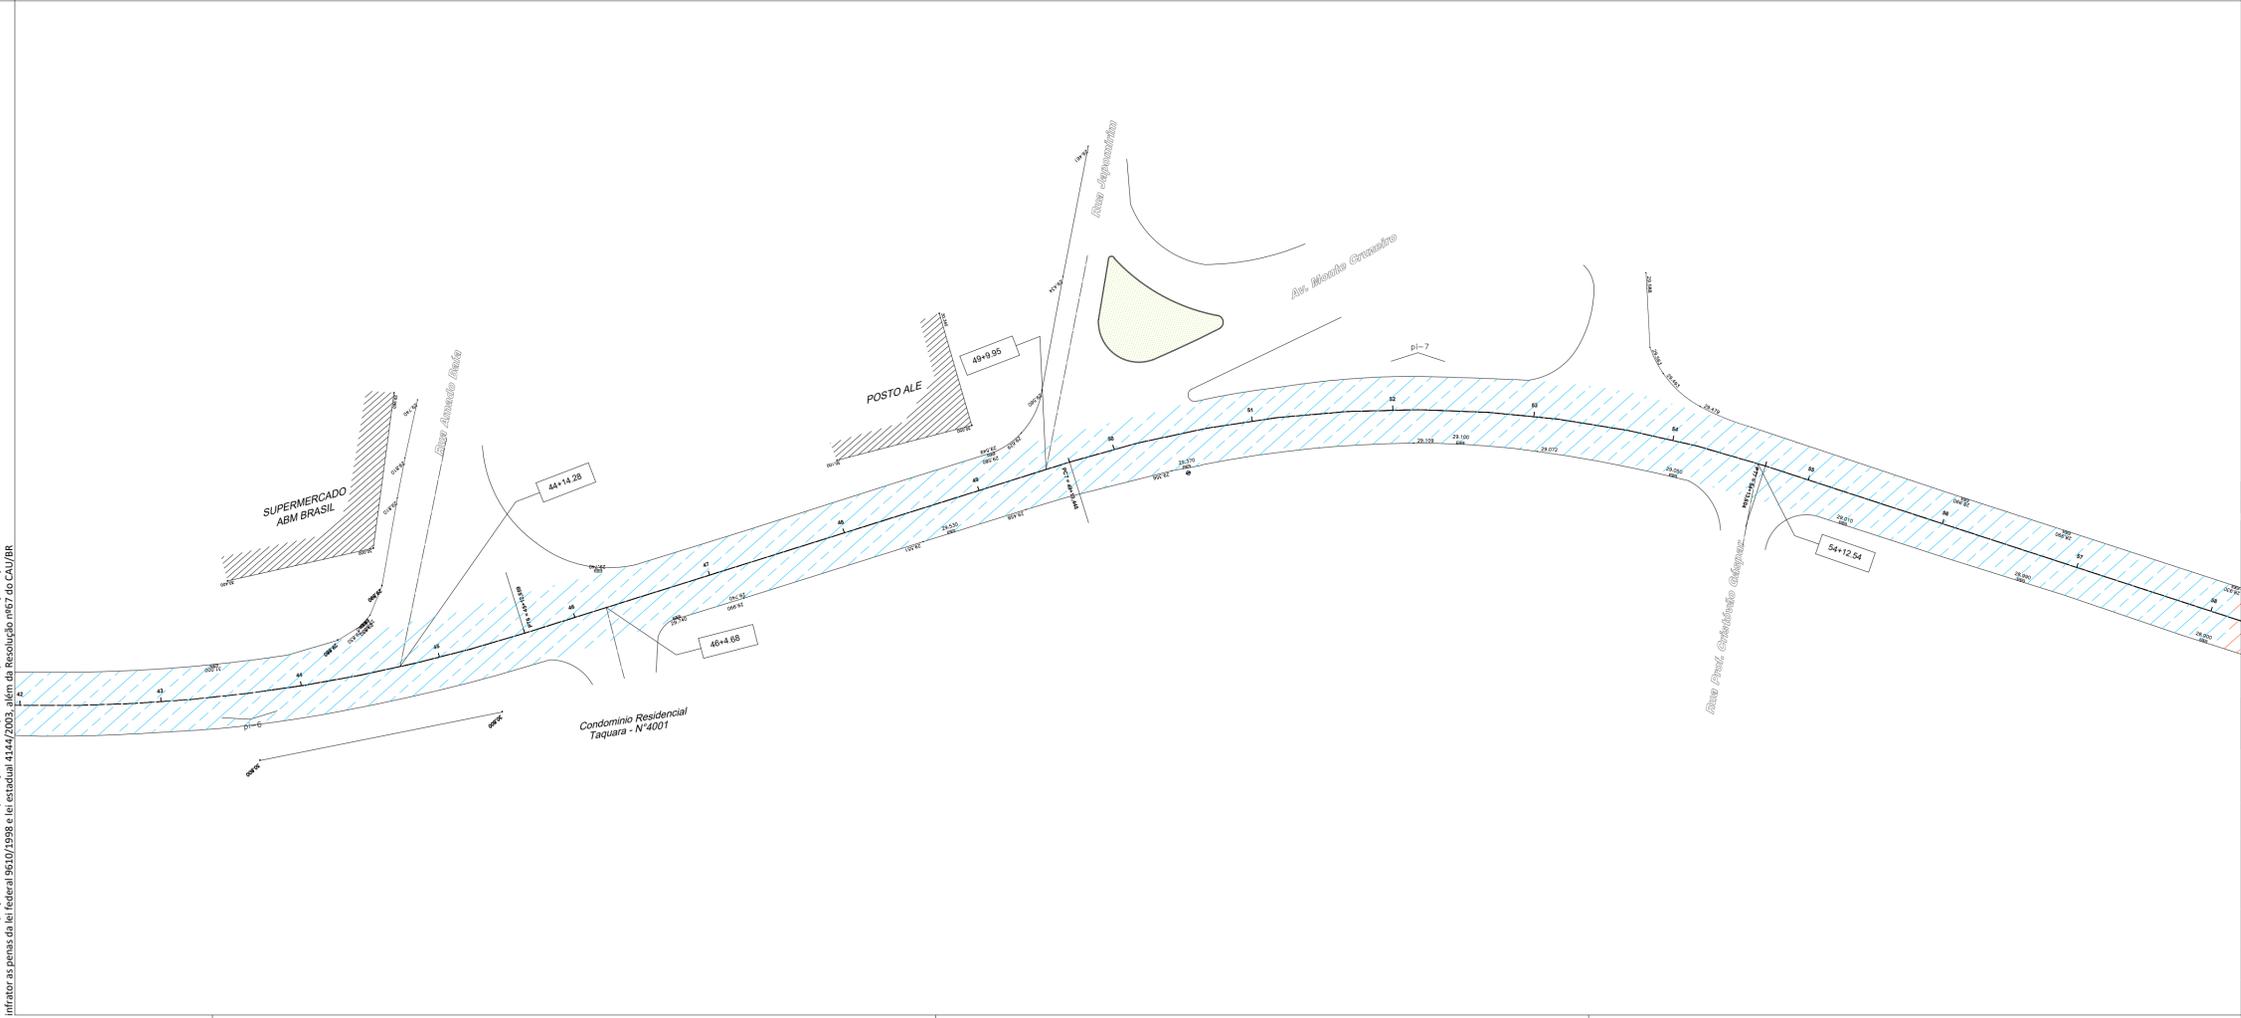

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

Nível A

Identificação:	Contratante:
00.211	SMIHC



Empreendimento:
PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço:
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor:	Profissionais responsáveis:
	Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos


Etapa:	Disciplina:	Escala:
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/500
Conteúdo da prancha:		Nº da Prancha:
ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE		02/08
Nome da prancha:		
MED-00211-AC-PE-01-F02-R00		

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e a lei estadual 4144/2005, além da Resolução nº67 do CAU/BR.

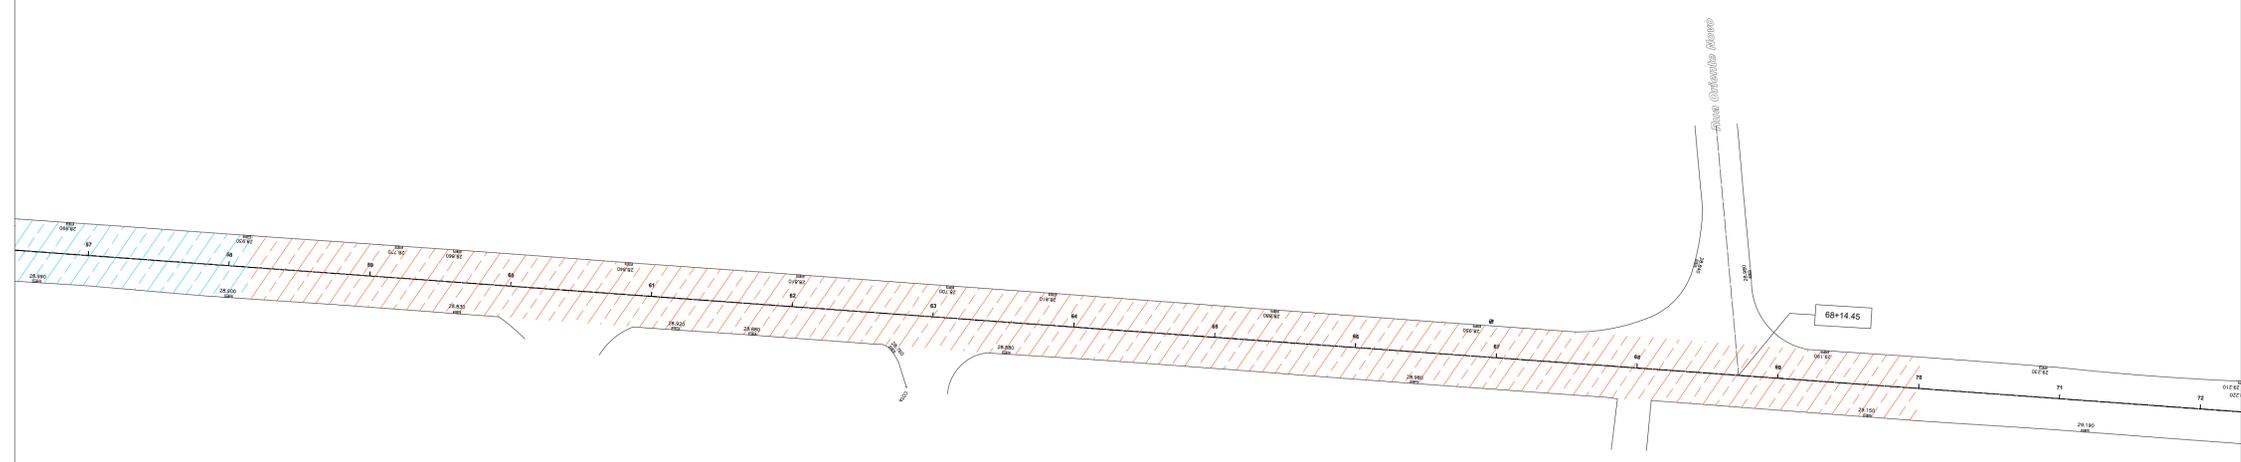

- LEGENDA:
- TRECHO FRESADO
 - TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
 - TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

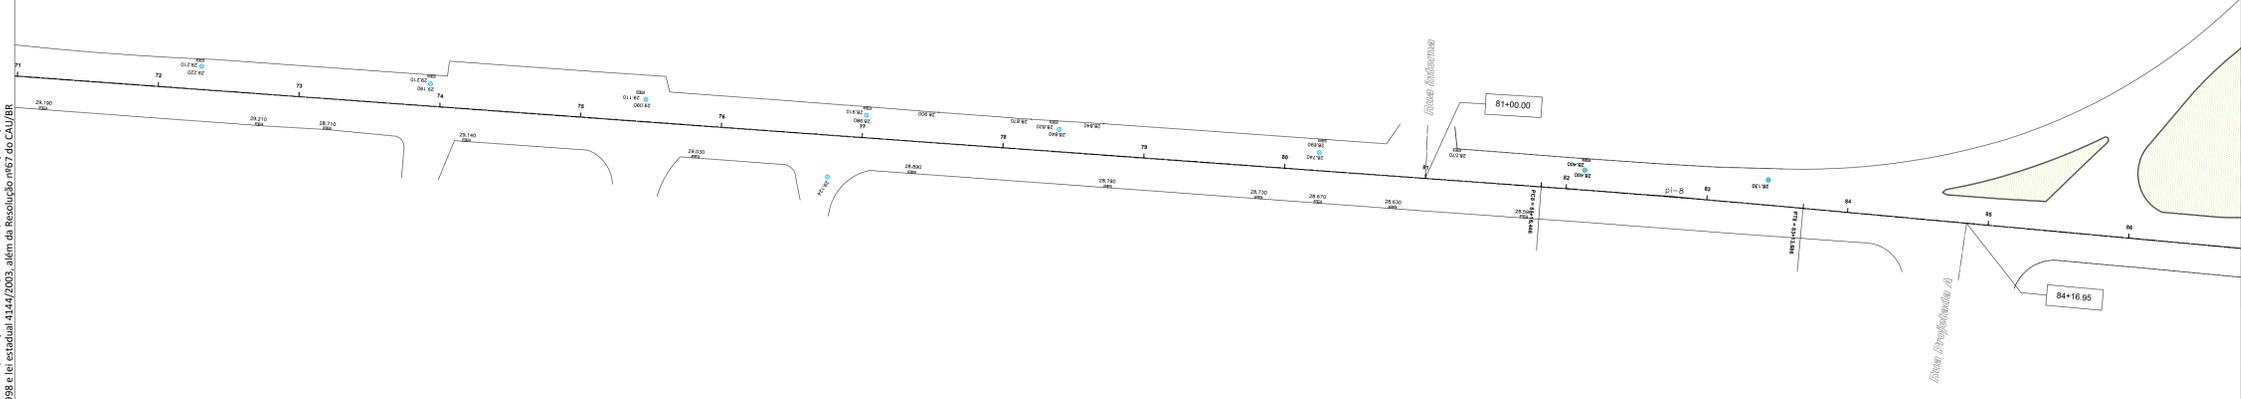

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

EMPRESA:
DIMENSIONAL ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

CERTIFICAÇÕES:
ETHOS Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

Nível A

Identificação:	Contratante:
00.211	SMIHC

Empreendimento:
PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço:
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ




Setor:	Profissionais responsáveis:
	Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos

Etapa:	Disciplina:	Escala:
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/500

Conteúdo da prancha:	Nº da Prancha:
ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE	03/08

Nome da prancha: MED-00211-AC-PE-01-F03-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR

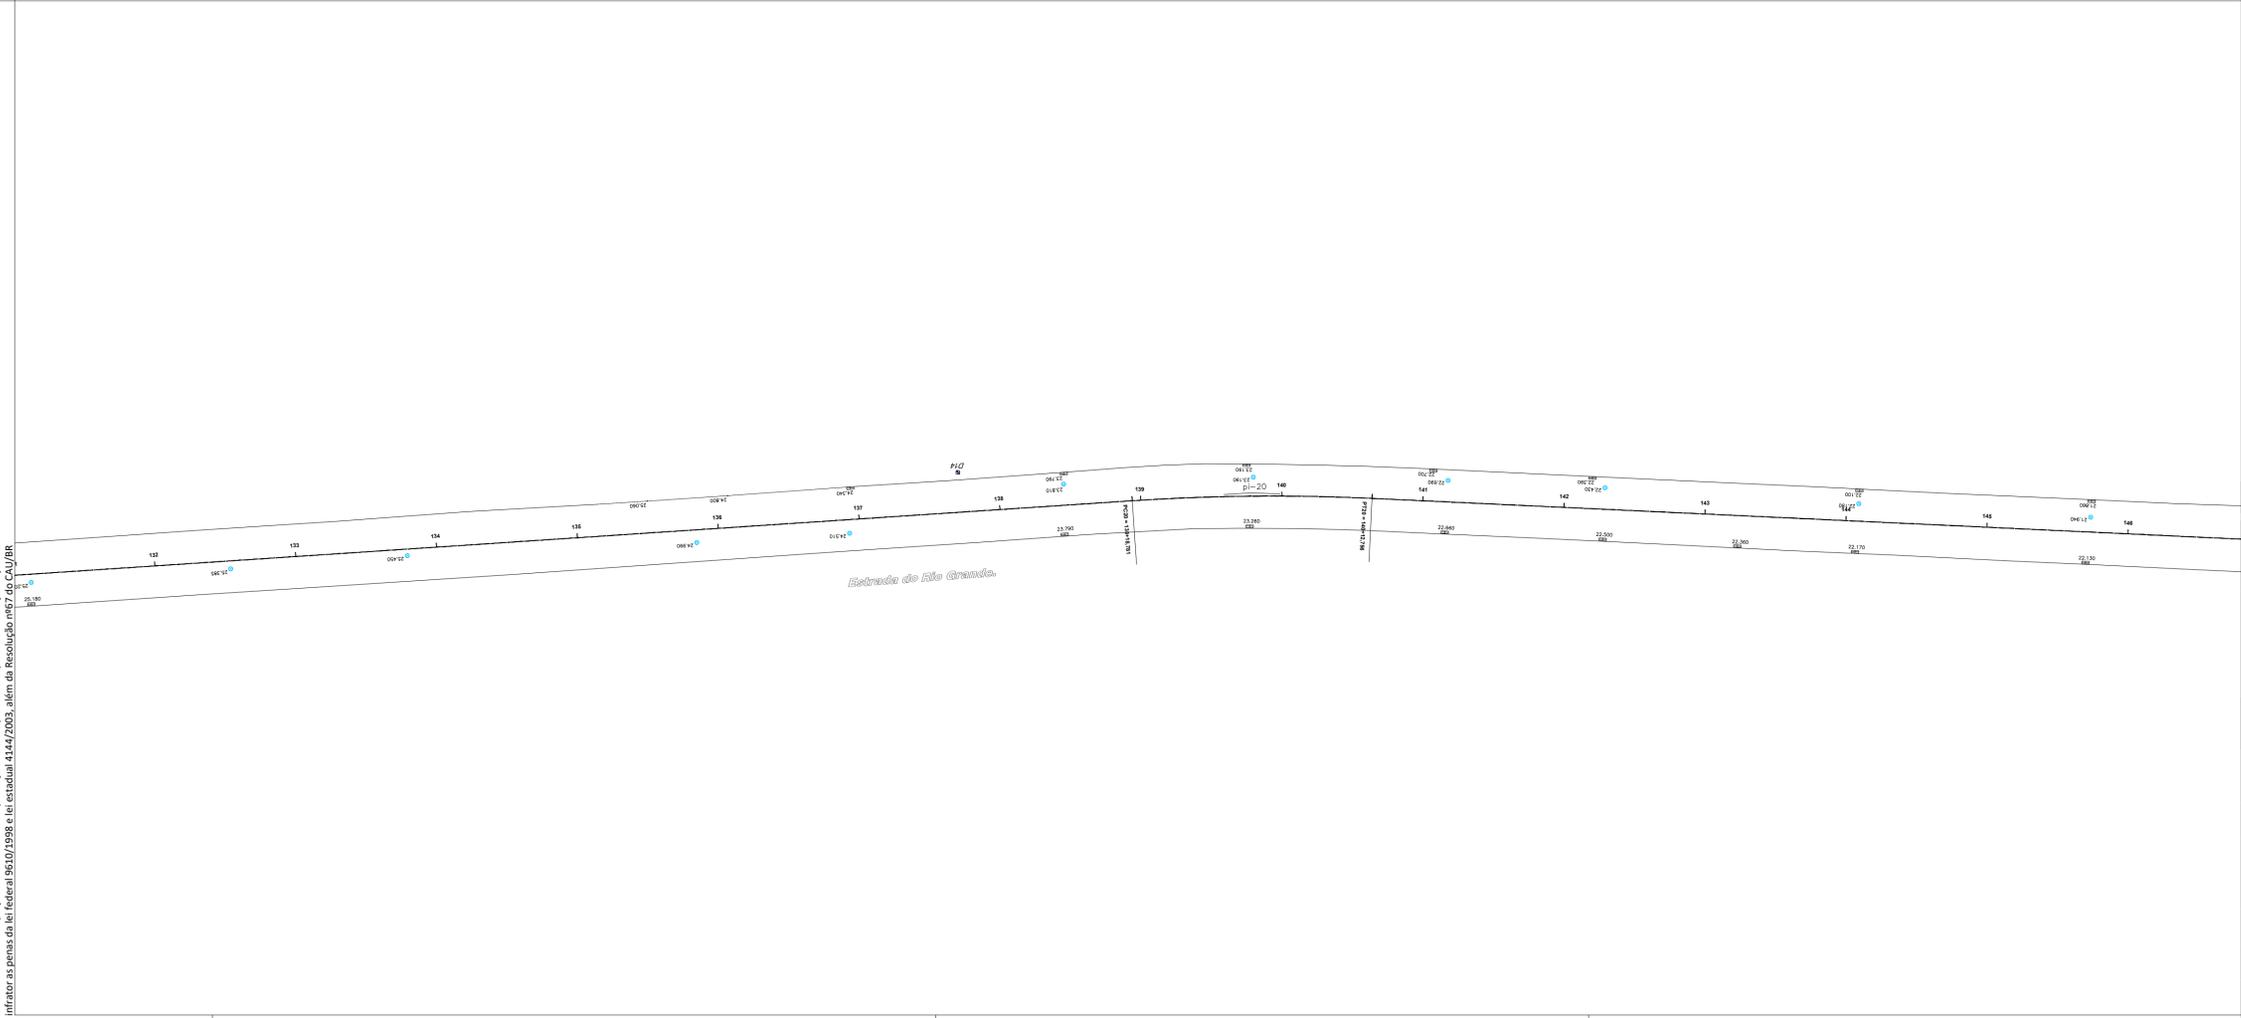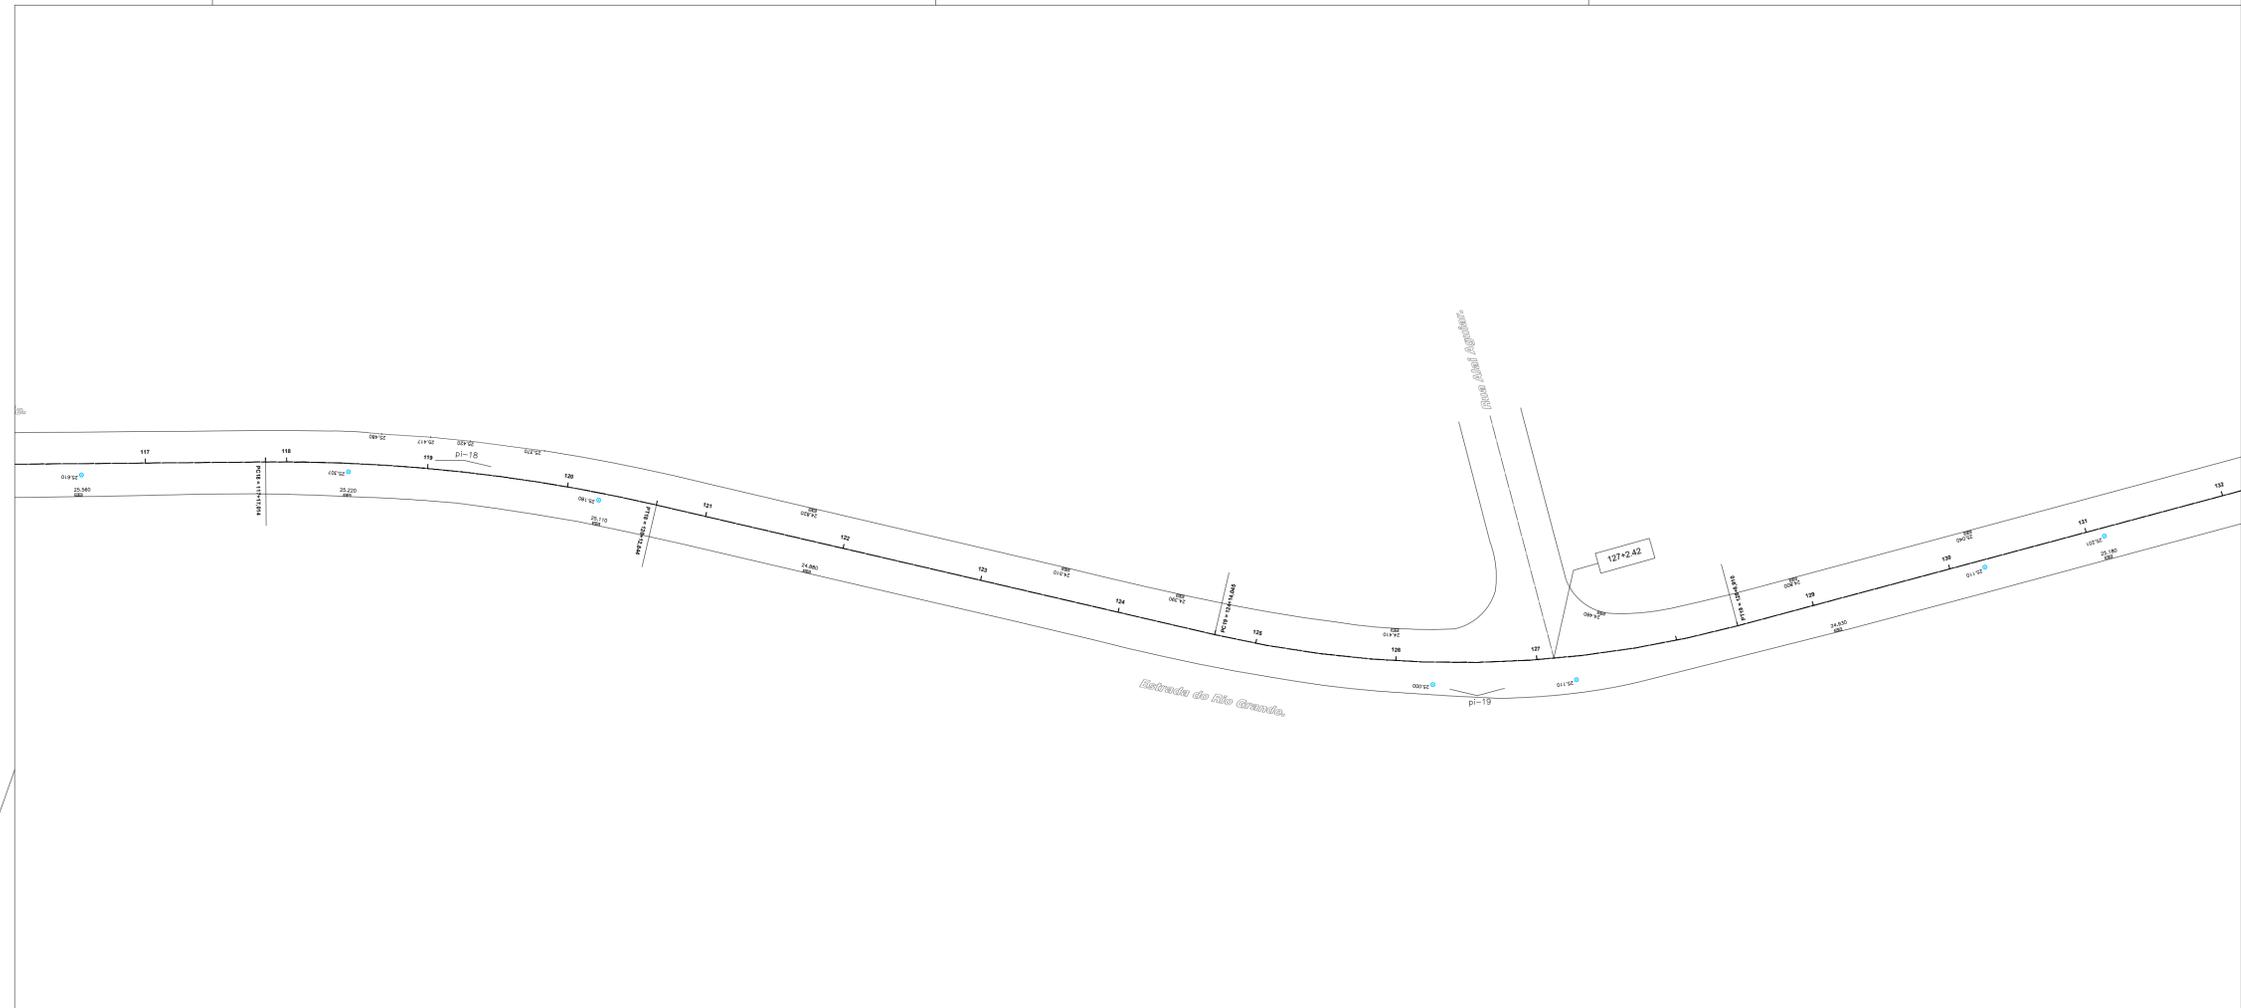

LEGENDA:

- TRECHO FRESADO
- TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
- TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:

Empresa Signatária do Pacto pela
 Integridade e Contra a Corrupção

Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos

SAB Certificação

PBOP Nível A

Identificação: **00.211** Contratante: **SMIHC**

Empreendimento: **PAVIMENTA RIO AP - 4**

Endereço: **ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ**


Setor: Profissionais responsáveis:
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello
 Eng. Osvaldo Peçanha
 Arqt. Fernando Santos

Etapa: **PROJETO EXECUTIVO** Disciplina: **PAVIMENTAÇÃO URBANA** Escala: **1/500**

Conteúdo da prancha: **ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE** Nº da Prancha: **05/08**
 Nome da prancha: **MED-00211-AC-PE-01-F05-R00**

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da Lei Federal 9610/1998 e da Lei Estadual 4144/2003, além da Resolução nº 67 do CNU/BB.

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da Lei Federal 9610/1998 e da Lei Estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.



- LEGENDA:**
- TRECHO FRESADO
 - TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
 - TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

Revisão	Data	DPA	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial	

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA**
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:
 Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção
 Associação Brasileira de Empresas de Engenharia
 SAB Certificação
 PBOP Nível A

Identificação: 00.211 **Contratante:** SMIHC



Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor: **Profissionais responsáveis:**
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello
 Eng. Osvaldo Peçanha
 Arqt. Fernando Santos

Etapa: PROJETO EXECUTIVO **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA **Escala:** 1/500

Conteúdo da prancha: ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE **Nº da Prancha:** 06/08
Nome da prancha: MED-00211-AC-PE-01-F06-R00

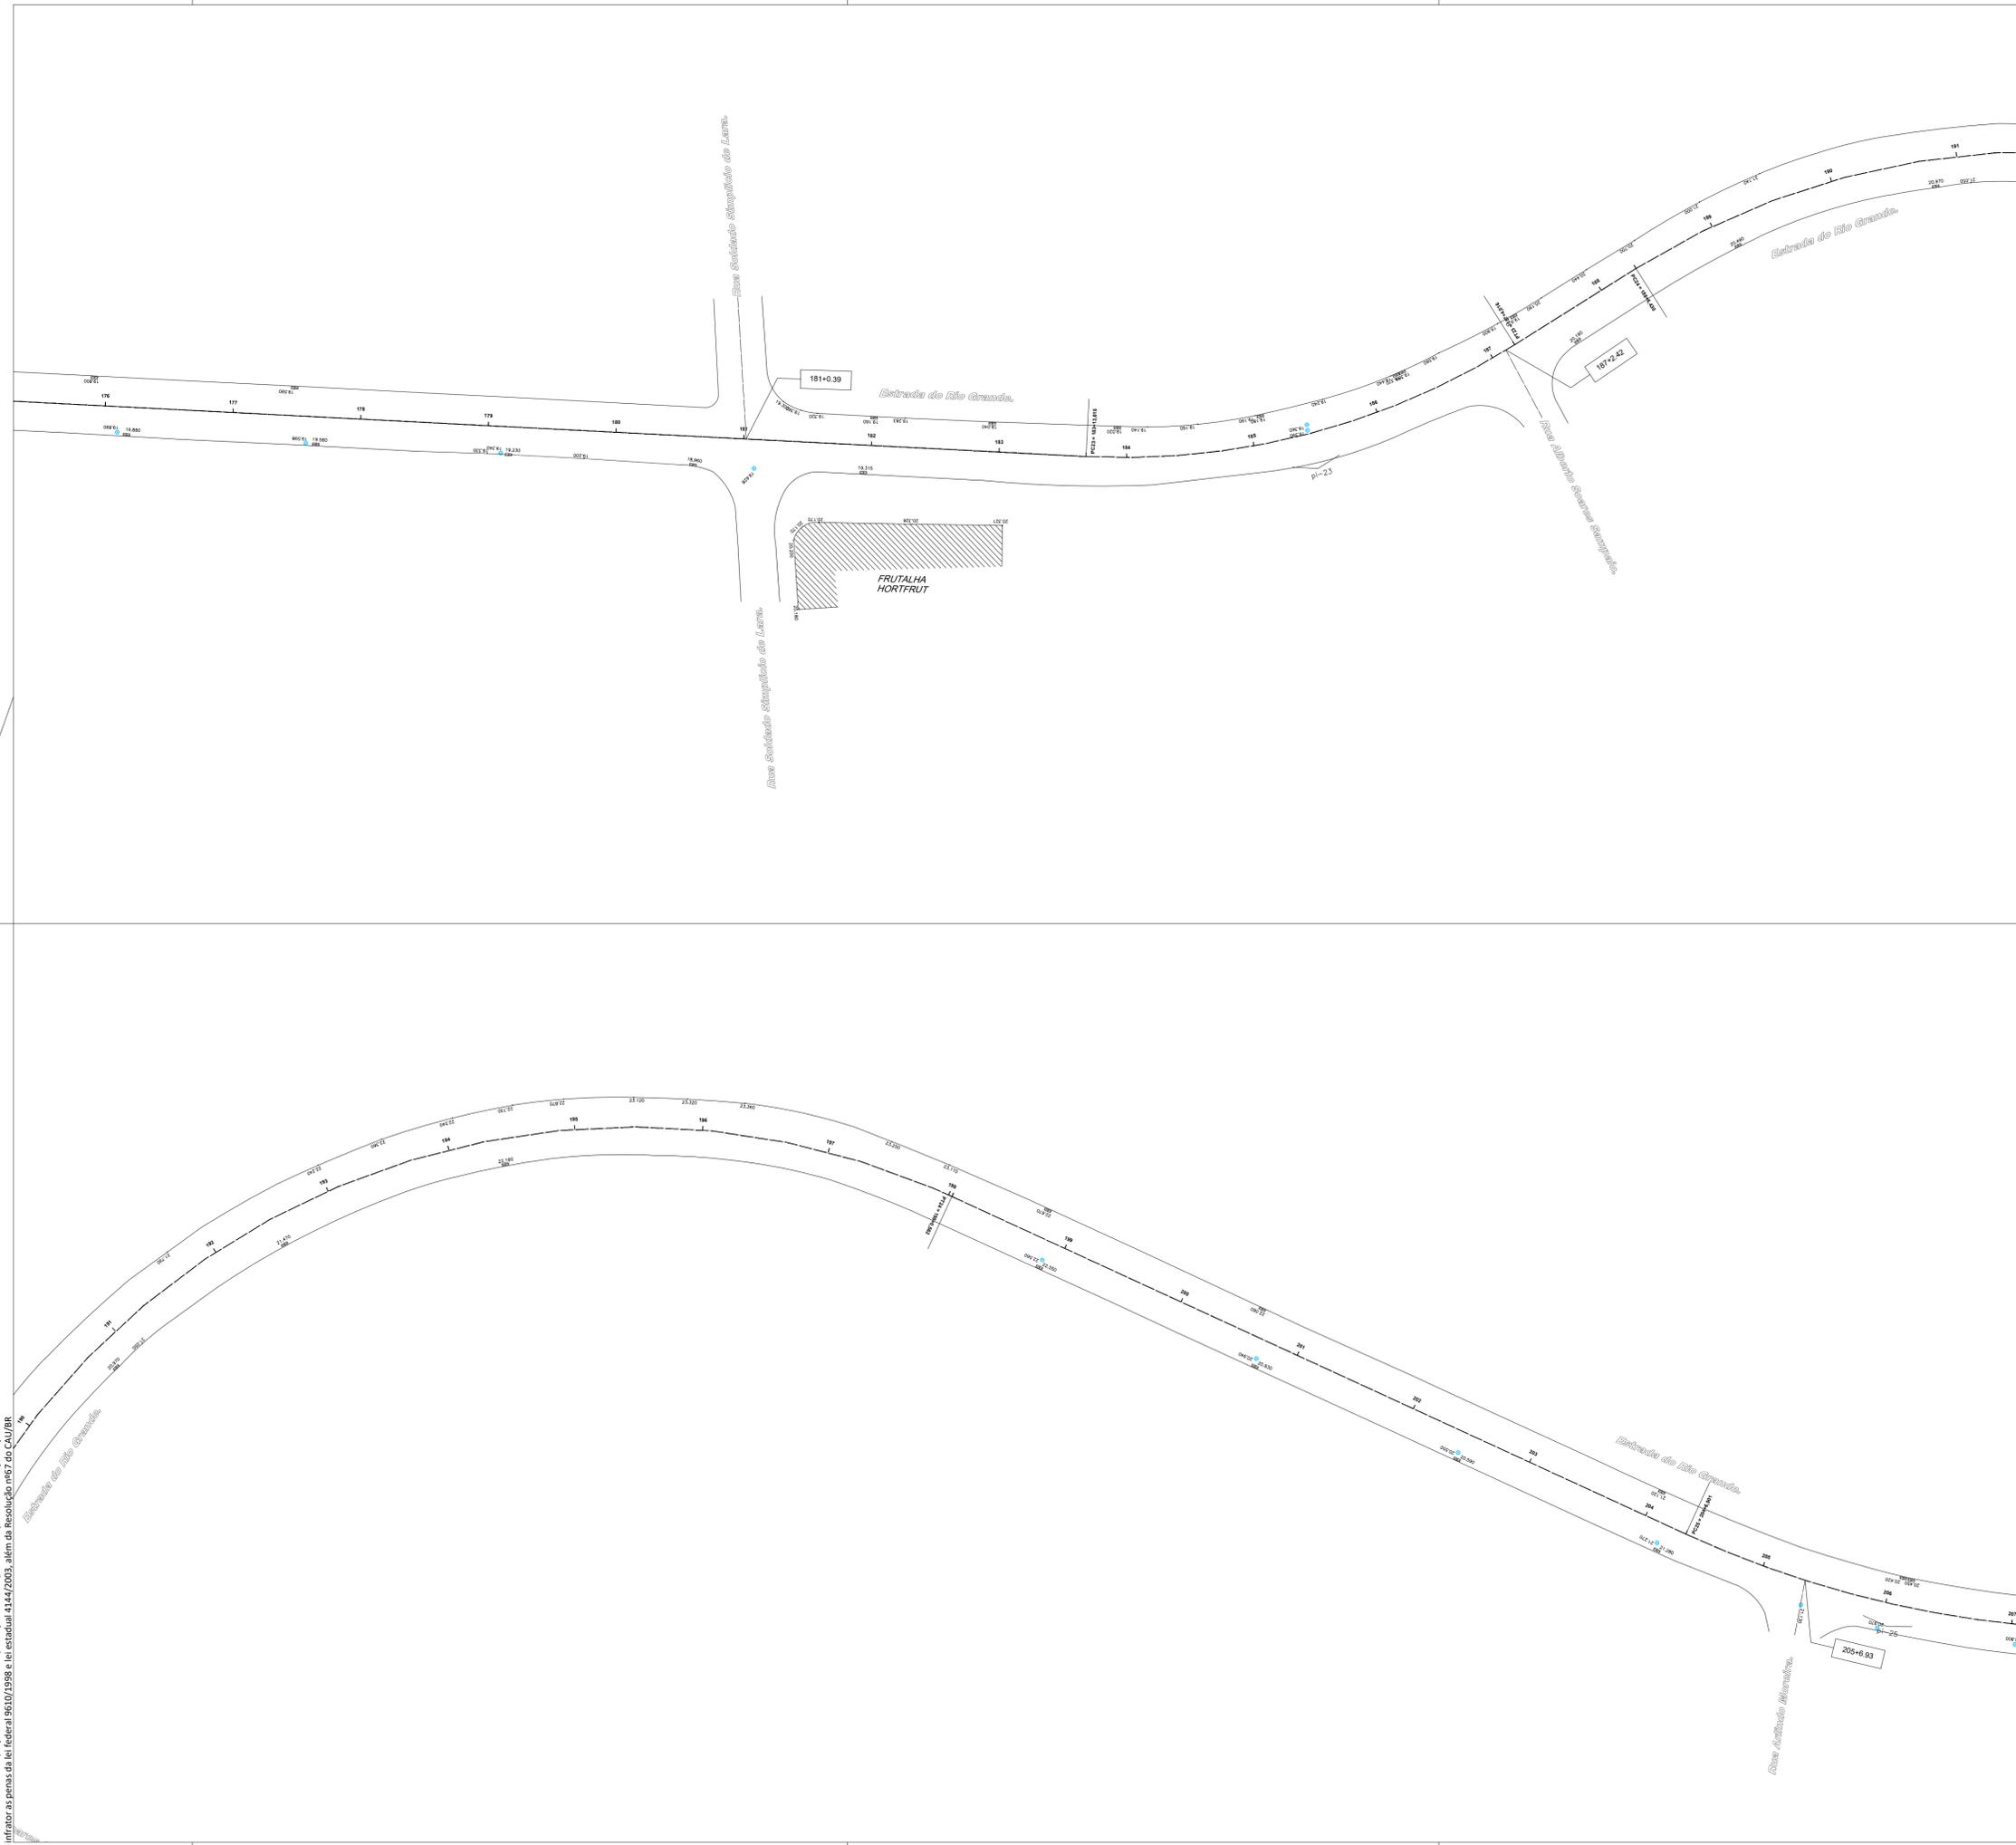

- LEGENDA:
- TRECHO FRESADO
 - TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
 - TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA

Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações: Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

Nível A

Identificação:	Contratante:
00.211	SMIHC

Empreendimento:
 PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço:
 ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ



Setor:	Profissionais responsáveis:
	Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos

Etapa:	Disciplina:	Escala:
PROJETO EXECUTIVO	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1/500

Conteúdo da prancha:	Nº da Prancha:
ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE	07/08

Nome da prancha: MED-00211-AC-PE-01-F07-R00


Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.

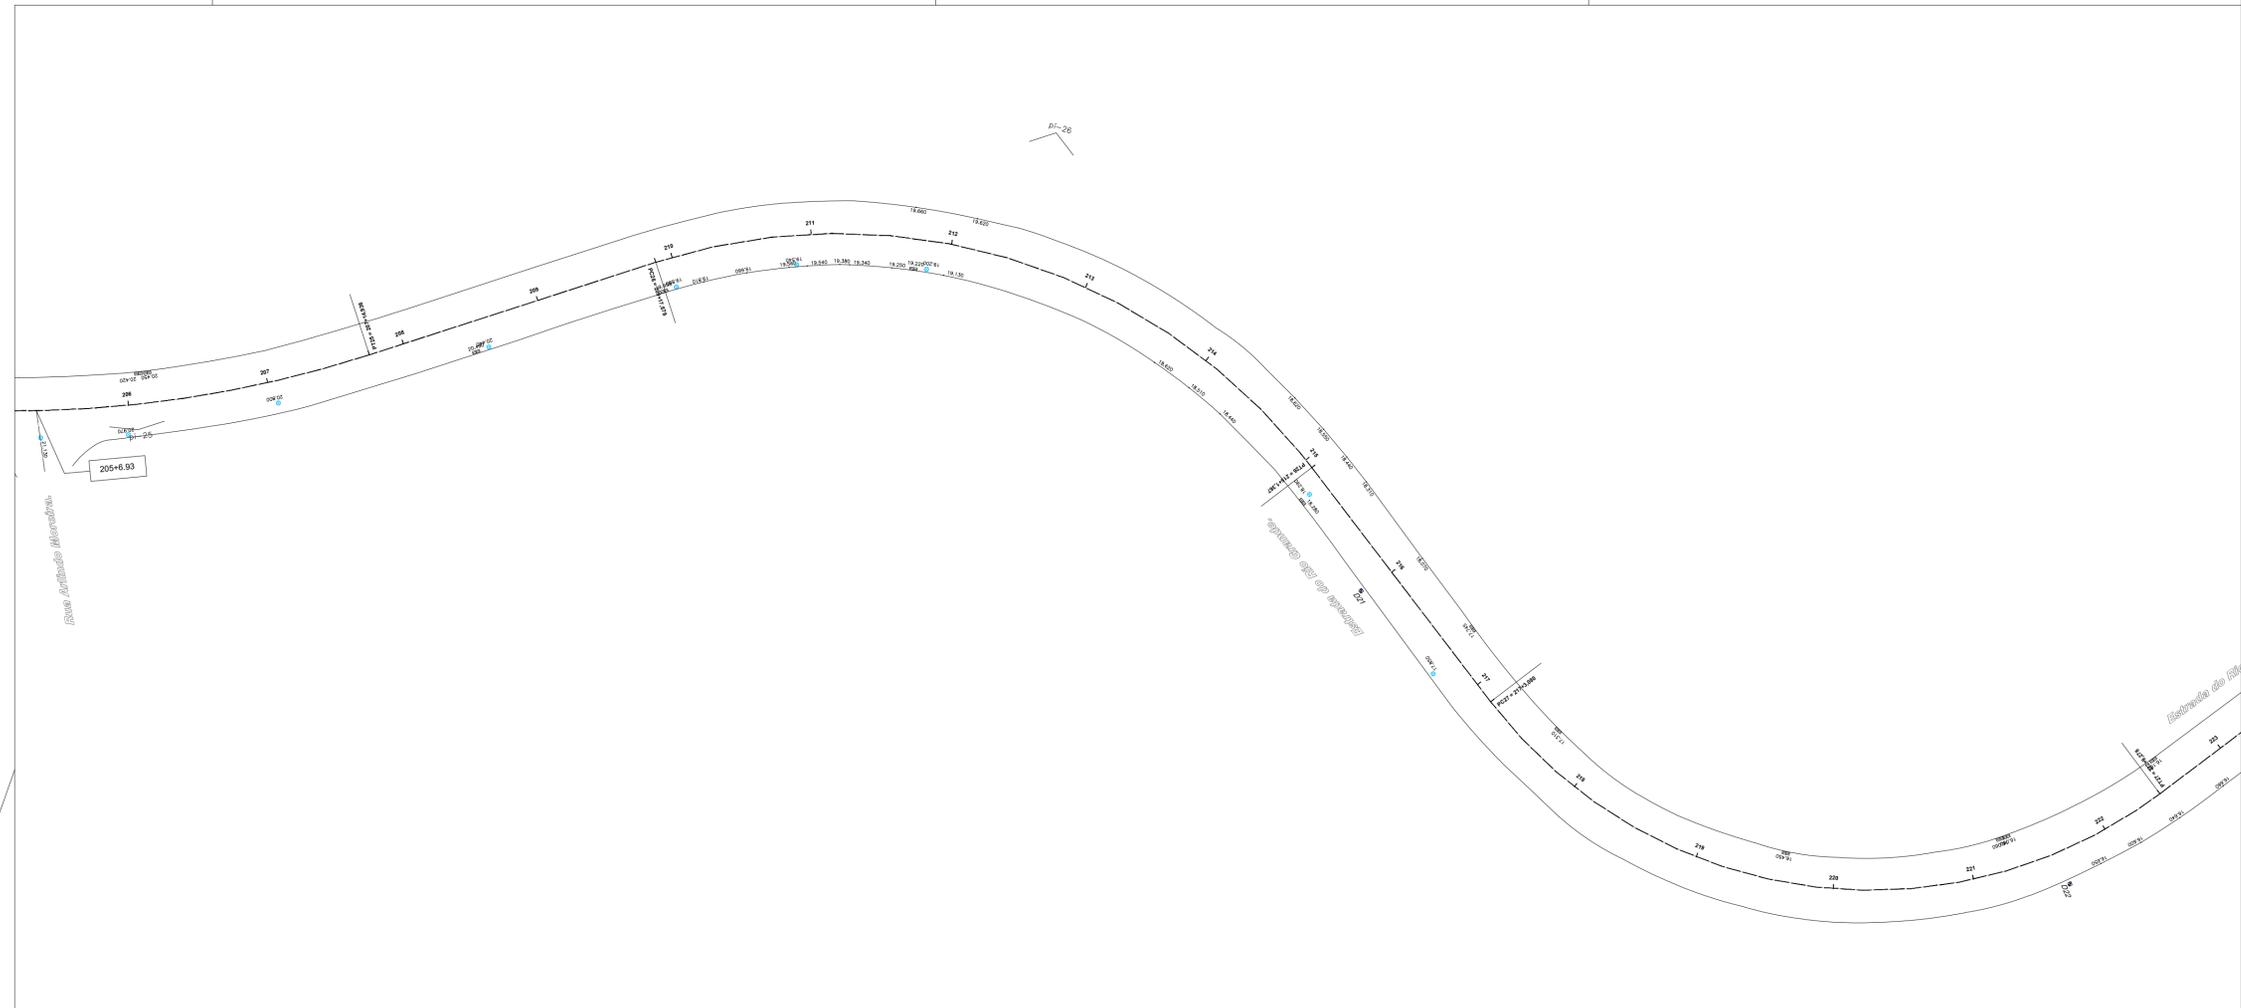

LEGENDA:

- TRECHO FRESADO
- TRECHO COM 1ª CAMADA DE CBUQ
- TRECHO COM 2ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
DATA DE ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	12.254,88	M2
1ª CAMADA	10.134,38	M2

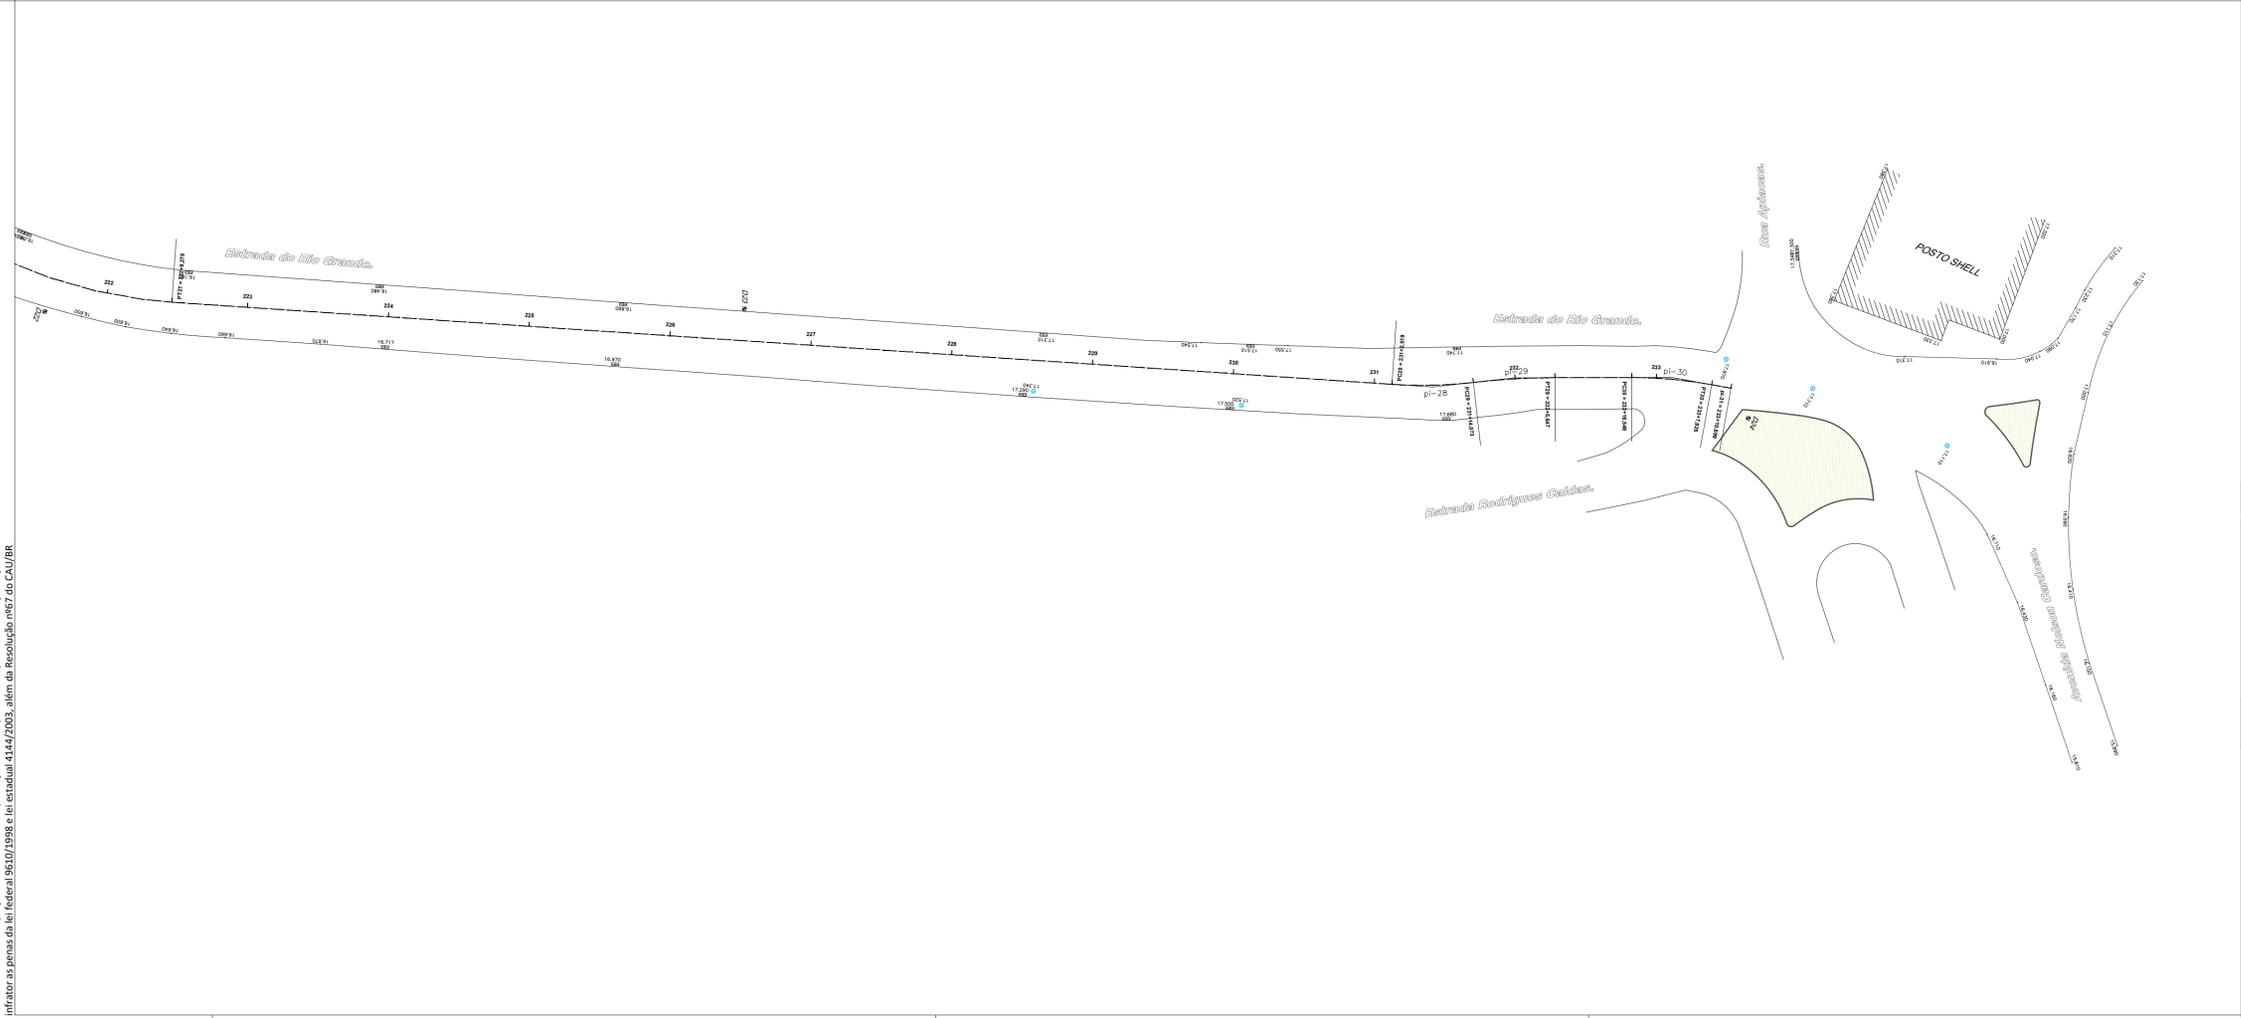

Revisão	Data	DPA	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial	

EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA**
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

CERTIFICAÇÕES: Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção
 Nível A

Identificação: 00.211 **Contratante:** SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ



Setor: **Profissionais responsáveis:**
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello
 Eng. Osvaldo Peçanha
 Arqt. Fernando Santos

Etapa: PROJETO EXECUTIVO **Disciplina:** PAVIMENTAÇÃO URBANA **Escala:** 1/500

Conteúdo da prancha: ACOMPANHAMENTO - ESTRADA DO RIO GRANDE **Nº da Prancha:** 08/08
Nome da prancha: MED-00211-AC-PE-01-F08-R00

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/BR.

CORPORATE EXECUTIVE OFFICES

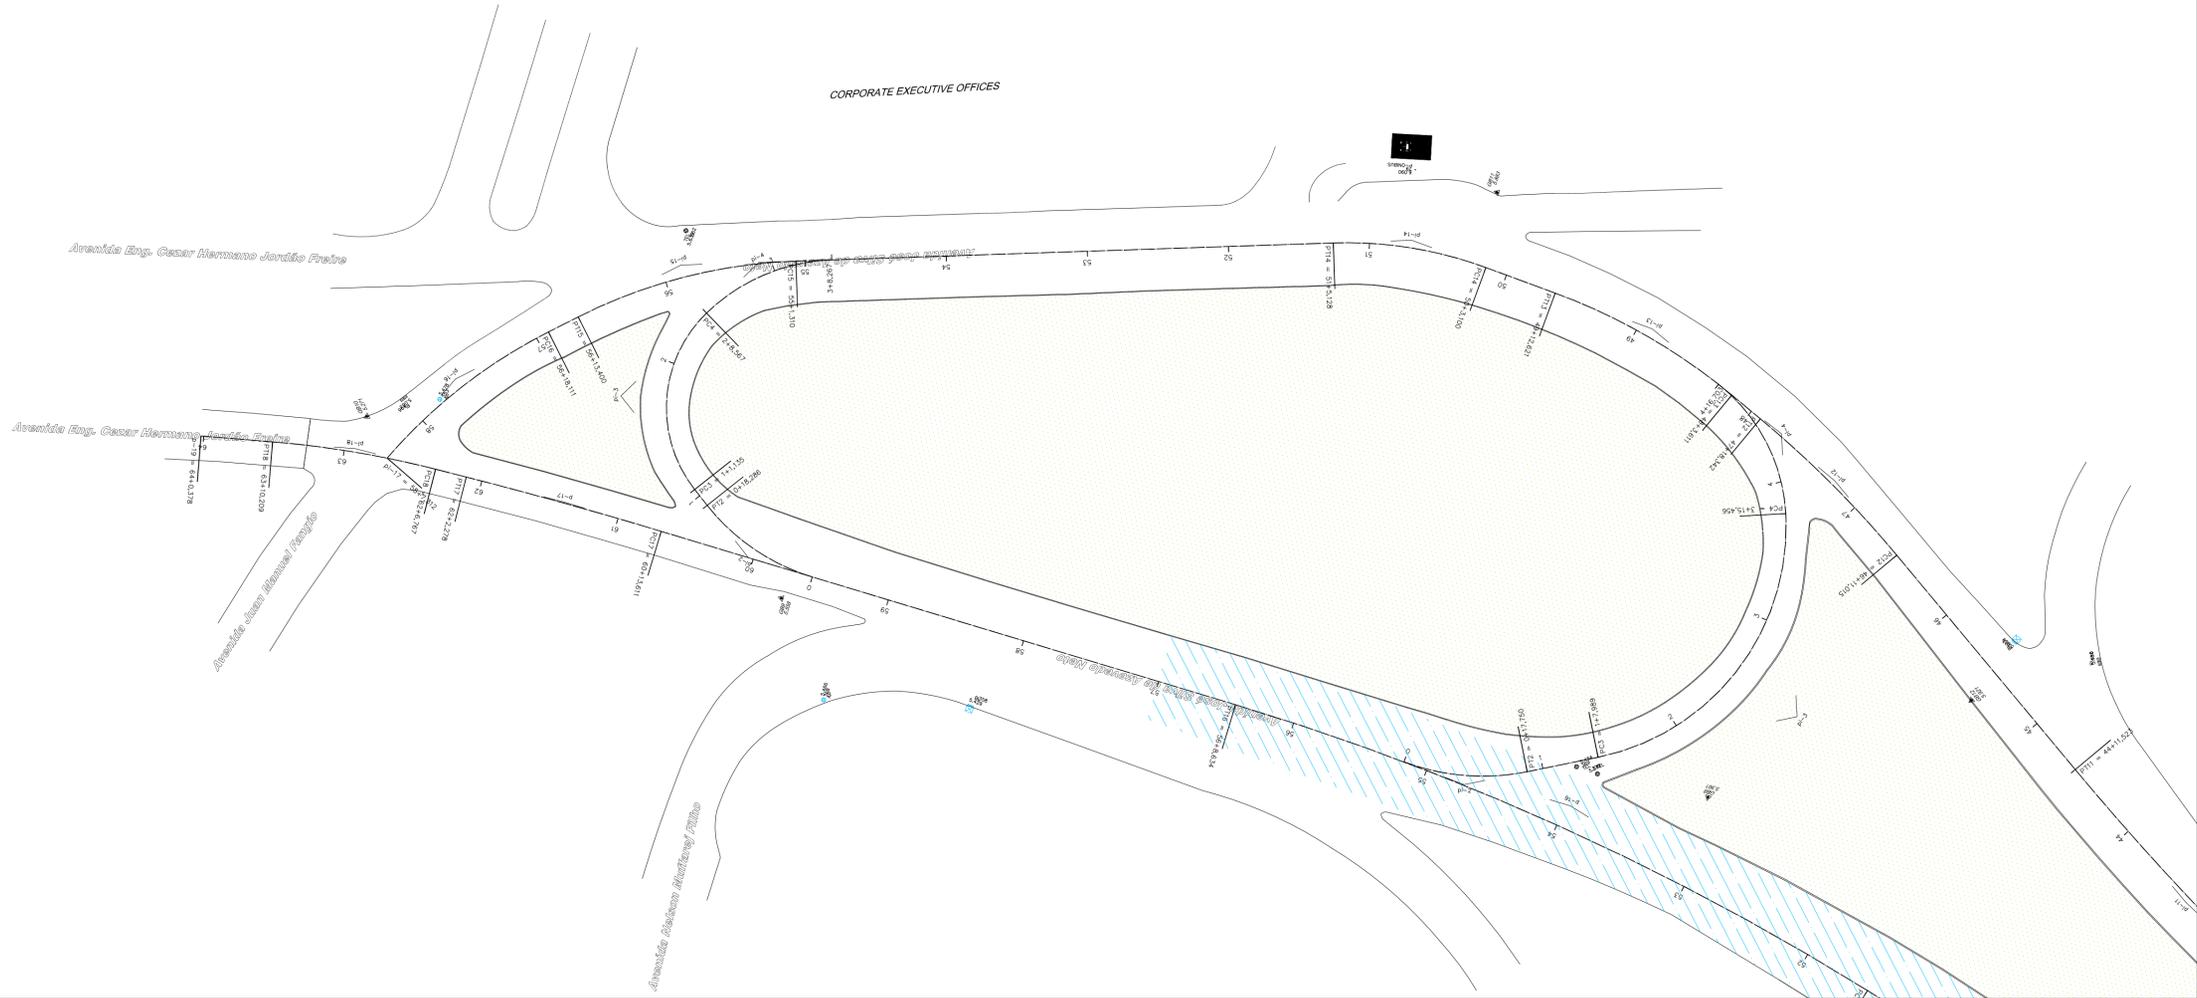

LEGENDA:


- TRECHO FRESADO
- TRECHO 1ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS

ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020

FRESAGEM	4.847,47	M2
1ª CAMADA	3.995,87	M2

CONDOMINIO 02

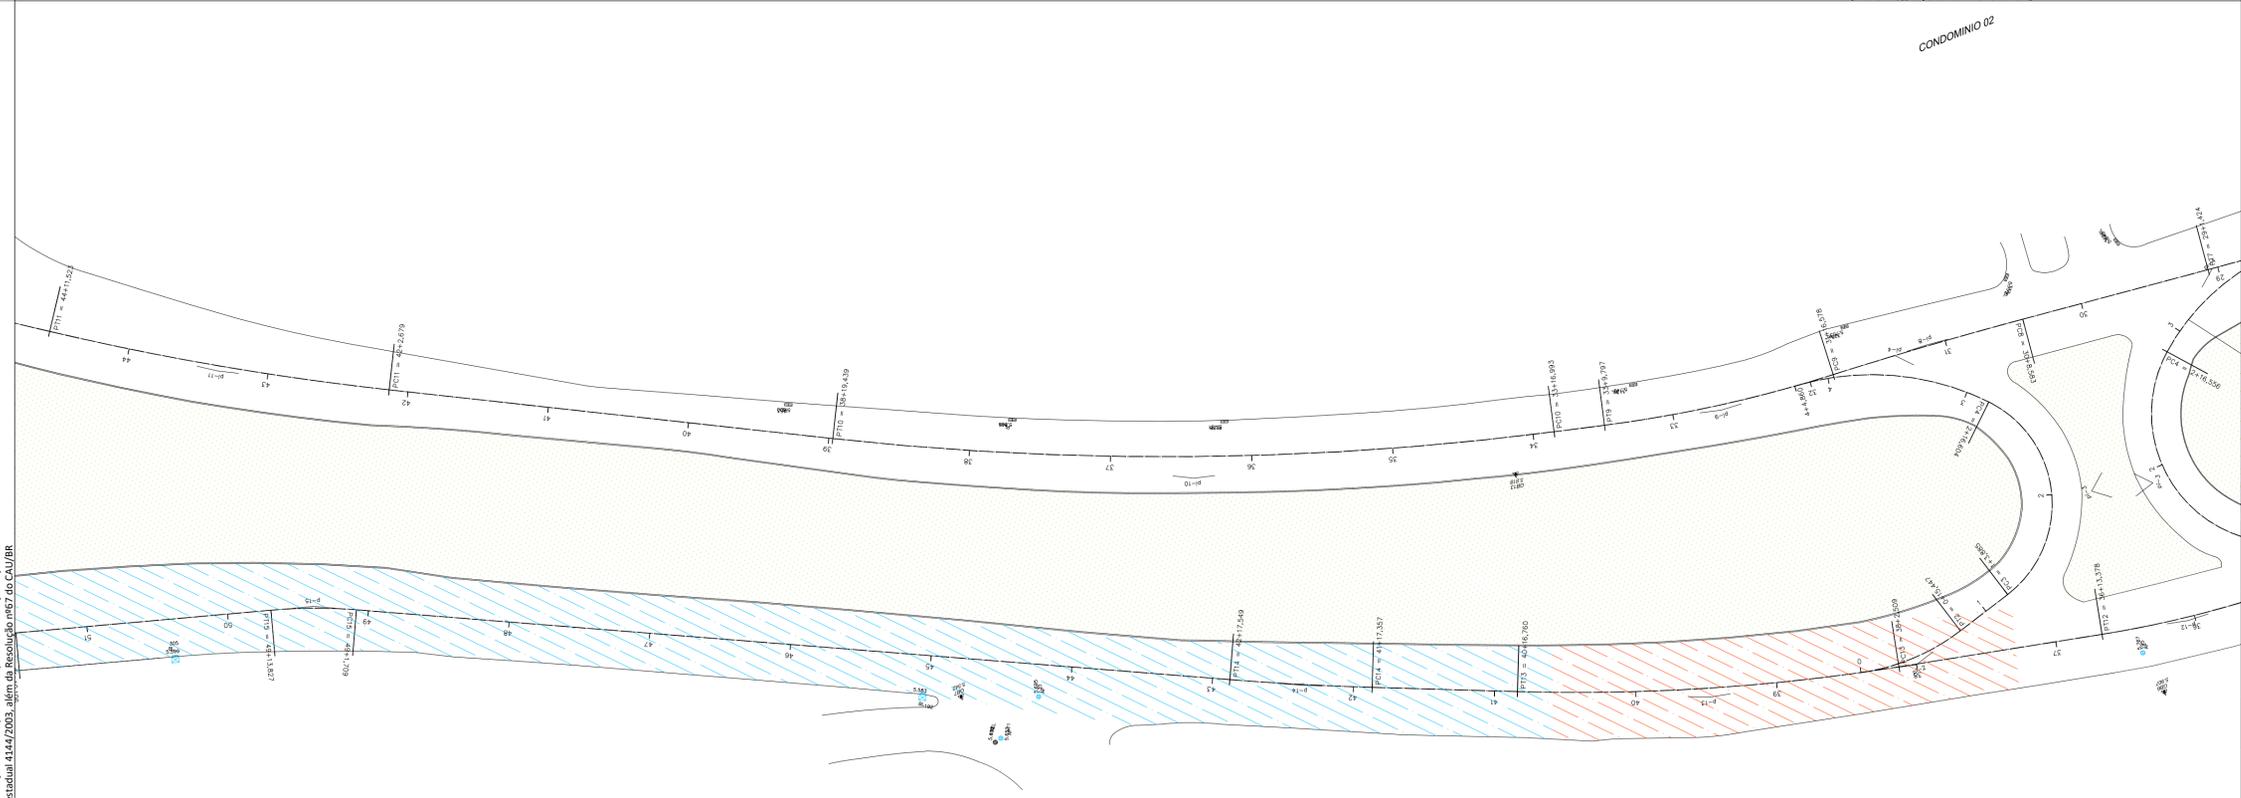

Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL** ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:
 Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção
 Associação Brasileira de Engenheiros e Arquitetos
 SAB Certificação
 PBOP Nível A

Identificação:	Contratante:
00.211	SMIHC



Empreendimento:
PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço:
ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor:	Profissionais responsáveis:
	Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello Eng. Osvaldo Peçanha Arqt. Fernando Santos

Escala:	1/500
Etapa:	PROJETO EXECUTIVO
Disciplina:	PAVIMENTAÇÃO URBANA
Conteúdo da prancha:	ACOMPANHAMENTO - AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO
Nome da prancha:	MED-00211-AC-PE-02-F01-R00
Nº da Prancha:	01/03

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e a lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CRA/RJ.

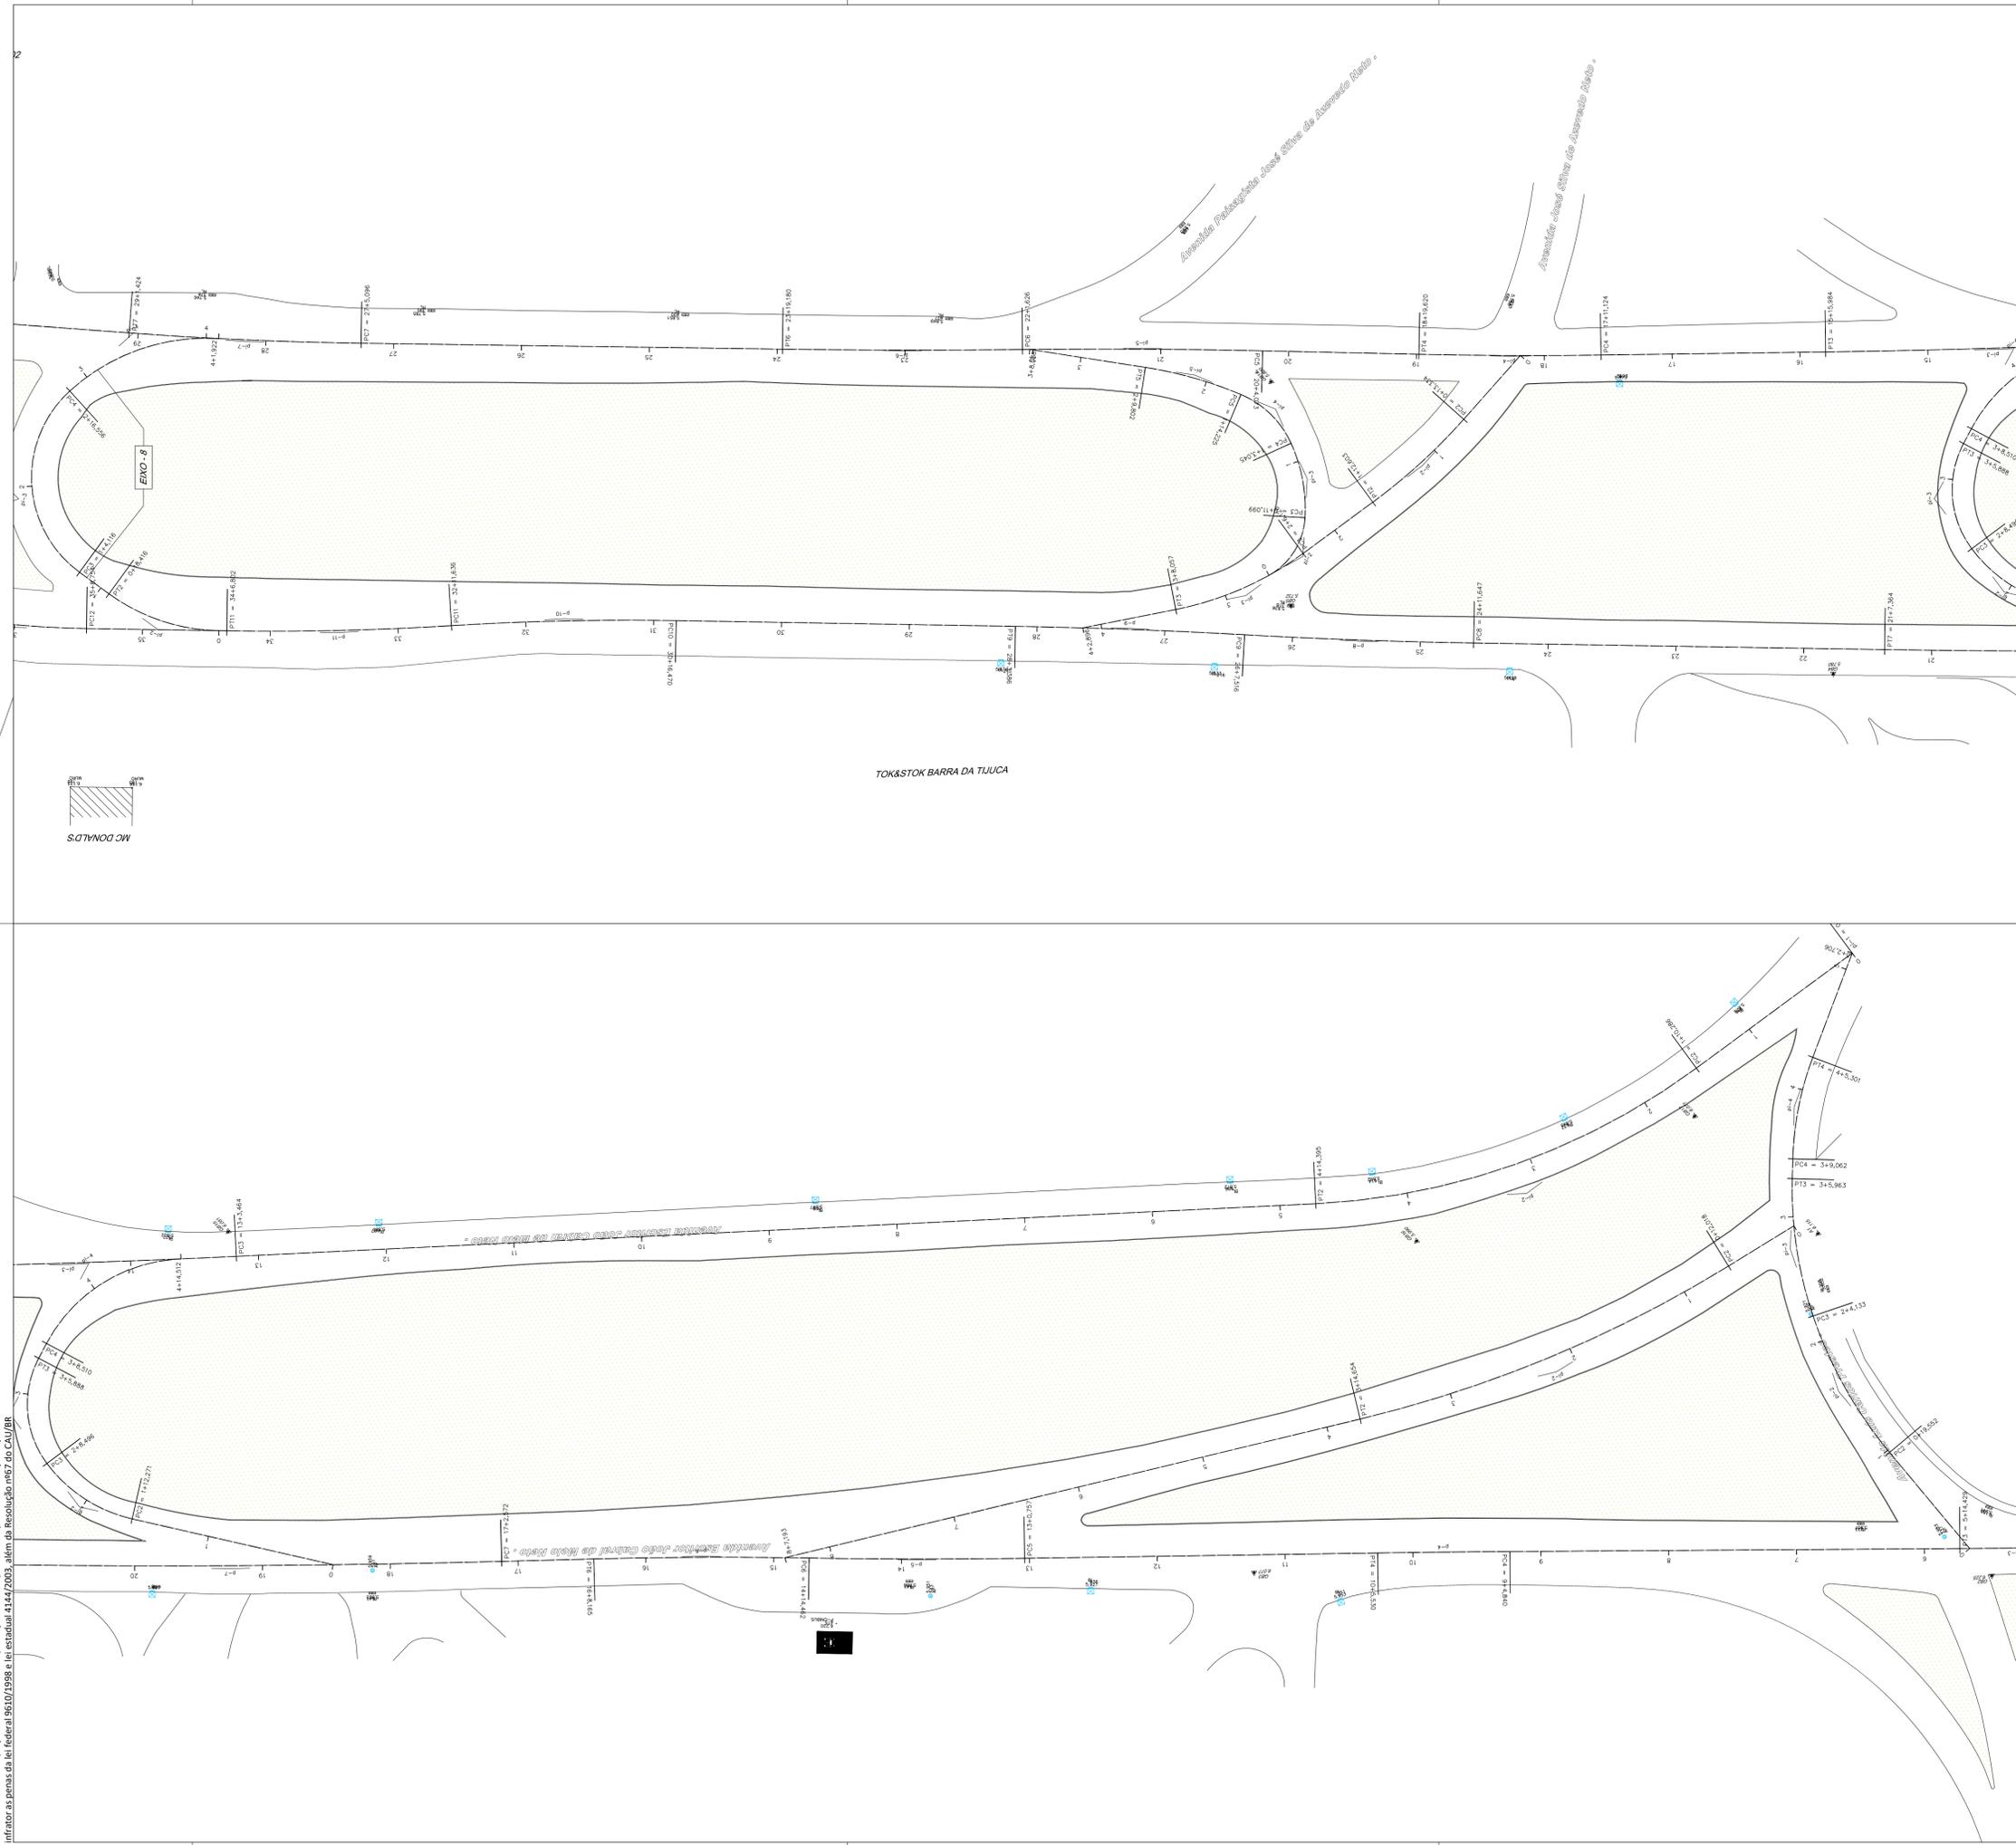

- LEGENDA:
- TRECHO FRESADO
 - TRECHO 1ª CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	4.847,47	M2
1ª CAMADA	3.995,87	M2

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e da estadual 4147/2003, além da Resolução nº67 do CAU/BR.



Revisão	Data	Emissão	Descrição
00	13/05/2020	DPA	Emissão inicial

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA**
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações: **ETHOS** Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

Identificação: **00.211** Contratante: **SMIHC**
 Empreendimento: **PAVIMENTA RIO AP - 4**
 Endereço: **ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ**
 Setor: **Profissionais responsáveis:**
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello
 Eng. Osvaldo Peçanha
 Arqt. Fernando Santos

Etapa: **PROJETO EXECUTIVO** Disciplina: **PAVIMENTAÇÃO URBANA** Escala: **1/500**
 Conteúdo da prancha: **ACOMPANHAMENTO - AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO** Nº da Prancha: **02/03**
 Nome da prancha: **MED-00211-AC-PE-02-F02-R00**

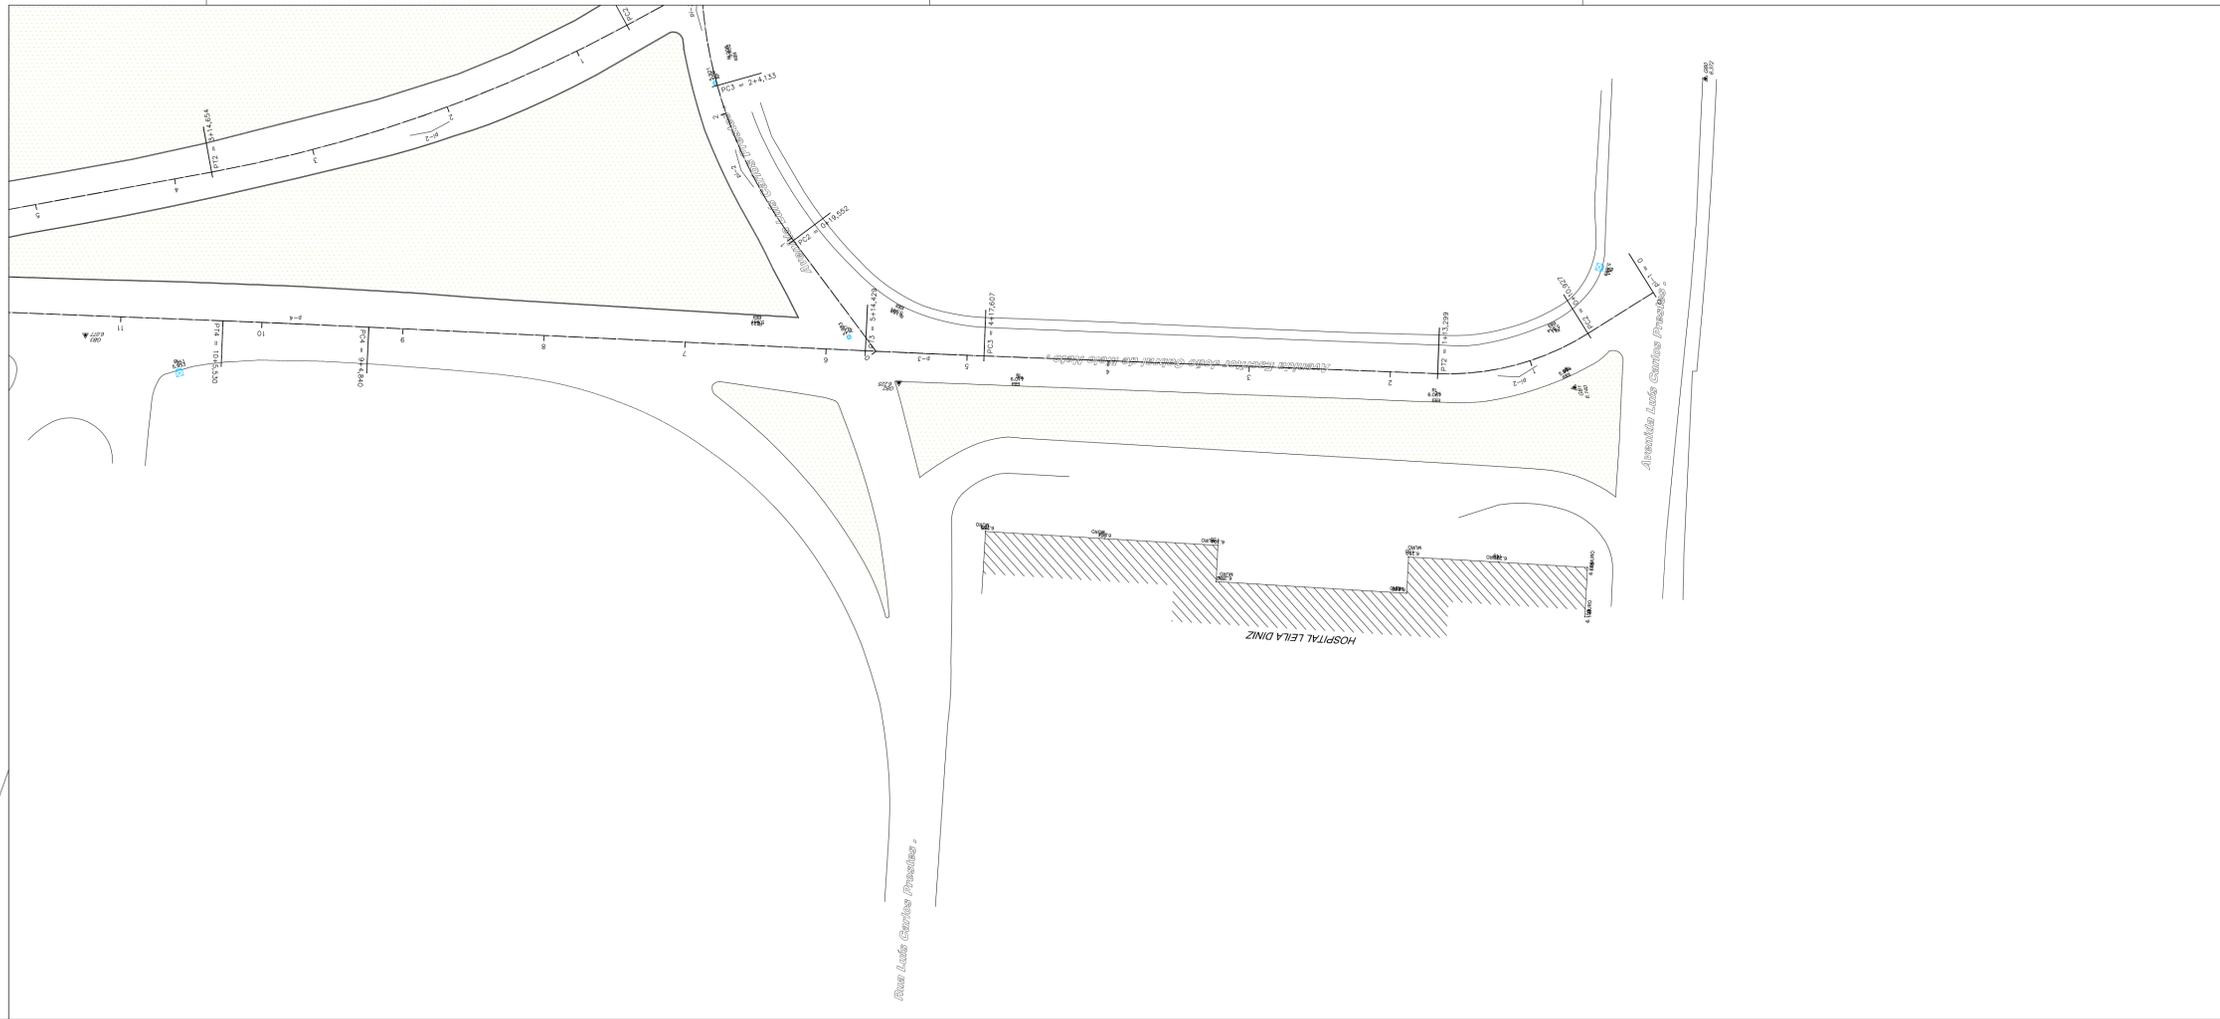

LEGENDA:

- TRECHO FRESADO
- TRECHO 1º CAMADA DE CBUQ

QUADRO DE QUANTIDADES ACUMULADAS		
ATUALIZAÇÃO: 13/05/2020		
FRESAGEM	4.847,47	M2
1º CAMADA	3.995,87	M2

Direitos autorais dos projetos reservados. A reprodução total ou parcial sem prévia autorização sujeitará o infrator as penas da lei federal 9610/1998 e lei estadual 4144/2003, além da Resolução nº67 do CNU/IBR.

Revisão	Data	Emissão	Emissão Inicial	Descrição
00	13/05/2020	DPA		

Empresa: **DIMENSIONAL**
 ENGENHARIA
 NOSSA QUALIDADE FAZ A DIFERENÇA
 Rua Sete de Setembro, 98, gr. 605, Centro
 Rio de Janeiro - RJ. CEP: 20.050-002
 Tel.: 55 21 2220-0368
 dimensional@dimensionalengenharia.com

Certificações:
 Empresa Signatária do Pacto pela Integridade e Contra a Corrupção

 Nível A


Identificação: 00.211 **Contratante:** SMIHC

Empreendimento: PAVIMENTA RIO AP - 4

Endereço: ESTR. DA LIGAÇÃO, 1397 - TAQUARA/RJ

Setor: **Profissionais responsáveis:**
 Eng. Vinicius Benevides Téc. Vinicius Singello
 Eng. Osvaldo Peçanha
 Arqt. Fernando Santos

Etapas: PROJETO EXECUTIVO	Disciplina: PAVIMENTAÇÃO URBANA	Escala: 1/500
Conteúdo da prancha: ACOMPANHAMENTO - AV. JOSÉ SILVA DE AZEVEDO NETO		Nº da Prancha: 03/03
Nome da prancha: MED-00211-AC-PE-02-F03-R00		

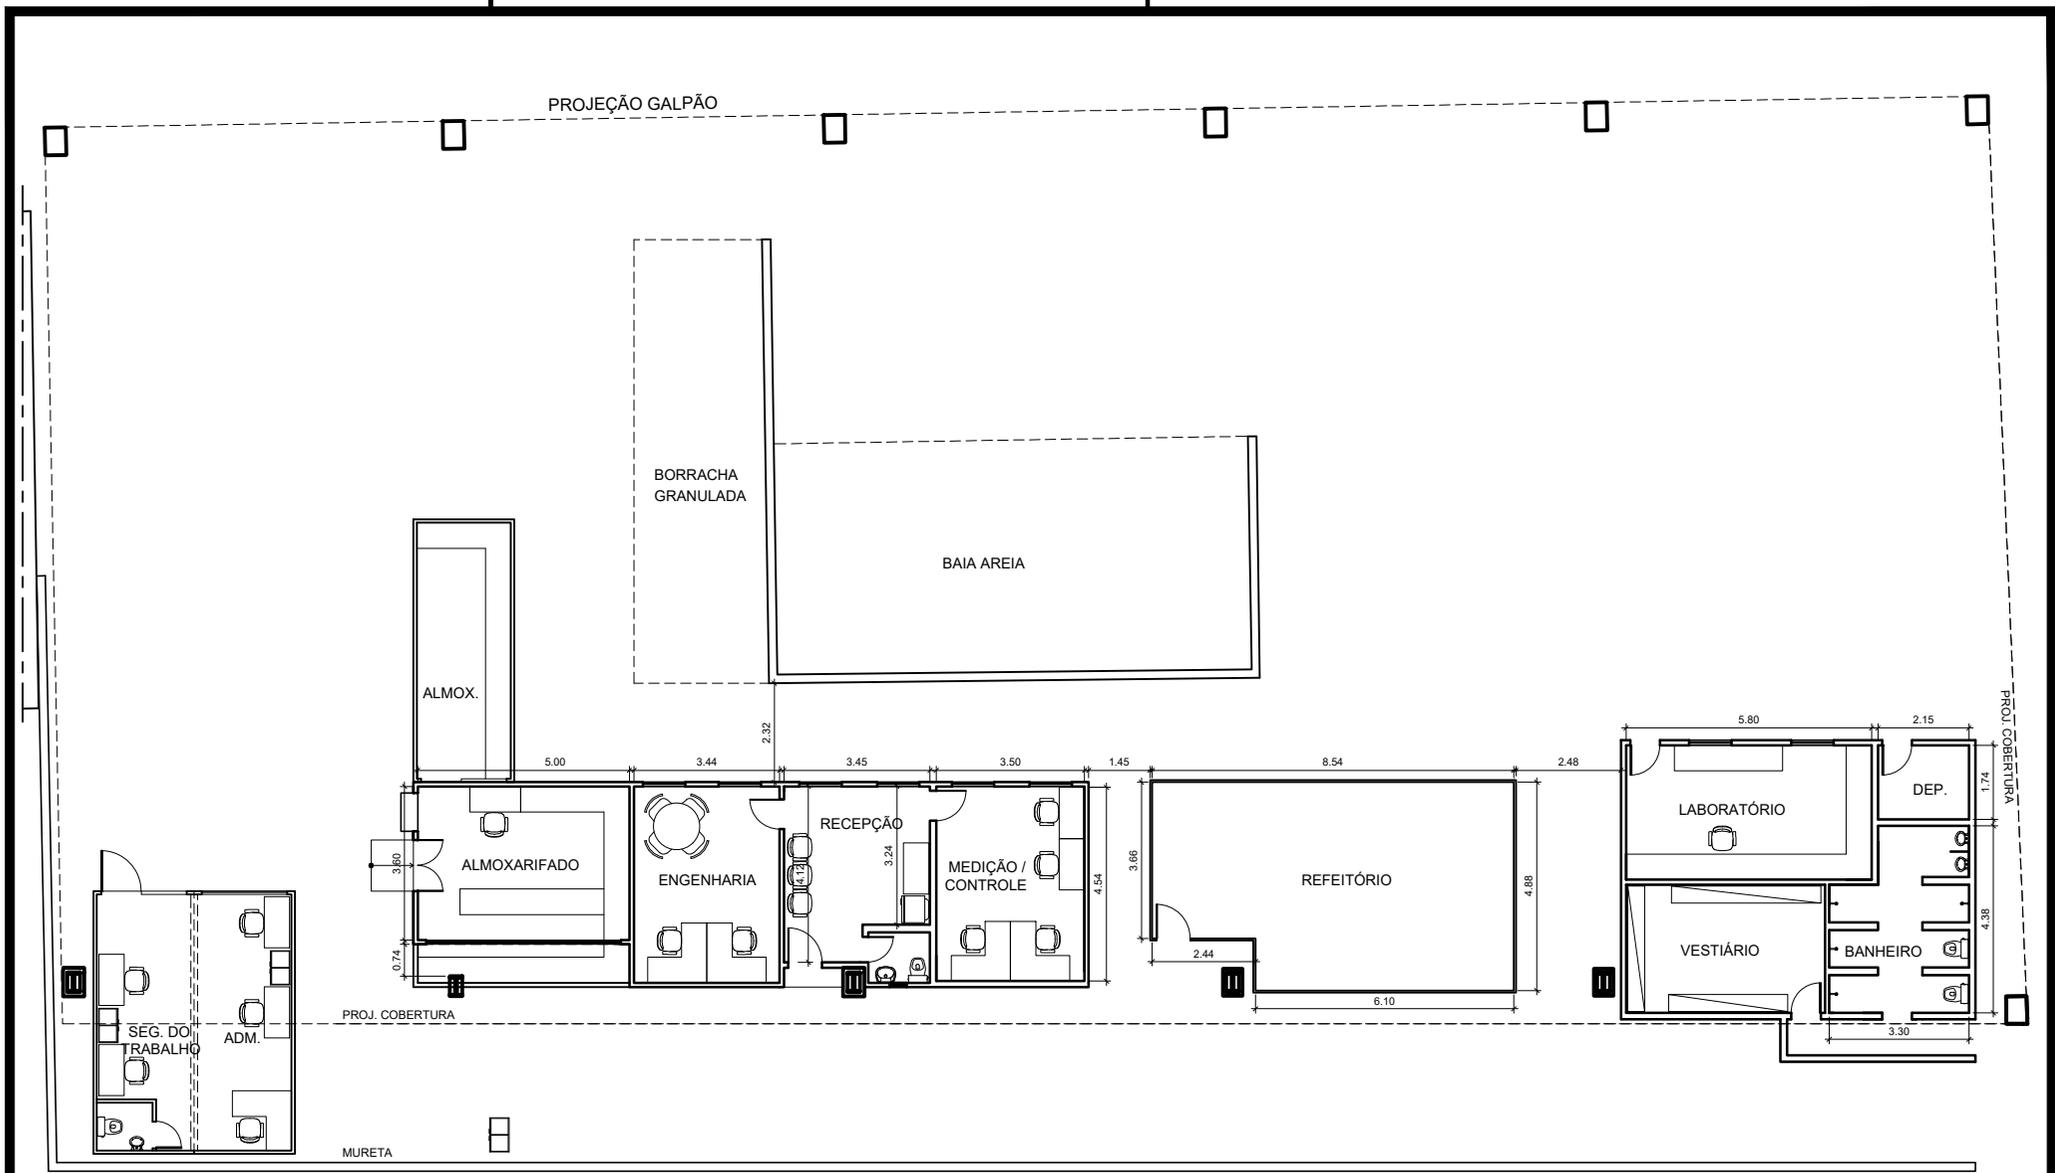

	<p>- CANTEIRO DE OBRAS - - JACARÉPAGUÁ -</p>	<p>OBRA 00.211</p>
		<p>ESCALA 1/125</p>

Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**


Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**


DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA

Estrada do Rio Grande					Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)					
Ida	Volta	Ida	Volta				
2,50	2,40	3,00	3,30	2,80	0,30	3,10	

Trajeto para Faixa 1 - Ida

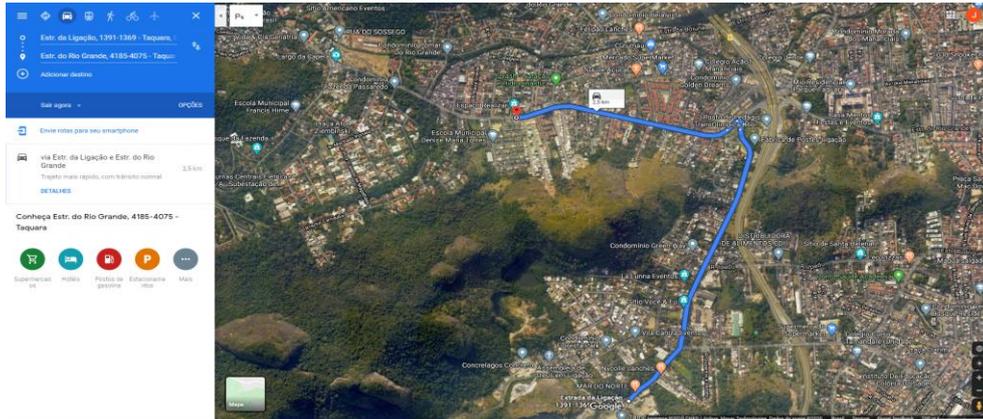

Trajeto para Faixa 1 - Volta

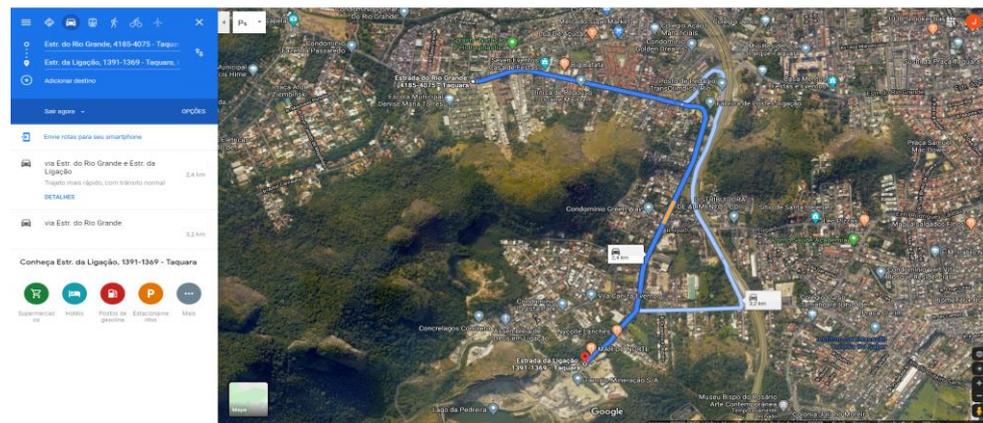

Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**


Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA

Estrada do Rio Grande					Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)					
Ida	Volta	Ida	Volta				
2,50	2,40	3,00	3,30	2,80	0,30	3,10	

Trajeto para Faixa 2 - Ida

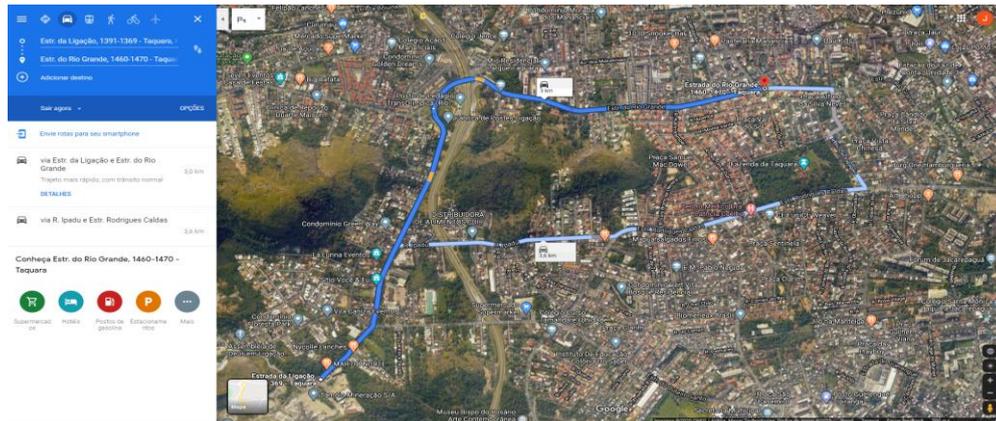

Trajeto para Faixa 2 - Volta



Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**

Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA FRESAGEM


Estrada do Rio Grande

Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)		Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Ida	Volta	Ida	Volta			
4,10	3,30	1,80	1,80	2,75	-	2,75

Trajeto para Faixa 1 - Ida



Trajeto para Faixa 1 - Volta

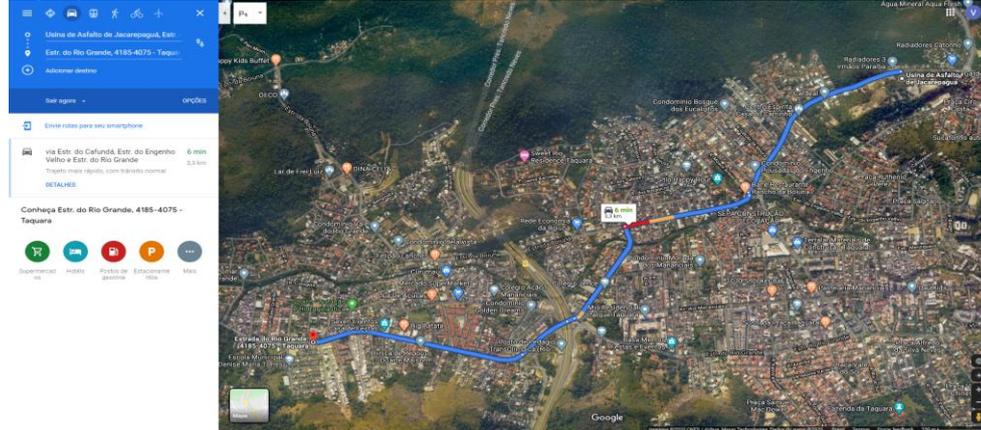

Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**


Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**


DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA FRESAGEM

Estrada do Rio Grande						
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)		Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Ida	Volta	Ida	Volta			
4,10	3,30	1,80	1,80	2,75	-	2,75

Trajeto para Faixa 2 - Ida

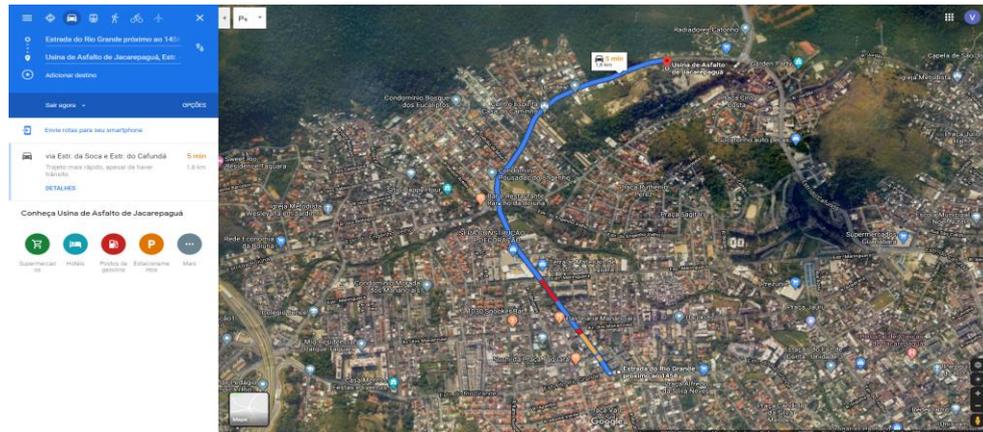

Trajeto para Faixa 2 - Volta

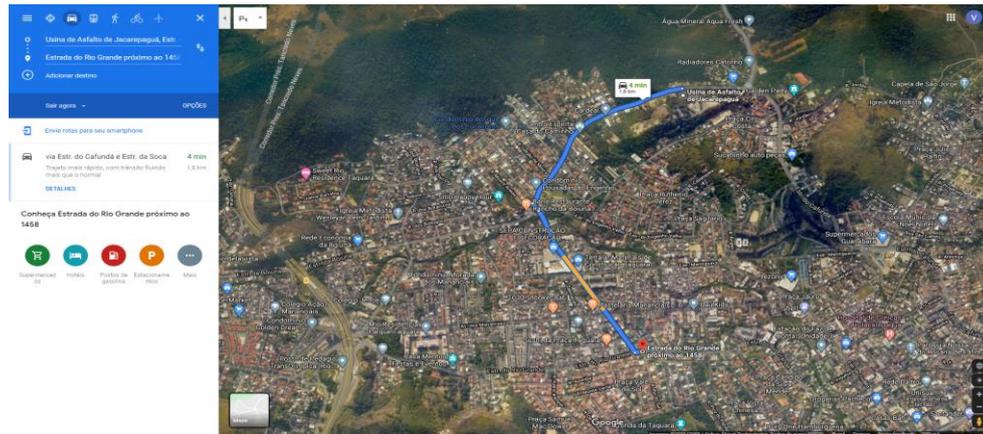

Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**


Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**


DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA

Av. José Da Silva Azevedo Neto					Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)					
Ida	Volta	Ida	Volta				
12,90	14,00	12,60	15,10	13,65	0,30	13,95	

Trajeto para Faixa 1 - Ida

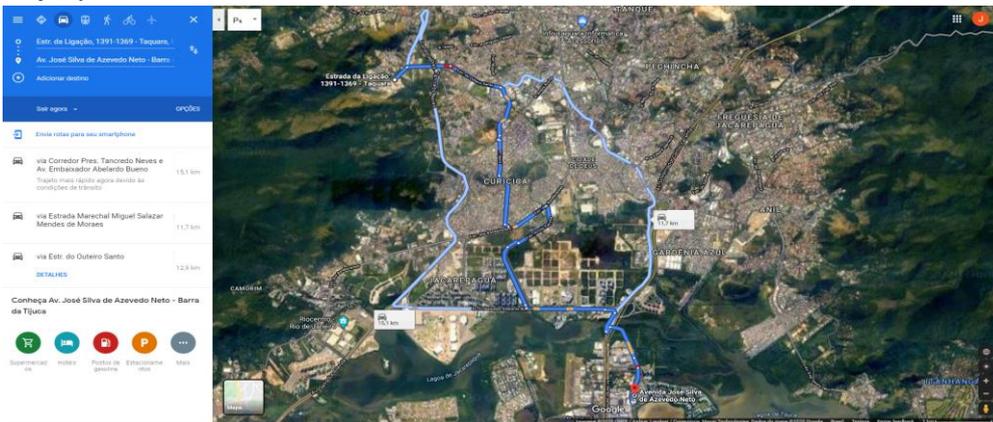

Trajeto para Faixa 1 - Volta

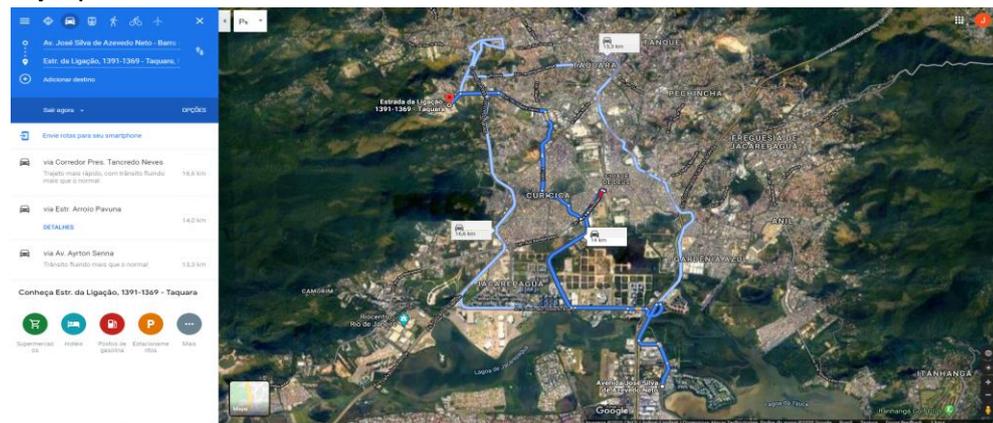

Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**


Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**


DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA

Av. José Da Silva Azevedo Neto					Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)					
Ida	Volta	Ida	Volta				
12,90	14,00	12,60	15,10	13,65	0,30	13,95	

Trajeto para Faixa 2 - Ida

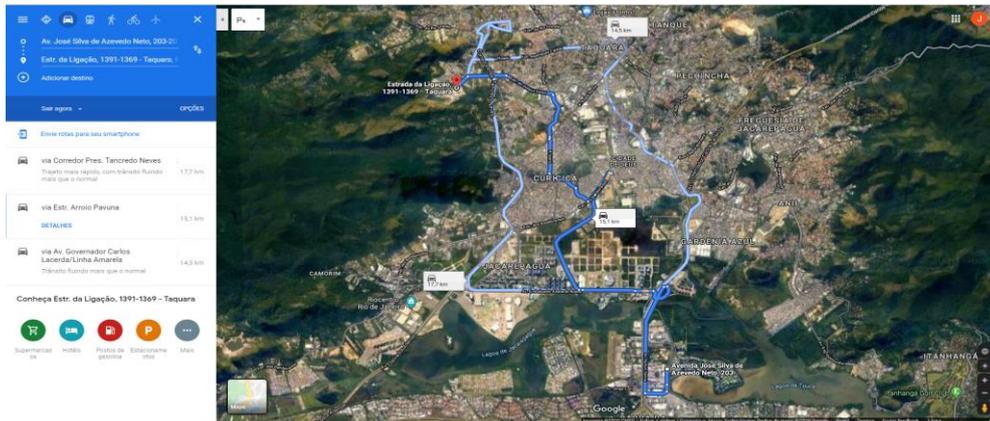

Trajeto para Faixa 2 - Volta

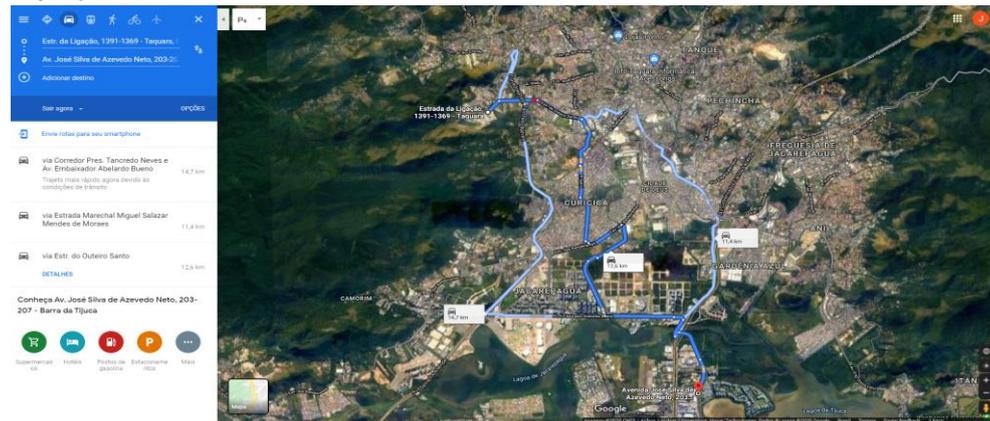

Obra/Serviço: **SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO**

Código: **6.150**

Processo: **0006/300.120/2020** Contrato: **024/2020**

Empresa: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA FRESAGEM

Av. José Da Silva Azevedo Neto					Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)					
Ida	Volta	Ida	Volta				
14,40	13,20	15,30	13,00	13,98	-	13,98	

Trajetos para Faixa 1 - Ida



Trajetos para Faixa 1 - Volta



Obra/Serviço: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PAVIMENTOS NOS LOGRADOUROS RELACIONADOS NA ÁREA DA AP4 - PROGRAMA PAVIMENTARIO

Código: 6.150


Processo: 0006/300.120/2020 Contrato: 024/2020

Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.


DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DA FRESAGEM

Av. José Da Silva Azevedo Neto						
Distância - Faixa 1 (Km)		Distância - Faixa 2 (Km)		Distância Média (Km)	Distância Interna no Canteiro (Km)	Distância Total (Km)
Ida	Volta	Ida	Volta			
14,40	13,20	15,30	13,00	13,98	-	13,98

Trajeto para Faixa 2 - Ida

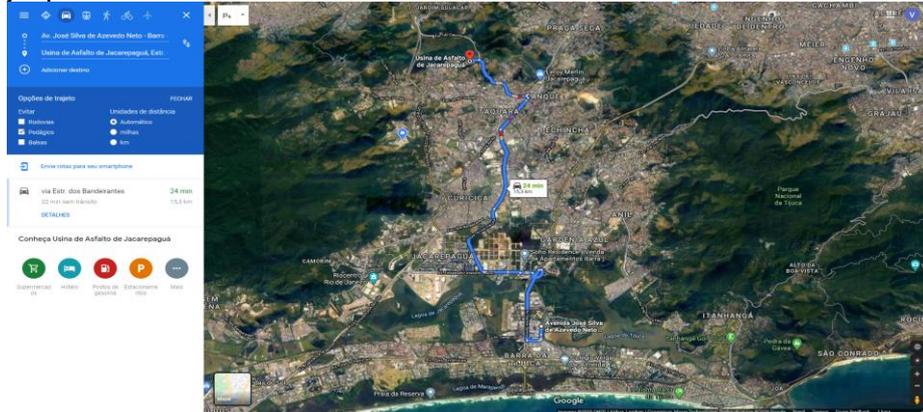

Trajeto para Faixa 2 - Volta

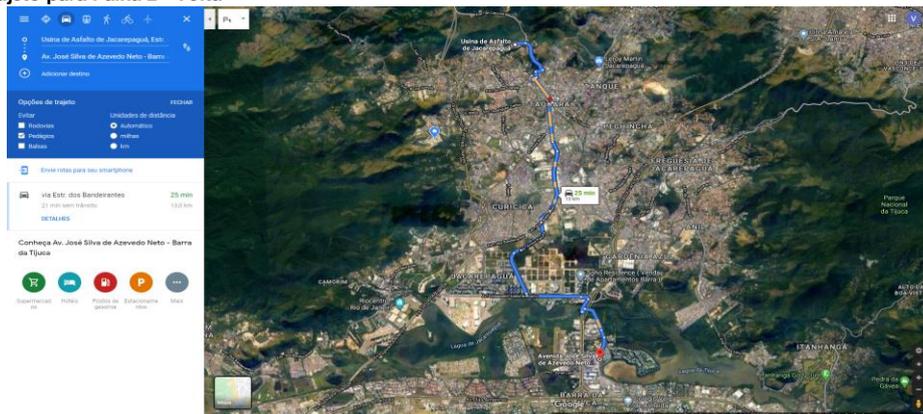



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICA OPERACIONAL
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO
GERÊNCIA DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO



AP-04- RP-4.1 - JACAREPAGUA
BAIRROS - TAQUARA
0

PLANILHA DEMONSTRATIVA RESUMIDA DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO

03-ESTRADA DO RIO GRANDE		ROTATÓRIA C/ A ESTRADA PAU DA FOME					RUA APIACÁS				
Área do pavimento acabado	Início (km)	Final (km)	Extensão (m)	Largura (m)	Numero de faixas	Área (m²)	Numero " N "	SOLUÇÃO INDICADA	Dadm	Dc	Reforço Calculado
SH-03-01	ROTATÓRIA C/ A ESTRADA PAU DA FOME					AVENIDA JULIO DOS SANTOS MELO					
	0,00	0,41	407,25	9,00	2,00	3.665,25	3,31E+07	FS(4)+H(11,0)	48,58	77,99	9,69
SH-03-02	AVENIDA JULIO DOS SANTOS MELO					RUA PARTICULAR I (IGREJA)					
	0,41	1,25	840,88	9,92	2,00	8.344,50	3,31E+07	FS(4)+H(11,0)	48,58	85,35	10,66
SH-03-03	RUA PARTICULAR I (IGREJA)					RETORNO I					
	1,25	1,71	459,55	10,00	2,00	4.595,50	3,31E+07	FS(4)+H(9,0)	48,58	76,31	8,28
SH-03-04	RETORNO I					RUA ATALI AGUIAR					
	1,71	2,54	828,21	9,55	2,00	7.907,16	2,00E+07	FS(4)+H(9,0)	53,09	67,76	5,59
SH-03-05	RUA ATALI AGUIAR					RUA PEDRO DE LARA					
	2,54	2,68	140,76	9,00	2,00	1.266,84	7,77E+06	FS(4)+H(9,0)	62,71	76,19	3,23
SH-03-06	RUA PEDRO DE LARA					ESTRADA DA SOCA					
	2,68	3,31	632,05	9,00	2,00	5.688,45	7,77E+06	FS(4)+H(9,0)	62,71	72,44	3,83
SH-03-07	ESTRADA DA SOCA					RUA ALBERTO SOARES SAMPAIO					
	3,31	3,75	437,05	9,00	2,00	3.933,45	7,77E+06	FS(4)+H(9,0)	62,71	70,73	3,20
SH-03-08	RUA ALBERTO SOARES SAMPAIO					RUA APIACÁS					
	3,75	4,65	906,00	10,00	2,00	9.060,00	4,02E+06	FS(4)+H(5,0)	70,42	76,69	1,83
Interseções e ramos 15%						6.669,17		FS(4)+H(5,0)			
			4.651,75							m²	51.130,32



PLANILHA DEMONSTRATIVA RESUMIDA DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO

03-ESTRADA DO RIO GRANDE			ROTATÓRIA C/ A ESTRADA PAU DA FOME				RUA APIACÁS								
DISCRIMINAÇÃO	INICIO	FIM			ESPESSURA (cm)	ÁREA (m ²)	APLICAÇÃO (%)	VOLUME (m ³)	DENSIDADE TAXAS		CBUQ (t)	DMT (km)	MT (txkm)	UNIDADE	QUANTIDADE
Espeçura de fresagem			SH-03-01		4,000	3.665,25	100,00	146,61	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-01		11,000	3.665,25	100,00	403,18	2,40	t/m ³	967,63				
Espeçura de fresagem			SH-03-02		4,000	8.344,50	100,00	333,78	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-02		11,000	8.344,50	100,00	917,90	2,40	t/m ³	2.202,95				
Espeçura de fresagem			SH-03-03		4,000	4.595,50	100,00	183,82	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-03		9,000	4.595,50	100,00	413,60	2,40	t/m ³	992,63				
Espeçura de fresagem			SH-03-04		4,000	7.907,16	100,00	316,29	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-04		9,000	7.907,16	100,00	711,64	2,40	t/m ³	1.707,95				
Espeçura de fresagem			SH-03-05		4,000	1.266,84	100,00	50,67	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-05		9,000	1.266,84	100,00	114,02	2,40	t/m ³	273,64				
Espeçura de fresagem			SH-03-06		4,000	5.688,45	100,00	227,54	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-06		9,000	5.688,45	100,00	511,96	2,40	t/m ³	1.228,71				
Espeçura de fresagem			SH-03-07		4,000	3.933,45	100,00	157,34	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-07		9,000	3.933,45	100,00	354,01	2,40	t/m ³	849,63				
Espeçura de fresagem			SH-03-08		4,000	9.060,00	100,00	362,40	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			SH-03-08		5,000	9.060,00	100,00	453,00	2,40	t/m ³	1.087,20				
Espeçura de fresagem			Interseções e ramos 15%		4,000	3.334,59	50,00	133,38	2,40	t/m ³					
Espeçura do reforço			Interseções e ramos 15%		5,000	6.669,17	100,00	333,46	2,40	t/m ³	800,30				
RESUMO DAS QUANTIDADES															
FRESAGEM								1.911,83							
RECOMPOSIÇÃO CBUQ											0,00				
REFORÇO CBUQ											10.110,62				
Prazos Previsto						Produção Média Diária	FRESAGEM	100	m ³	1.911,83	19,1	dias úteis			
							CBUQ	180	t	10.110,62	56,2	dias úteis			

LEGENDA DAS SOLUÇÕES

FR(X) - FRESAGEM PARCIAL E REPOSIÇÃO DE CBUQ - ESPESSURA DE X,0 CM
FS(X) - FRESAGEM SIMPLES AREA TOTAL - ESPESSURA DE X,0 CM
H(X) - REFORÇO EM CBUQ ESPESSURA DE X,00 CM

Dadm Deflexão Admissivel
Dc Deflexão característica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
 SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICA OPERACIONAL
 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO
 GERÊNCIA DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO



AP-04- RP-4.2 - BARRA DA TIJUCA
 BAIRROS - BARRA DA TIJUCA

PLANILHA DEMONSTRATIVA RESUMIDA DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO

17- AVENIDA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO NETO - PISTA DA DIREITA - SENTIDO BARRA SHOPPING			AVENIDA JUAN MANUEL FANGIO					AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES				
Área do pavimento acabado	Início (km)	Final (km)	Extensão (m)	Largura (m)	Numero de faixas	Área (m²)	Numero " N "	SOLUÇÃO INDICADA	Dadm	Dc	Reforço Callculado	
SH-17-01 -PD	AVENIDA JUAN MANUEL FANGIO		AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES									
	0,00	1,12	1.121,75	7,79	2,00	8.741,10	7,79E+06	FS(4)+H(6,0)	62,67	68,93	2,61	
ACESSO A RUA LUIZ CARLOS PRESTES			AV. JOSÉ DA SILVA DE AZEVEDO NETO					AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES				
SH-17-02 -ACS	AV. JOSÉ DA SILVA DE AZEVEDO NETO		AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES									
	0,00	0,27	270,30	9,58	2,00	2.589,90	7,79E+06	FS(4)+H(6,0)	62,67	68,93	3,67	
17- AVENIDA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO NETO - PISTA DA ESQUERDA - SENTIDO JACAREPAGUA			AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES					AV. JUAN MANUEL FANGIO				
Área do pavimento acabado	Início (km)	Final (km)	Extensão (m)	Largura (m)	Numero de faixas	Área (m²)	Numero " N "	SOLUÇÃO INDICADA	Dadm	Dc	Reforço Callculado	
SH-17-03-PE	AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES		AV. JUAN MANUEL FANGIO									
	0,00	1,17	1.165,36	9,63	2,00	11.218,75	1,08E+07	FS(4)+H(6,0)	59,15	26,94	-12,21	
Interseções, retornos e ramos 20%						2.266,20		FS(4)H(6,0)				
			2.557,41							m²	24.815,95	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E CONSERVAÇÃO.
SUBSECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E TÉCNICA OPERACIONAL
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DE PAVIMENTAÇÃO
GERÊNCIA DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO



AP-04- RP-4.2 - BARRA DA TIJUCA
BAIRROS - BARRA DA TIJUCA

PLANILHA DEMONSTRATIVA RESUMIDA DE QUANTIDADES DE PAVIMENTAÇÃO

17- AVENIDA JOSÉ DA SILVA AZEVEDO NETO - PISTA DA DIREITA - SENTIDO BARRA SHOPPING			AVENIDA JUAN MANUEL FANGIO					AVENIDA LUIZ CARLOS PRESTES						
DISCRIMINAÇÃO	INICIO	FIM			ESPESSURA (cm)	ÁREA (m ²)	APLICAÇÃO (%)	VOLUME (m ³)	DENSIDADE TAXAS		DMT (km)	MT (txkm)	UNIDADE	QUANTIDADE
EspeSSura de fresagem		SH-17-01 -PD			4,000	8.741,10	100,00	349,64	2,35	t/m ³				
EspeSSura do reforço		SH-17-01 -PD			6,000	8.741,10	100,00	524,47	2,35	t/m ³	1.232,50			
EspeSSura de fresagem		SH-17-02 -ACS			4,000	2.589,90	100,00	103,60	2,35	t/m ³				
EspeSSura do reforço		SH-17-02 -ACS			6,000	2.589,90	100,00	155,39	2,35	t/m ³	365,18			
EspeSSura de fresagem		SH-17-02 -ACS			4,000	11.218,75	100,00	448,75	2,35	t/m ³				
EspeSSura do reforço		SH-17-02 -ACS			6,000	11.218,75	100,00	673,13	2,35	t/m ³	1.581,84			
EspeSSura de fresagem		Interseções, retornos e ramos 20%			4,000	1.133,10	50,00	45,32	2,35	t/m ³				
EspeSSura do reforço		Interseções, retornos e ramos 20%			6,000	2.266,20	100,00	135,97	2,35	t/m ³	319,53			
RESUMO DAS QUANTIDADES														
FRESAGEM								947,31						
RECOMPOSIÇÃO CBUQ											0,00			
REFORÇO CBUQ											3.499,05			
Prazos Previsto						Produção Média Diária	FRESAGEM	100	m ³	947,31	9,5	dias úteis		
							CBUQ	180	t	3.499,05	19,4	dias úteis		

LEGENDA DAS SOLUÇÕES

FR(X) - FRESAGEM PARCIAL E REPOSIÇÃO DE CBUQ - ESPESSURA DE X,0 CM

FS(X) - FRESAGEM SIMPLES AREA TOTAL - ESPESSURA DE X,0 CM

H(X) - REFORÇO EM CBUQ ESPESSURA DE X,00 CM

Dadm Deflexão Admissível

Dc Deflexão característica



ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO: 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO:** 1ª

CONTRATO: 24/2020 **ETAPA:** 1ª - Interm.

N.º BOLETIM: 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Resolução nº 169 de 20/03/1980

LOGRADOURO	ITEM	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	CÓDIGO	MT04050050	MT14050300	TC04050700	TC09050150	TC09050700	SC04050850	SC04100050	SC04100300	SC09050900	SC09051100
	UNIDADE	m3	m3	t.Km	t	t	m3	un	m3	h	h
01 Estrada do Rio Grande		-	-	12.019,4448	94,0200	470,1250	-	-	-	277,5000	555,0000
99 Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	12.019,4448	94,0200	470,1250	-	-	-	277,5000	555,0000



ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO : 06/300.120/2020 MEDIÇÃO : 1ª

CONTRATO : 24/2020 ETAPA : 1ª - Interm.

N.º BOLETIM : 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Reso

LOGRADOURO	ITEM	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	CÓDIGO	SC09051200	SC09051450	SC09100100	SC09100150	SC14050400	SC14050425	SC14100050	SC34050040	SC34050050	DR34050250
	UNIDADE	h	h	h	h	m3	m3	m2	un	un	un
01 Estrada do Rio Grande		-	2.775,0000	-	277,5000	135,3960	135,3960	84,0000	-	-	-
99 Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	2.775,0000	-	277,5000	135,3960	135,3960	84,0000	-	-	-



ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO : 06/300.120/2020 MEDIÇÃO : 1ª

CONTRATO : 24/2020 ETAPA : 1ª - Interm.

N.º BOLETIM : 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Reso

LOGRADOURO	ITEM	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	CÓDIGO	BP09050050	BP09050100	BP09050300	BP09050400	BP09050600	BP09050700	BP14050060	BP19300050	ET04050400	ET04200050
	UNIDADE	t	t	t	m2	m2	m2	m3	m	m3	m3
AP4 01 Estrada do Rio Grande		1.517,3200	-	1.517,3200	10.886,5800	-	-	727,1434	-	-	-
99 Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.517,3200	-	1.517,3200	10.886,5800	-	-	727,1434	-	-	-



ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
 Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
 Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
 Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO : 06/300.120/2020 **MEDIÇÃO :** 1ª

CONTRATO : 24/2020 **ETAPA :** 1ª - Interm.

N.º BOLETIM : 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Reso

LOGRADOURO		ITEM	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		CÓDIGO	ET04200200	ET04250403	EQ04050062	EQ04050312	EQ14050380	EQ14050386	EQ44050059	EQ44050100	EQ44050106	EQ44050600
		UNIDADE	m3	m3	un.mes	un.mes	h	h	h.dam	h	h	h
AP4	01 Estrada do Rio Grande		-	-	1,5000	1,5000	388,5000	166,5000	555,0000	388,5000	166,5000	194,2500
	99 Geral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	1,5000	1,5000	388,5000	166,5000	555,0000	388,5000	166,5000	194,2500



ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO : 06/300.120/2020 MEDIÇÃO : 1ª

CONTRATO : 24/2020 ETAPA : 1ª - Interm.

N.º BOLETIM : 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Reso

LOGRADOURO		ITEM	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		CÓDIGO	EQ44050606	ST74050300	ST74050450	AD14100050	AD14100300	AD14150401	AD14150750	AD19250210	AD19250310	AD24050200
		UNIDADE	h	m2	m2	t	t.Km	un.mes	un.mes	un	m2	un.mes
AP4	01 Estrada do Rio Grande		83,2500	1,2990	-	54,0470	167,5457	4,5000	-	-	-	-
	99 Geral		-	-	-	108,0940	5.199,3214	-	-	35,0000	8,4000	67,5000
TOTAL			83,2500	1,2990	-	162,1410	5.366,8671	4,5000	-	35,0000	8,4000	67,5000



ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E C
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos
Logradouros Relacionados na Área da AP4 -

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior 11/241.313-6
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0

PROCESSO : 06/300.120/2020 MEDIÇÃO : 1ª

CONTRATO : 24/2020 ETAPA : 1ª - Interm.

N.º BOLETIM : 1

Apresentação dos Elementos Determinados pela Reso

LOGRADOURO	ITEM	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	CÓDIGO	AD24050250	AD24050300	AD24050450	AD39050086	AD39050116	AD39050134	IE00027107	IE00027108	IE00027109	IE00027110
	UNIDADE	un.mes	un.mes	m	h	h	h	t	t	t	t
01 Estrada do Rio Grande		-	-	-	-	277,5000	-	-	-	-	-
99 Geral		52,5000	-	-	555,0000	555,0000	555,0000	-	-	-	-
TOTAL		52,5000	-	-	555,0000	832,5000	555,0000	-	-	-	-

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -
Programa PAVIMENTARIO

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO



Estrada do Rio Grande
Recapeamento com CBUQ



Estrada do Rio Grande
Espalhamento de CBUQ com vibro acabadora



Estrada do Rio Grande
Acabamento com rastilheiro



Estrada do Rio Grande
Compactação com rolo de pneus

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -
Programa PAVIMENTARIO
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO



Estrada do Rio Grande
Corte mecânico com fresadora



Estrada do Rio Grande
Pintura de Ligação



Estrada do Rio Grande
Operação de tráfego



Estrada do Rio Grande
Pré-marcação da sinalização horizontal

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020
OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -
Programa PAVIMENTARIO
FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO



Estrada do Rio Grande
Corte mecânico com fresadora



Estrada do Rio Grande
Limpeza com equipe de apoio



Estrada do Rio Grande
Limpeza com minicarregadeira



Estrada do Rio Grande
Substituição de Base _ Remendo profundo

ORGÃO: COORDENADORIA GERAL DE ENGENHARIA E CONSERVAÇÃO **N.º DO PROCESSO :** 06/300.120/2020
EMPRESA: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA **N.º DO CONTRATO :** 24/2020

OBRA: Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 -
Programa PAVIMENTARIO

FISCAIS: João Adolpho da Silva Júnior **MATRÍCULA:** 11/241.313-6 **MEDIÇÃO :** 1ª
Maurício Gonçalves de A. Graça 11/119.129-5 **ETAPA :** 1ª - Interm.
Susana Viana Bittencourt 11/268.112-0 **N.º BOLETIM :** 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE MEDIÇÃO



Estrada do Rio Grande
Abertura de juntas _ Remendo profundo



Estrada do Rio Grande
Compactação com rolo de chapa _ Remendo profundo



Estrada do Rio Grande
Chapa de Aço



Estrada do Rio Grande
Banheiro químico



Sr. Coordenador Geral da IH/SUBCONSERV/CGEC,

A Comissão de fiscalização do contrato nº 024/2020, objeto do processo 06/300.120/2020 – “**Serviços de Recuperação dos Pavimentos nos Logradouros Relacionados na Área da AP4 – Programa PAVIMENTARIO**”, referente à 01ª medição, 01ª etapa (intermediária), no período de 28/04/2020 a 13/05/2020, informa que o valor desta medição foi utilizado integralmente na área da AP4.

- **AP4** – R\$ 1.015.972,01 (Um milhão, quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo).

Valor total dos serviços nesta etapa: R\$ 1.015.972,01 (Um milhão, quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e um centavo).

Rio de Janeiro, de de 2020

JOÃO ADOLPHO DA SILVA JUNIOR
Mat. 11/241.313-6

MAURÍCIO G. DE ALENCASTRO GRAÇA
Mat. 11/119.129-5

SUSANA VIANA BITTENCOURT
Mat. 11/268.112-0



DECLARAÇÃO

Declaramos a adequada aplicação das ferramentas, equipamentos próprios e materiais de construção, nos termos do art. 2º, do Decreto Rio nº 43.189/2017, na presente medição (01ª etapa intermediária, 01ª medição), do contrato 024/2020, processo instrutivo 06/300.120/2020 da empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

Rio de Janeiro, de de 2020

JOÃO ADOLPHO DA SILVA JUNIOR

Mat. 11/241.313-6

MAURÍCIO G. DE ALENCASTRO GRAÇA

Mat. 11/119.129-5

SUSANA VIANA BITTENCOURT

Mat. 11/268.112-0

PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
1	MT 04.05.0050 (f)	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PIÇARRA), ATÉ 1,50M, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.(DESONERADO)	M3	28,77	-	-	-	-	-	-
2	MT 14.05.0300 (f)	REATERRO DE VALA, COM PÓ-DE-PEDRA, COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	106,89	-	-	-	-	-	-
3	TC 04.05.0700 (f)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM MÉDIA VELOCIDADE (VM=40KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,49	-	-	12.019,44	5.889,52	12.019,44	5.889,52
4	TC 09.05.0150 (f)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL À GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	19,28	-	-	94,02	1.812,70	94,02	1.812,70
5	TC 09.05.0700 (f)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.(DESONERADO)	T	15,96	723,22	11.542,52	470,13	7.503,19	(253,09)	(4.039,33)
6	SC 04.05.0850 (f)	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DO SERVIÇO.(DESONERADO)	M3	198,35	-	-	-	-	-	-
7	SC 04.10.0050 (f)	ARRANCAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (TAMPA E COLAR).(DESONERADO)	UN	46,37	-	-	-	-	-	-
8	SC 04.10.0300 (f)	DEMOLIÇÃO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DE CANTEIRO DE SERVIÇOS.(DESONERADO)	M3	215,50	-	-	-	-	-	-
9	SC 09.05.0900 (f)	MARTELETEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,86	370,00	7.348,20	277,50	5.511,15	(92,50)	(1.837,05)
10	SC 09.05.1100 (f)	OPERADOR DE MÁQUINAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,32	370,00	8.258,40	555,00	12.387,60	185,00	4.129,20
11	SC 09.05.1200 (f)	PEDREIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	21,38	-	-	-	-	-	-
12	SC 09.05.1450 (f)	SERVENTE (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,38	2.775,00	39.904,50	2.775,00	39.904,50	-	-
13	SC 09.10.0100 (f)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL JUNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,69	-	-	-	-	-	-
14	SC 09.10.0150 (f)	OPERADOR DE TRÁFEGO, NÍVEL SÊNIOR, COM TODO O SEU EPI, COLETE, CAPA, BONÉ, APITO, (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,87	185,00	3.305,95	277,50	4.958,92	92,50	1.652,97
15	SC 14.05.0400 (f)	PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	59,90	200,18	11.990,66	135,40	8.110,22	(64,78)	(3.880,44)
16	SC 14.05.0425 (f)	BRITA Nº 0, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 20KM. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	104,50	200,18	20.918,60	135,40	14.148,88	(64,78)	(6.769,72)
17	SC 14.10.0050 (A)	CHAPA DE AÇO DE 3/4", PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS SOBRE VALAS, COMPREENDENDO COLOCAÇÃO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA ÁREA DA CHAPA EM CADA APLICAÇÃO, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA E O TRAVAMENTO COM GRAMPOS.(DESONERADO)	M2	755,29	84,00	63.444,36	84,00	63.444,36	-	-
18	SC 34.05.0040 (A)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE GRELHA DE CAIXA DE RALO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	160,84	-	-	-	-	-	-
19	SC 34.05.0050 (B)	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO SOBRE FAIXA DE ROLAMENTO, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL E BOTA FORA DO MATERIAL EXCEDENTE.(DESONERADO)	UN	220,04	-	-	-	-	-	-
20	DR 34.05.0250 (f)	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO COMPLETO, ARTICULADO, PESADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, TIPO AVENIDA, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(DESONERADO)	UN	416,22	-	-	-	-	-	-
21	BP 09.05.0050 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA INTERMEDIÁRIA (BINDER), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	279,99	1.559,62	436.677,81	1.517,32	424.834,42	(42,30)	(11.843,39)
22	BP 09.05.0100 (A)	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ; EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA.(DESONERADO)	T	374,18	563,42	210.819,62	-	-	(563,42)	(210.819,62)
23	BP 09.05.0300 (f)	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA CONVENCIONAL E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PCRJ, EXCLUSIVE OS MATERIAIS.(DESONERADO)	T	3,46	1.992,37	6.893,58	1.517,32	5.249,92	(475,05)	(1.643,66)
24	BP 09.05.0400 (B)	PINTURA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE LIMPEZA DO TRECHO A SER TRABALHADO.(DESONERADO)	M2	2,31	15.242,35	35.209,82	10.886,58	25.147,99	(4.355,77)	(10.061,83)
25	BP 09.05.0600 (A)	MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO, COM EMPREGO DE EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMEROS, ADITIVO DE CONTROLE DE ROMPIMENTO, ABERTURA AO TRÁFEGO NO MÁXIMO EM 2H, CONSUMO POR M2 ENTRE 10KG A 12KG, EM UMA ÚNICA CAMADA, COM EMPREGO DA FAIXA III OU IV DA ISSA. O PREÇO INCLUI TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, EXECUÇÃO E TRANSPORTE. O MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO A FRIO DEVERÁ ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA ISSA OU DO DNER.(DESONERADO)	M2	9,65	-	-	-	-	-	-
26	BP 09.05.0700 (A)	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM POLÍMERO, USINADO A QUENTE, COM 5CM DE ESPESSURA, EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRÔNICO E MESA EXTENSIVA DE NO MÍNIMO 7M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.(DESONERADO)	M2	53,64	-	-	-	-	-	-
27	BP 14.05.0060 (A)	CORTE MECÂNICO COM FRESADORA À FRIO, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ZONA URBANA COM INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL.(DESONERADO)	M3	137,11	684,09	93.796,12	727,14	99.698,63	43,05	5.902,51
28	BP 19.30.0050 (f)	LEVANTAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO.(DESONERADO)	M	48,28	-	-	-	-	-	-
29	ET 04.05.0400 (B)	MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA À COMPRESSÃO (FCK) MÍNIMO DE 20MPA, INCLUSIVE PERDAS. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M3	239,04	-	-	-	-	-	-
30	ET 04.20.0050 (A)	PREPARO MANUAL DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO, EXCLUSIVE MATERIAIS.(DESONERADO)	M3	102,83	-	-	-	-	-	-
31	ET 04.20.0200 (f)	PREPARO MECÂNICO DE CONCRETO, COMPREENDENDO A MISTURA E O AMASSAMENTO EM BETONEIRA, EXCLUSIVE MATERIAIS, CONSIDERANDO PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	52,55	-	-	-	-	-	-
32	ET 04.25.0403 (A)	LANÇAMENTO DE CONCRETO EM PEÇAS SEM ARMADURA, INCLUSIVE A COLOCAÇÃO, O ADENSAMENTO E O ACABAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE (TC 05.10.0050), CONSIDERANDO A PRODUÇÃO NORMAL.(DESONERADO)	M3	41,69	-	-	-	-	-	-
33	EQ 04.05.0062 (C)	CAMINHÃO BASCULANTE, CAPACIDADE DE 5M3, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 208CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.744,69	2,00	17.489,38	1,50	13.117,03	(0,50)	(4.372,35)
34	EQ 04.05.0312 (B)	CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO, MATERIAL DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 85CV. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	8.784,89	2,00	17.569,78	1,50	13.177,33	(0,50)	(4.392,45)
35	EQ 14.05.0380 (f)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	84,64	259,00	21.921,76	388,50	32.882,64	129,50	10.960,88
36	EQ 14.05.0386 (f)	MINICARREGADEIRA, COM OPERADOR E AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 50CV, PESO DE OPERAÇÃO DE 2,5T, CAPACIDADE DE OPERAÇÃO DE 680KG, FORÇA DE DESAGREGAÇÃO DE 1.400KGF, ALTURA DE DESCARGA DE 2,3M. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	32,87	111,00	3.648,57	166,50	5.472,85	55,50	1.824,28
37	EQ 44.05.0059 (f)	MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE AR, DUAS LONAS, DIÂMETRO DE 3/4". CUSTO HORÁRIO CORRIDO POR DECÂMETRO.(DESONERADO)	H.DAM	0,09	370,00	33,30	555,00	49,95	185,00	16,65

PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
38	EQ 44.05.0100 (B)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	64,07	259,00	16.594,13	388,50	24.891,19	129,50	8.297,06
39	EQ 44.05.0106 (I)	COMPRESSOR DE AR, PORTÁTIL E REBOCÁVEL, SEM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 40CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 102PSI, DESCARGA LIVRE DE 170PCM. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	5,65	111,00	627,15	166,50	940,72	55,50	313,57
40	EQ 44.05.0600 (A)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	1,79	129,50	231,80	194,25	347,70	64,75	115,90
41	EQ 44.05.0606 (I)	ROMPEDOR PNEUMÁTICO, PESO DE 32,6KG, EXCLUSIVE O OPERADOR, PONTEIRO E MANGUEIRA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE AR DE 38,8L/S, FREQUÊNCIA DE IMPACTOS 1110 IMPACTOS/MIN. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	1,19	55,50	66,04	83,25	99,06	27,75	33,02
42	ST 74.05.0300 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR ASPERSÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CET-RIO, EM PROJETOS ACIMA DE 400M2.(DESONERADO)	M2	34,42	1,30	44,81	1,30	44,71	(0,00)	(0,10)
43	ST 74.05.0450 (A)	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MASSA TERMOPLÁSTICA, APLICADA POR EXTRUSÃO, EM PROJETOS ACIMA DE 150M2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CET-RIO.(DESONERADO)	M2	63,77	-	-	-	-	-	-
44	AD 14.10.0050 (I)	CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE O CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO, DURANTE A OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	38,86	216,19	8.401,06	162,14	6.300,79	(54,05)	(2.100,27)
45	AD 14.10.0300 (I)	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS, EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA E O CUSTO HORÁRIO DOS EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS.(DESONERADO)	T.KM	1,62	6.120,82	9.915,73	5.366,87	8.694,32	(753,96)	(1.221,41)
46	AD 14.15.0401 (B)	CAMINHONETA DE SERVIÇO, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS OU 600 KG, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: A GASOLINA DE 83CV, AUTONOMIA DE 3000 KMMÉS. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÉS	5.396,73	3,00	16.190,19	4,50	24.285,28	1,50	8.095,09
47	AD 14.15.0750 (B)	VEÍCULO DE SERVIÇO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, RÁDIO, INCLUSIVE COMBUSTÍVEL, SEGURO, LUBRIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM MOTORISTA. CUSTO MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÉS	4.248,99	-	-	-	-	-	-
48	AD 19.25.0210 (I)	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, TIPO CAVALETE ARTICULADO, CONFECCIONADO EM CHAPA PET 2,4MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO, ESTRUTURA EM AÇO TRATADO A BASE DE WASH PRIMER, PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO, NAS DIMENSÕES DE 0,60M X 1,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	UN	612,93	70,00	42.905,10	35,00	21.452,55	(35,00)	(21.452,55)
49	AD 19.25.0310 (I)	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE PET 2,0MM, FUNDO, TEXTOS E SÍMBOLOS EM VINIL AUTO ADESIVO E ESTRUTURA DE REQUADRO, SUPORTE ESTRUTURADO EM PEÇA DE MADEIRA SERRADA DE (7,5 X 7,5)CM PINTADO, INCLUSIVE TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	415,07	16,80	6.973,17	8,40	3.486,58	(8,40)	(3.486,59)
50	AD 24.05.0200 (I)	ALUGUEL DE CAVALETE PLÁSTICO UNIVERSAL DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM PAINÉIS DE FITA REFLETIVA NA DIMENSÕES (1,15X0,61)M, PERMITINDO ADAPTAÇÃO DE ATÉ 2 PISCAS ALERTAS E PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO 1 PISCA ALERTA, PRIMEIRA COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA.(DESONERADO)	UN.MÉS	55,33	45,00	2.489,85	67,50	3.734,77	22,50	1.244,92
51	AD 24.05.0250 (I)	ALUGUEL DE CONE CANALIZADOR EMPILHÁVEL T-TOPPE DE ALTA DENSIDADE DE POLIETILENO INQUEBRÁVEL, COM 1,06M DE ALTURA E 0,33M DE FAIXA REFLETIVA COM BASE DE BORRACHA REMOVÍVEL, PERMITINDO PRESTAÇÃO DE PISCA ALERTA, DE ACORDO COM O MANUAL DO DNSR E CET-RIO, COM MAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO E RETIRADA NO FINAL DA OBRA, EXCLUINDO O PISCA ALERTA.(DESONERADO)	UN.MÉS	51,07	35,00	1.787,45	52,50	2.681,17	17,50	893,72
52	AD 24.05.0300 (A)	ALUGUEL DE PISCA ALERTA PARA ADAPTAÇÃO EM CONES CANALIZADORES E CAVALETES.(DESONERADO)	UN.MÉS	38,99	-	-	-	-	-	-
53	AD 24.05.0450 (A)	ROLO DE TELA PLÁSTICA, NAS DIMENSÕES DE (50X1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO.(DESONERADO)	M	0,73	-	-	-	-	-	-
54	AD 39.05.0086 (I)	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	17,53	462,50	8.107,62	555,00	9.729,15	92,50	1.621,53
55	AD 39.05.0116 (I)	ENCARREGADO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	27,49	462,50	12.714,12	832,50	22.885,42	370,00	10.171,30
56	AD 39.05.0134 (I)	ENGENHEIRO, ARQUITETO OU GEÓLOGO SÊNIOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	185,76	277,50	51.548,40	555,00	103.096,80	277,50	51.548,40
57	IE 00.02.7107 (I)	MISTURA BETUMINOSA TIPO "GAP GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,60, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	59,61	-	-	-	-	-	-
58	IE 00.02.7108 (I)	MISTURA BETUMINOSA TIPO "OPEN GRADED", UTILIZANDO LIGANTE DE ASFALTO-BORRACHA E BRITA 1, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, COM RESULTADO DE "GRIP TEST" (ASTM) MAIOR QUE 0,75 E RUÍDO MENOR QUE 97 dB, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO LIGANTE, USINAGEM E TRANSPORTE DA MASSA (DESONERADO)	T	59,27	-	-	-	-	-	-
59	IE 00.02.7109 (I)	MISTURA BETUMINOSA UTILIZANDO BMB, TIPO "OPEN GRADE" OU "GAP GRADED", CONSIDERANDO APENAS USINAGEM. (DESONERADO)	T	72,15	-	-	-	-	-	-
60	IE 00.02.7110 (I)	PRODUÇÃO DE LIGANTE MODIFICADO DE ASFALTO-BORRACHA (BMB) "IN SITU" TIPO "FIELD BLEND", COM UTILIZAÇÃO DE BORRACHA RECICLADA COM POLÍMERO, NA PROPORÇÃO DE 20%, DE PÓ DE BORRACHA EM PESO, EM CONFORMIDADE COM ASTM 6114, ASTM D8 E COM A RESOLUÇÃO 19/2005 DE 11/7/2005 DA ANP (DESONERADO)	T	3.273,93	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL POSSIVEL MEDIR						1.189.369,55		1.015.972,01		(173.397,54)

ITENS A SEREM PROPOSTOS EM RERRA (SUJEITOS A APROVAÇÃO)

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
61	MT 09.05.0050 (I)	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRÁ), UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA.(DESONERADO)	M3	6,55	333,63	2.185,49	225,66	1.478,21	(107,97)	(707,28)
62	MT 14.05.0100 (I)	COMPACTAÇÃO DE ATERRO EM CAMADAS DE 15CM, COM MACC.(DESONERADO)	M3	40,26	333,63	13.432,25	225,66	9.085,28	(107,97)	(4.346,97)
63	TC 09.05.0350 (I)	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, CONSIDERADAS PARA O CAMINHÃO A ESPERA, MANOBRÁ, CARGA E DESCARGA E QUANTO À CARREGADEIRA, ESPERA E OPERAÇÃO.(DESONERADO)	T	1,20	1.215,69	1.460,84	782,29	940,04	(433,40)	(520,80)
64	SC 09.05.1350 (I)	RASTILHEIRO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	19,83	555,00	11.007,15	832,50	16.510,72	277,50	5.503,57
65	SC 14.05.0050 (I)	ÁGUA COMERCIAL. FORNECIMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE.(DESONERADO)	M3	13,44	200,00	2.688,31	300,00	4.032,47	100,00	1.344,16

PLANILHA DE COMPARAÇÃO ENTRE A MEDIÇÃO ENCAMINHADA PELA FISCALIZAÇÃO E PELA DIMENSIONAL ENGENHARIA

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	R\$ UNIT C/ BDI	DIMENSIONAL		FISCALIZAÇÃO		DIFERENÇAS	
					QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)
66	BP 09.05.0550 (I)	REFORÇO OU TRATAMENTO PARA TRINCAMENTOS, COM REVESTIMENTO BETUMINOSO, FEITO COM MANTA DE GEOTEXTELA FLEXÍVEL DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE OU DE FIBRA DE VIDRO REVESTIDA COM POLÍMERO A ELEVADA TEMPERATURA (MÍNIMO DE 180 °C), COMBINADO COM MANTA NÃO TECIDA ULTRA LEVE, EM FORMA DE GRELHA, COM ABERTURA DE MALHA DE (40X40)MM, MALHA FIXA SEM MOVIMENTAÇÃO RESISTÊNCIA DE 50KN/M, TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, ESPECIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA DER-SP - ET-DE-P00/43, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=50KN/M PARA DEFORMAÇÃO <=12% CONFORME NBR 12824; RESISTÊNCIA A FADIGA >=90% DE RESISTÊNCIA RETIDA APÓS 100.000 CICLOS CARGA/DESCARGA E PONTO DE AMOLECIMENTO >180 °C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)	M2	31,85	-	-	-	-	-	-
67	EQ 04.05.0615 (B)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	131,97	129,50	17.090,10	194,25	25.635,15	64,75	8.545,05
68	EQ 04.05.0621 (A)	CAMINHÃO TANQUE, CAPACIDADE DE 10.000L, COM MOTORISTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 142CV, BOMBA D'ÁGUA E MANGOTE COM 50M DE EXTENSÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,84	55,50	1.267,74	83,25	1.901,61	27,75	633,87
69	EQ 19.05.0400 (B)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURAR DE JUNTAS DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	37,67	111,00	4.180,94	83,25	3.135,71	(27,75)	(1.045,23)
70	EQ 19.05.0406 (A)	MÁQUINA DE ABERTURA DE JUNTAS EM CONCRETO, COM OPERADOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR A GASOLINA DE 8,25CV, COM 3600RPM, PARTIDA MANUAL, CHASSIS REFORÇADO, GUARDA PROTETORA PARA ACOMODAR SERRAS DE ATÉ 14", SERRA PARA CONCRETO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA ABERTURA DE JUNTA DE DILATAÇÃO. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	22,48	259,00	5.822,47	194,25	4.366,85	(64,75)	(1.455,62)
71	AD 19.05.0500 (I)	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.(DESONERADO)	UN.MÊS	1.042,15	2,00	2.084,29	3,00	3.126,44	1,00	1.042,15
72	AD 19.15.0050 (I)	CONTAINER ESCRITÓRIO, MODELO PADRÃO, MEDINDO: (6X2,4X2,55)M, EM ESTRUTURA DE AÇO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITÁRIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS ELÉTRICAS, DISTRIBUIÇÃO INTERNA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS ATÉ O PONTO DE ENTRADA/SAÍDA DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL MENSAL.(DESONERADO)	UN.MÊS	425,37	1,00	425,36	3,00	1.276,09	2,00	850,73
73	AD 39.05.0068 (I)	APONTADOR (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	22,82	462,50	10.554,66	277,50	6.332,90	(185,00)	(4.221,86)
74	AD 39.05.0092 (I)	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - SERVIÇOS DE CAMPO (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	20,02	370,00	7.408,92	555,00	11.113,38	185,00	3.704,46
75	AD 39.05.0212 (I)	TOPOGRAFO A - SERVIÇOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, COM RESPONSABILIDADE DE DIRIGI-LOS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	33,06	185,00	6.116,39	277,50	9.174,59	92,50	3.058,20
76	TC 09.05.0200 (I)	CARGA MANUAL E DESCARGA MECÂNICA DE MATERIAL A GRANEL (AGREGADOS, PEDRA-DE-MÃO, PARALELOS, TERRA E ESCOMBRO), COMPREENDENDO OS TEMPOS PARA CARGA, DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, EMPREGANDO 4 SERVENTES NA CARGA.(DESONERADO)	T	15,29	108,06	1.652,47	-	-	(108,06)	(1.652,47)
77	TC 04.05.0620 (I)	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA: EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, EM VELOCIDADE REDUZIDA (VM=20KM/H), EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 17T.(DESONERADO)	T.KM	0,99	31.629,28	31.280,62	-	-	(31.629,28)	(31.280,62)
78	AD 19.10.0050 (I)	GALPÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPÓSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO)	M2	239,10	142,89	34.164,06	-	-	(142,89)	(34.164,06)
79	AD 39.05.0218 (A)	VIGIA (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	14,70	624,00	9.170,55	-	-	(624,00)	(9.170,55)
80	04.018.0015-A	RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T	T	0,89	3.599,99	3.203,98	-	-	(3.599,99)	(3.203,98)
81	EQ 14.05.0461 (A)	PÁ-CARREGADEIRA (CARREGADOR FRONTAL) SOBRE RODAS, CAPACIDADE RASA DE 2,66M3, COM OPERADOR, MATERIAL DE OPERAÇÃO E MATERIAL DE MANUTENÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 183,7CV. CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO.(DESONERADO)	H	278,75	-	-	-	-	-	-
82	EQ 14.05.0467 (I)	PÁ-CARREGADEIRA (CARREGADOR FRONTAL) SOBRE RODAS, CAPACIDADE RASA DE 2,66M3, COM OPERADOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR DIESEL DE 183,7CV. CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)	H	87,66	-	-	-	-	-	-
83	TC 09.05.0700 (I)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	15,96	-	-	-	-	-	-
84	CE 04.10.0188 (I)	LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	9,97	-	-	-	-	-	-
85	CE 04.10.0080 (I)	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.(DESONERADO)	H	8,89	-	-	-	-	-	-
86	AD 39.05.0128 (I)	ENGENHEIRO OU ARQUITETO, COORDENADOR GERAL DE PROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS (INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS).(DESONERADO)	H	129,95	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL PENDENTE DE APROVAÇÃO DA RERRA						165.196,59		98.109,34		(67.087,25)
TOTAL GERAL						1.354.566,14		1.114.081,35		(240.484,79)
